CONFIDENTIAL

The World Bank Group
International Bank for Reconstruction and Development
International Finance Corporation
Multilateral Investment Guarantee Agency
International Centre for Settlement of Investment Disputes
International Development Association

Contract
7193394

The Contractor:
MCRIT, S.L
SALVADOR ESPRIU Nº 83 LOCAL 4
83
BARCELONA, Catalonia, ES08005
Spain

Vendor No: 188031
Attn: Rafa Rodrigo
Telephone No: +34932250313
Fax: +34932255112
Email: rodrigo@mcrit.com

The Purchaser:
IFC
2121 Pennsylvania Avenue, N.W.
Washington, DC 20433

Contact: Renu Bansilal Kalra

Phone: 202-473-1118

Email: gprocurement@worldbank.org

This CONTRACT (hereinafter called the "Contract") is entered into between the member of the World Bank Group named above (hereinafter called the "Purchaser") and the "Contractor".
WHEREAS
(a) The Purchaser has requested the Contractor to provide certain services ("the Services") as defined in the Terms of Reference (TOR) / Statement of Work (SOW) attached to this Contract;
(b) The Contractor, having represented to the Purchaser that they have the required professional skills, and personnel and technical resources, have agreed to provide the Services on the terms and conditions set forth in this Contract.
NOW THEREFORE, the Parties hereto agree as follows:
1. The following documents shall be deemed to form an integral part of this Contract:
(a) The General Conditions of Contract
(www.worldbank.org/corporateprocurement);
(b) The Special Conditions of Contract (see below);
(c) Annex A: Description of the Services/Terms of Reference/Statement of Work.
2. The mutual rights and obligations of the Purchaser and the Contractor shall be as set forth in the Contract, and in particular:
(a) The Contractor shall carry out the Services in accordance with the provisions of the Contract; and
(b) The Purchaser shall make payments to the Contractor in accordance with the provisions of the Contract.

Description of Services:
Demand forecasting and assessment for a
Railway Project

SPECIAL CONDITIONS:
Amendments of and Supplements to, Clauses in the General Conditions of Contract.:

Solicitation No: ECS1262949

Contract Term:
The performance of the Contract shall commence on: October 03, 2019
The Contract shall terminate on: September 15, 2021

Contract Price and Currency:
The maximum amount to be paid for performance of the services in the contract currency is: USD 112,500.00

Payments to Contractor

Remuneration for this Contract is: Lump Sum Inclusive of all Expenses

Payment Schedule:

Payments shall be made according to the following payment schedule: Lump Sum of USD 112,500.00 inclusive of all expenses to be paid as follows:

USD 11,250.00 - as advance upon Contractor's commencement of services

USD 16,875.00 - on Contractor's submission and the Purchaser's acceptance of the Deliverables A, as provided in Annex A.

USD 22,500.00 - on Contractor's submission and the Purchaser's acceptance of the Deliverables B , as provided in Annex A.

USD 22,500.00 - on Contractor's submission and the Purchaser's acceptance of the Deliverables C , as provided in Annex A.

USD 22,500.00 - on Contractor's submission and the Purchaser's acceptance of the Deliverables D , as provided in Annex A.

USD 22,500.00 - on Contractor's submission and the Purchaser's acceptance of the Deliverables E, as provided in Annex A.

Contract Administration:
Purchaser's Contract Manager: Mr Tomas Anker (tanker@ifc.org)
Contractor's Representative: Rafa Rodrigo (rodrigo@mcrit.com)

Contractor's Personnel (Annex C):
The Contractor's Key Personnel and Subcontractors who will provide the Services are:
1 Andreu Ullied,
2 Frederic Lloveras,
3 Marcelo Souto,
4 Raquel Lopez,
5 Oriol Biosca.

Purchaser's Authorized Representative

Natesh Anand Sampath Kumar

Name

Procurement Analyst

Title



Signature

Date: October 03, 2019

Serviços de Consultoria

Preço Global

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47818494) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 4

Sumário

Prefácio **4**
I. Contrato **7**
II.Condições Gerais do Contrato **8**
A. Disposições Gerais **9**
1. Definições 9
2. Relacionamento entre as Partes 10
3. Legislação Aplicável 10
4. Idioma 10
5. Títulos 11
6. Comunicações 11
7. Local 11
8. Autoridade do Membro Líder 11
9. Representantes autorizados 11
10. Práticas corruptas e fraudulentas 11
B. Início, Conclusão, Modificação e Rescisão do Contrato **11**
11. Vigência do Contrato 11
12. Rescisão do Contrato por Falta de Entrada em Vigor 12
13. Início dos serviços 12
14. Encerramento do Contrato 12
15. Totalidade do Acordo 12
16. Modificações ou Variações 12
17. Força Maior 12
18. Suspensão 13
19. Rescisão 14
C. Obrigações do Consultor **16**
20. Disposições Gerais 16
21. Conflito de Interesses 17
22. Confidencialidade 18
23. Responsabilidade do Consultor 18
24. Seguro a ser obtido pelo Consultor 18
25. Contas, Inspeção e Auditoria 18
26. Obrigações de apresentar relatórios 19
27. Direitos de propriedade do Cliente nos relatórios e registros 19

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47818494) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 5

28. Equipamentos, Veículos e Materiais 19
D. Especialistas do Consultor e Subconsultores 20
29. Descrição de Especialistas principais 20
30. Substituição Especialistas Principais 20
31. Remoção de Especialistas ou Subconsultores 20
E. Obrigações do Cliente 20
32. Assistência e Isenções 20
33. Acesso ao Local do Projeto 21
34. Mudança na Legislaçao Aplicável Relativa a Impostos e Taxas 21
35. Serviços, instalações e bens do Cliente 21
36. Equipe de Contrapartida 22
37. Obrigação de pagamento 22
F.. Pagamentos ao Consultor 22
38. Preço do Contrato 22
39. Impostos e Direitos 22
40. Moeda de Pagamento 22
41. Forma de Cobrança e de Pagamento 22
42. Juros sobre Pagamentos Atrasados 23
G. Equidade e Boa-Fé 24
43. Boa-Fé 24
H. Resolução de Conflitos 24
44. Solução Amigável 24
45. Solução de controvérsias 24
Anexo 1: Política do Banco Mundial - Práticas Corruptas e Fraudulentas 25
III.Condições Especiais do Contrato 27
IV. Apêndices 35
Apêndice A - Termos de Referência 35
Apêndice B - Equipe Principal 20
Apêndice C - Discriminação do Preço do Contrato 39
Apêndice D - Formulário de Garantia de Adiantamentos ..... Erro! Indicador não definido.

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47818494) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 6

Prefácio

1. O Contrato consiste em quatro partes: o Contrato a ser assinado pelo Cliente e o Consultor, as Condições Gerais do Contrato (CG), incluindo Anexo 1 (Política do Banco Mundial - Fraude e Corrupção); as Condições Especiais do Contrato (CE) e os Apêndices.

2. As Condições Gerais do Contrato, incluindo o Anexo 1, não devem ser modificadas. As Condições Especiais do Contrato que contenham cláusulas específicas para cada Contrato têm o objetivo de complementar, mas não substituir ou de outro modo contradizer, as Condições Gerais.

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47818494) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 7

CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Preço Global

Nome do Projeto: Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável - PDRIS

Nº *Empréstimo: 8185-0 BR*

CONTRATO Nº19/2019/GABPRES/ADETUC

entre

Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa – ADETUC

e

Consórcio Iber-Geo Consulting/Mcrit, S.L/Meridiano Zero, S.L

PALMAS, 08 DE JULHO DE 2019

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47818494) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 8

I. Contrato

PREÇO GLOBAL

Este CONTRATO (doravante denominado o "Contrato") é celebrado no *[número ordinal]* dia do mês *[mês]*, *[ano]*, entre, por um lado, o Governo do Estado do Tocantins através da *Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa – ADETUC,* CNPJ 32.842.584/0001-39 (doravante denominado o "Cliente") e, por outro lado, o Consórcio ***Iber-Geo Consulting/Mcrit, S.L/Meridiano Zero, S.L*** (doravante denominado o "Consultor"), formado(a) pelas seguintes empresas, ***Iber-Geo Consulting*** com sede na Rua Guardia, 12, Irla B 08001, Barcelona, Espanha CIF Nº B-61463188 e CNPJ como empresa domiciliada no exterior sob nº 26.485.154/0001-04, neste ato representado pelo seu procurador Sr. Marcelo Marcos da Silva Fonseca, brasileiro, casado, contador, RG 18.606.068-3 SSP/SP e CPF/MF 28.072.088-35; ***Mcrit, S.L.,*** com sede estabelecida em Salvador Espriu, 85, Barcelona, Espanha, registrada perante o registro comercial de Barcelona, folha 44, tomo 9.496, livro 8.679, inscrita no CIF sob nº B58677428, neste ato representada por seu bastante procurador Sr. Andreu Ulied Seguí, Espanhol, casado, empresário, nascido em Barcelona, Carteira de Identidade DNI nº 35037418T, residente e domiciliado em Barcelona, Espanha, ***Meridiano Zero, S.L,*** com sede na avenida Sancho el Fuerte, 57, Pamplona, Espanha, Registro comercial de Navarra, folha 93, tomo 1.297, livro NA-25827 e CIF nº B31917149, neste ato representado pela Sra. Ana Rivas Allo, espanhola, empresária, nascida em Pamplona, portadora da Carteira de Identidade DNI nº 33440607X, residente e domiciliada em Pamplona, Espanha,(doravante denominados "Consultor").

CONSIDERANDO QUE

(a) o Cliente tenha solicitado ao Consultor o fornecimento de determinados serviços de consultoria conforme definidos neste Contrato (doravante denominados "Serviços");

(b) o Consultor, tendo declarado ao Cliente possuir as habilidades profissionais necessárias, conhecimento especializado e recursos técnicos, concordou em prestar os Serviços nos termos e condições definidos neste Contrato;

(c) o Cliente recebeu um empréstimo do(a) Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD): em relação ao custo dos Serviços e pretende aplicar uma parte dos resultados deste empréstimo em pagamentos elegíveis sob este Contrato, sabendo que (i) os pagamentos por parte do Banco Mundial serão efetuados apenas a pedido do Cliente e com a aprovação do Banco Mundial; (ii) tais pagamentos estarão sujeitos, em todos os aspectos, aos termos e condições do acordo de empréstimo incluindo as proibições de retirada da conta de empréstimo para efetuar qualquer pagamento a pessoas ou entidades, ou para qualquer importação de mercadorias, se tal pagamento ou importação, quando de conhecimento do Banco Mundial, for proibido por decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas descrito no Capítulo VII da Carta das Nações Unidas; e (iii) nenhuma parte, a não ser o Cliente, deverá obter quaisquer direitos do acordo de empréstimo ou fazer alguma solicitação de recursos de empréstimo

AS PARTES têm por justo e acordado o seguinte:

1. Os seguintes documentos anexos serão considerados como parte integrante deste Contrato:

(a) As Condições Gerais do Contrato (inclusive o Anexo 1 "Política do Banco - Fraude e Corrupção");

(b) As Condições Especiais do Contrato;

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47818494) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 9

(c) Apêndices:

Apêndice A: Termos de referência

Apêndice B: Especialistas Principais

Apêndice C: Discriminação de Preços do Contrato

Apêndice D: Formulário de Garantia de Adiantamentos

No caso de qualquer inconsistência entre os documentos, a seguinte ordem de prioridade deve prevalecer: as Condições Especiais do Contrato; as Condições Gerais do Contrato, incluindo Anexo 1; Apêndice A; Apêndice B; Apêndice C; Apêndice D. Qualquer referência a este Contrato deve incluir, onde o contexto permitir, uma referência a seus Apêndices.

2. Os direitos e obrigações do Cliente e do Consultor serão aqueles estabelecidos no Contrato, em particular:

(a) o Consultor prestará os Serviços de acordo com as disposições do Contrato; e

(b) o Cliente efetuará os pagamentos ao Consultor de acordo com as disposições do Contrato.

EM TESTEMUNHO DO QUE, as Partes assinam o presente Contrato em seus respectivos nomes, no dia e ano acima indicados.

Por e em nome de **Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa – ADETUC.**

ALDISON WISEMAN BARROS DE LYRA
Presidente
ADETUC

Para e em nome de **Consórcio Iber-Geo Consulting/Mcrit, S.L/Meridiano Zero, S.L**

JUDITH MUNTAL
Representante Legal
Consórcio Iber-Geo Consulting/Mcrit, S.L/Meridiano Zero, S.L

Testemunhas:

1)_____

2)_____

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47818494) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 10

II. Condições Gerais do Contrato

A. Disposições Gerais

1. Definições

1.1. A menos que o contexto exija de outra forma, as expressões e termos abaixo terão, para a finalidade do contrato, os seguintes significados:

(a) "Diretrizes Aplicáveis" são as Diretrizes para Seleção e Contratação de Consultores em Empréstimos do BIRD e os Créditos e Subsídios da AID por parte dos Mutuários do Banco Mundial, datados de janeiro de 2011.

(b) "Legislação Aplicável" significa as leis e quaisquer outros instrumentos que tenham força de lei no país do Cliente ou em qualquer outro país especificado nas Condições Especiais do Contrato (CE), que possam ser aprovadas e estar em vigor periodicamente.

(c) "Banco" significa o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e a Associação Internacional de Desenvolvimento (AID).

(d) "Mutuário" significa o Governo, órgão do Governo ou outra entidade que assine o contrato de financiamento com o Banco.

(e) "Cliente" significa a agência executora que assina o Contrato para os Serviços com o Consultor Selecionado.

(f) "Consultor" significa uma empresa de consultoria ou entidade legalmente constituída selecionada pelo Cliente para fornecer os Serviços nos termos do Contrato assinado.

(g) "Contrato" significa o acordo obrigatório por escrito, assinado entre o Cliente e o Consultor e que inclui todos os documentos anexos listados no parágrafo 1 do Contrato (as Condições Gerais (CG), as Condições Especiais (CE) e os Apêndices).

(h) "Dia" significa um dia útil, salvo disposição em contrário.

(i) "Data de vigência" significa a data em que este Contrato passa a vigorar e ter efeito de acordo com a Cláusula CG 11.

(j) "Especialistas" significa coletivamente os "Especialistas Principais", "Especialistas de Apoio" ou qualquer funcionário do Consultor, Subconsultor ou membro(s) do consórcio designado pelo Consultor para executar os Serviços ou qualquer parte deles nos termos do Contrato.

(k) "Moeda estrangeira" significa qualquer moeda que não seja a moeda do país do Cliente.

(l) "CG" significa as Condições Gerais do Contrato.

(m) "Governo" significa o governo do país do Cliente.

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47818494) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 11

(n) "Consórcio" significa uma associação com ou sem personalidade jurídica diferente daquela dos seus membros, de mais de uma entidade onde um membro tem autoridade para realizar todos os negócios por e em nome de todo e qualquer membro do consórcio e onde os membros do consórcio são conjunta e solidariamente responsáveis perante o Cliente pela execução do Contrato.

(o) "Especialista(s) Principal(is)" significa um profissional individual cujas habilidades, qualificações, conhecimento e experiência são críticos para a execução dos Serviços nos termos do Contrato e cujo Curriculum Vitae (CV) foi levado em consideração na avaliação técnica da proposta do Consultor.

(p) "Moeda local" significa a moeda do país do Cliente.

(q) "Especialista(s) de Apoio" significa um profissional fornecido pelo Consultor ou seu Subconsultor para executar os Serviços ou alguma parte deles nos termos do Contrato.

(r) "Parte" significa o Cliente ou o Consultor, conforme o caso, e "Partes" abrange ambos.

(s) "CE" significa as Condições Especiais do Contrato, por meio das quais as Condições Gerais podem ser modificadas ou complementadas, mas não substituídas.

(t) "Serviços" significa o trabalho a ser executado pelo Consultor de acordo com este Contrato, conforme a descrição no Apêndice A deste Contrato.

(u) "Subconsultores" significa uma entidade para quem/a qual o Consultor subcontrata qualquer parte dos Serviços enquanto permanece o único responsável pela execução do Contrato.

(v) "Terceiro" significa qualquer pessoa ou entidade que não seja o Governo, o Cliente, o Consultor ou o Subconsultor.

2. Relacionamento entre as Partes

2.1. Nenhuma disposição neste documento deve ser interpretada como determinante de uma relação de patrão e empregado ou de chefe e subordinado entre o Cliente e o Consultor. Nos termos deste Contrato, o Consultor dispõe de total controle sobre os Especialistas e os Subconsultores, se houver, que estiverem executando os Serviços e assumirá plena responsabilidade pelos trabalhos desempenhados por eles ou em seu nome.

3. Legislação Aplicável

3.1. Este Contrato, seu significado e interpretação, e a relação entre as Partes devem ser regidos pela Legislação Aplicável.

4. Idioma

4.1. Este Contrato foi assinado no idioma especificado nas Condições Especiais, que será obrigatório e regerá todas as questões referentes ao seu significado ou interpretação.

5. Títulos

5.1. Os títulos não deverão limitar, alterar ou afetar o significado deste Contrato.

6. Comunicações

6.1. Qualquer comunicação exigida ou permitida a ser divulgada ou feita nos termos deste Contrato deverá ser por escrito no idioma especificado na Cláusula CG 4. Considera-se válida qualquer comunicação, solicitação ou autorização quando houver sido entregue pessoalmente a um representante autorizado da Parte a quem a comunicação for dirigida, ou mediante o seu envio para o endereço da referida Parte especificado nas **CE.**

6.2. Uma Parte pode alterar o seu endereço para recebimento de notificações, de acordo com este Contrato, mediante comunicação à outra Parte sobre a mudança do endereço indicado nas Condições Especiais.

7. Local

7.1. Os Serviços serão executados nos locais indicados no **Apêndice A** destas CG, e quando o local de uma tarefa específica não for assim estabelecido, esta será realizada em localidade aprovada pelo Cliente, seja no país do Governo ou em outro local.

8. Autoridade do Membro Líder

8.1. Se o Consultor consistir em um Consórcio, os membros autorizam a entidade especificada nas Condições Especiais a atuar em seu nome no exercício de todos os direitos e obrigações do Consultor junto ao Cliente, nos termos deste Contrato, incluindo, sem limitação, o recebimento de instruções e pagamentos do Cliente.

9. Representantes autorizados

9.1. Os funcionários indicados nas **CE** poderão tomar qualquer medida que o Cliente ou o Consultor deva ou possa adotar, bem como poderão assinar qualquer documento que possa ou deva ser assinado pelo Cliente ou pelo Consultor, de acordo com este Contrato.

10. Práticas corruptas e fraudulentas

10.1. O Banco Mundial exige conformidade com a sua política relacionada a práticas corruptas e fraudulentas conforme definido no **Anexo 1** das CG.

a. Comissões e honorários

10.2. O Cliente requer que o Consultor divulgue quaisquer comissões, gratificações ou honorários que possam ter sido pagos ou que devam ser pagos a agentes ou a qualquer outra parte com relação ao processo de seleção ou execução do Contrato. As informações divulgadas devem incluir pelo menos o nome e o endereço do agente ou da outra parte, o montante e a moeda, e a finalidade da comissão, gratificações ou honorários. Qualquer problema na divulgação de tais comissões, **gratificações** ou honorários pode resultar na rescisão do Contrato e/ou em sanções por parte do Banco..

B. Início, Conclusão, Modificação e Rescisão do Contrato

11. Vigência do Contrato

11.1. Este Contrato entrará em vigor e efeito na data ("Data de vigência") em que o Cliente notificar o Consultor, instruindo-o a dar início à execução dos Serviços. Essa notificação deverá confirmar que foram atendidas as condições para entrada em vigor, se houver, relacionadas nas **CE.**

12. Rescisão do Contrato por Falta de Entrada em Vigor

12.1. Após a assinatura pelas Partes, se este Contrato não entrar em vigor dentro do prazo especificado nas **CE**, qualquer uma das Partes pode declarar este Contrato anulado e sem efeito, mediante comunicação por escrito à outra Parte, com antecedência mínima de 22 (vinte e dois) dias. No caso de tal afirmação por uma das Partes, nenhuma delas poderá fazer qualquer reivindicação à outra Parte relacionada ao Contrato.

13. Início dos serviços

13.1. O Consultor confirmará a disponibilidade dos Especialistas Principais e dará início aos Serviços em no máximo o número de dias após a Data de Entrada em Vigor especificada nas **CG**.

14. Encerramento do Contrato

14.1. Exceto quando rescindido em data anterior, de acordo com a Cláusula CG 19, este Contrato estará encerrado no final do prazo após a Data de Vigência, conforme especificado nas **CE.**

15. Totalidade do Acordo

15.1. Este Contrato contém todos os acordos, condições e disposições ajustadas pelas Partes. Nenhum agente ou representante de qualquer das Partes dispõe de autoridade para fazer, nem as Partes estarão sujeitas ou serão responsáveis por qualquer declaração, representação, promessa ou acordo que não tenha sido estabelecido neste Contrato.

16. Modificações ou Variações

16.1. Qualquer modificação ou variação nos termos e condições deste Contrato, incluindo qualquer alteração ou mudança no escopo dos Serviços, poderá ser feita somente por meio de acordo por escrito entre as Partes.

16.2. Quando as modificações ou variações forem substanciais, será necessário obter o prévio consentimento do Banco.

17. Força Maior

a. Definição

17.1. Para a finalidade deste Contrato, "Força Maior" significa um evento que está fora do controle razoável de uma Parte, não é previsível nem pode ser evitado e que, nas circunstâncias, torna impossível ou é tão impraticável que pode ser considerado razoavelmente impossível o cumprimento, nessas circunstâncias, de suas obrigações estabelecidas neste Contrato. Essas situações abrangem, mas não se limitam a guerras, rebeliões, distúrbios civis, terremotos, incêndios, explosões, tempestades, enchentes ou outras condições climáticas adversas, greves de trabalhadores e patronais, ou outras ações sindicais, confisco ou qualquer outra medida tomada por órgãos governamentais.

17.2. Força Maior não inclui (i) qualquer evento provocado por negligência ou ação intencional de uma Parte ou de seus Especialistas, Subconsultores, agentes ou empregados nem (ii) qualquer acontecimento que uma Parte diligente pudesse ter previsto no momento da assinatura deste Contrato e ter evitado ou solucionado durante o cumprimento de suas obrigações estabelecidas neste instrumento contratual.

17.3. Não constitui motivo de Força Maior a insuficiência de fundos ou falta de qualquer pagamento previsto neste Contrato.

b. Não constitui violação do contrato

17.4. O descumprimento de qualquer das obrigações de uma Parte estabelecidas neste Contrato não será considerado violação ou negligência, se esse descumprimento resultar de um evento de Força Maior, desde que a Parte afetada por esse evento tenha tomado todas as precauções razoáveis, o devido cuidado ou medidas alternativas legítimas com o objetivo de cumprir os termos e condições deste Contrato.

c. Medidas a serem adotadas

17.5. A Parte afetada por um evento de Força Maior deverá continuar a executar suas obrigações determinadas pelo Contrato, na medida do possível, e tomar todas as providências razoáveis para minimizar as conseqüências de qualquer evento de Força Maior.

17.6. A Parte afetada por um evento de Força Maior deverá notificar prontamente a outra Parte sobre tal acontecimento e, em qualquer caso, no prazo máximo de 14 (quatorze) dias seguintes à ocorrência de tais acontecimentos, apresentando evidências de sua natureza e causa e, da mesma forma, deverá notificar por escrito a volta às condições normais tão logo seja possível.

17.7. Qualquer prazo em que uma Parte deva concluir qualquer ação ou tarefa, de acordo com este Contrato, será estendido por um período igual àquele durante o qual a referida Parte não pôde executá-la devido a um evento de Força Maior.

17.8. Durante o período de sua incapacidade para executar os Serviços devido a um evento de Força Maior, o Consultor, instruído pelo Cliente, deverá:

(a) interromper os trabalhos e, nesse caso, o Consultor será reembolsado pelos custos adicionais e necessários que tenha assumido de forma razoável e, se for exigido pelo Cliente, ao reativar os Serviços; ou

(b) continuar com os Serviços até o ponto que for possível, e neste caso o Consultor deverá continuar a ser pago conforme os termos deste Contrato e será reembolsado pelos custos adicionais incorridos de forma razoável e necessária.

17.9. No caso de desacordo entre as Partes quanto à existência ou à extensão do evento de Força Maior, o fato deverá ser solucionado de acordo com as Cláusulas das CG 44 e 45.

18. Suspensão

18.1. O Cliente pode interromper todos os pagamentos ao Consultor previstos neste Contrato, mediante aviso de suspensão por escrito ao

Consultor, se este deixar de cumprir qualquer de suas obrigações estabelecidas neste instrumento contratual, inclusive a execução dos Serviços, desde que o aviso de suspensão (i) especifique a natureza do descumprimento, e (ii) solicite ao Consultor a correção das falhas detectadas no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento pelo Consultor da notificação.

19. Rescisão

19.1. Este Contrato pode ser rescindido por qualquer das Partes de acordo com as disposições definidas a seguir:

a. Pelo Cliente

19.1.1. O Cliente pode rescindir este Contrato no caso de ocorrência de qualquer dos eventos especificados nos parágrafos (a) a (f) desta Cláusula. Em tal ocorrência, o Cliente deverá dar um aviso de rescisão por escrito de ao menos trinta (30) dias corridos ao Consultor no caso dos eventos referenciados nos itens (a) a (d); um aviso por escrito de ao menos sessenta (60) dias corridos no caso do evento referido no parágrafo (e); e um aviso por escrito de pelo menos cinco (5) dias corridos no caso do evento referido no item (f):

(a) Se o Consultor deixar de corrigir uma falha no desempenho das suas obrigações aqui previstas, conforme especificado em um aviso de suspensão de acordo com a Cláusula CG 18;

(b) Se o Consultor (ou se ele consistir mais de uma entidade, se qualquer de seus membros) entrar em processo de insolvência ou de falência ou estabelecer qualquer acordo com seus credores para reduzir a sua dívida ou lançar mão de alguma lei que beneficie os devedores ou ainda entrar em processo de liquidação ou em concordata compulsória ou voluntária;

(c) Se o Consultor deixar de cumprir qualquer decisão final resultante de um procedimento de arbitragem conforme a Cláusula CG 45.1:

(d) Se, por motivo de Força Maior, o Consultor não puder executar uma parte essencial dos Serviços durante um período não inferior a 60 (sessenta) dias;

(e) Se o Cliente, sob seu exclusivo critério e por qualquer razão, decidir rescindir este Contrato;

(f) Se o Consultor deixar de confirmar a disponibilidade dos Especialistas principais conforme exigência da Cláusula CG 13.

19.1.2 Ademais, se o Cliente determinar que o Consultor envolveu-se em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao competir por um Contrato ou executá-lo, o Cliente

poderá, 14 (quatorze) dias após enviar notificação por escrito ao Consultor, rescindir o Contrato com o Consultor.

b. Pelo Consultor

19.1.3. O Consultor pode rescindir este Contrato, por meio de um aviso por escrito ao Cliente de pelo menos trinta (30) dias corridos, no caso de ocorrência de qualquer evento especificado nos parágrafos (a) a (d) desta Cláusula.

(a) Se o Cliente deixar de pagar qualquer montante devido ao Consultor de acordo com este contrato e não sujeito a disputa de acordo com a Cláusula CG 45.1 dentro de quarenta e cinco (45) dias corridos após o recebimento de aviso por escrito do Consultor de que esse pagamento está em mora.

(b) Se, por motivo de Força Maior, o Consultor não puder executar uma parte essencial dos Serviços durante um período não inferior a 60 (sessenta) dias.

(c) Se o Cliente deixar de cumprir qualquer decisão final resultante de um procedimento de arbitragem conforme a Cláusula CG 45.1.

(d) Se o Cliente descumprir de modo substancial as suas obrigações previstas neste Contrato e não corrigir a sua conduta no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias (ou um período maior que o Consultor pode ter subsequentemente aprovado por escrito) a partir do recebimento pelo Cliente da notificação do Consultor especificando o descumprimento.

c. Cessação dos Direitos e Obrigações

19.1.4. Após a rescisão deste Contrato de acordo com as Cláusulas CGC 12 ou CGC 19 deste documento, ou após a expiração deste Contrato de acordo com a Cláusula CG 14, todos os direitos e obrigações das Partes aqui especificadas cessarão, exceto (i) os direitos e obrigações que possam ter se acumulado na data da rescisão ou expiração, (ii) a obrigação de confidencialidade determinada na Cláusula CG 22, (iii) a obrigação do Consultor de permitir a inspeção, cópia e auditoria de suas contas e seus registros definida na Cláusula CG 25, e (iv) qualquer direito que uma das Partes possa ter de acordo com a Legislação Aplicável.

d. Cessação dos Serviços

19.1.5. Após a rescisão deste Contrato por aviso de qualquer das Partes para a outra conforme as Cláusulas CG 19a ou CG 19b, o Consultor deverá, imediatamente após o envio ou recebimento desse aviso, seguir todas as etapas necessárias para encerrar os Serviços de forma oportuna e ordenada, e deverá fazer todo o esforço possível para manter as despesas para este fim em um mínimo. Com relação

aos documentos preparados pelo Consultor e aos equipamentos e materiais fornecidos pelo Cliente, o Consultor deverá proceder conforme determinado, respectivamente, pelas Cláusulas CG 27 ou CG 28.

e. Pagamento na Rescisão do Contrato

19.1.6. Após a rescisão deste Contrato, o Cliente deverá fazer os seguintes pagamentos ao Consultor:

(a) pagamento dos Serviços realizados satisfatoriamente antes da data de entrada em vigor da rescisão; e

(b) no caso de rescisão em conformidade com os parágrafos (d) e (e) da Cláusula CG 19.1.1, o reembolso de qualquer custo razoável incidental para a rescisão imediata e organizada deste Contrato, incluindo o custo da viagem de volta dos Especialistas.

C. Obrigações do Consultor

20. Disposições Gerais

a. Padrão de Desempenho

20.1 O Consultor deverá desempenhar e executar os Serviços com toda a devida diligência, eficiência e economia, de acordo com os padrões e as práticas profissionais aceitas de modo geral, observar sólidas práticas de gestão, empregar a tecnologia apropriada e equipamentos, maquinário, materiais e métodos seguros e eficazes. O Consultor deverá sempre agir, com respeito a qualquer assunto relativo a este Contrato ou aos Serviços, como um consultor fiel ao Cliente, e deverá sempre apoiar e proteger os interesses legítimos do Cliente em todas as negociações com terceiros.

20.2. O Consultor deverá contratar e fornecer Especialistas e Subconsultores qualificados conforme exigido para executar os Serviços.

20.3. O Consultor pode subcontratar parte dos Serviços até certo ponto e com os Especialistas Principais e Subconsultores aprovados previamente pelo Cliente. Não obstante essa aprovação, o Consultor deverá manter total responsabilidade pelos Serviços.

b. Legislação Aplicável aos Serviços

20.4. O Consultor deverá realizar os Serviços de acordo com o Contrato e a Legislação Aplicável e seguir todas as etapas possíveis para garantir que todos os seus Especialistas e Subconsultores cumpram a Legislação Aplicável.

20.5. Durante a execução do Contrato, o Consultor deverá cumprir as proibições relativas à importação de bens e serviços no país do Cliente quando

(a) por uma questão legal ou normas oficiais, o país do Mutuário proibir o estabelecimento de relações comerciais com aquele país; ou

(b) em conformidade com uma decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas tomada de acordo com o Capítulo VII da Carta das Nações Unidas, o País do Mutuário proibir qualquer importação de bens daquele país ou quaisquer pagamentos a qualquer país, pessoa ou entidade daquele país.

20.6. O Cliente deverá notificar o Consultor por escrito dos costumes locais relevantes e o Consultor deverá, após essa notificação, respeitar tais costumes.

21. Conflito de Interesses

21.1. O Consultor deverá priorizar os interesses do Cliente sem considerar a possibilidade de qualquer trabalho futuro e evitar estritamente conflitos com outros contratos ou com os seus próprios interesses corporativos.

a. O Consultor não deve se beneficiar de comissões,descontos, etc.

21.1.1 O pagamento do Consultor de acordo com a CG F (Cláusulas CG 38 a 42) deverá constituir o único pagamento do Consultor em relação a este Contrato e, conforme a Cláusula CG 21.1.3, o Consultor não deverá aceitar em seu próprio benefício nenhuma comissão comercial, desconto ou pagamento similar em conexão com as atividades relativas a este Contrato ou no desempenho das suas obrigações aqui previstas, e o Consultor deverá usar seus maiores esforços para garantir que todos os Subconsultores, bem como os Especialistas e respectivos agentes, também não recebam qualquer pagamento adicional.

21.1.2 Outrossim, se o Consultor for responsável, como parte dos Serviços, por assessorar o Cliente na aquisição de bens, obras ou serviços, o Consultor deverá cumprir as diretrizes de aquisição aplicáveis do Banco e sempre exercer tal responsabilidade visando os melhores interesses do Cliente. Quaisquer descontos ou comissões obtidos pelo Consultor durante essas atividades de aquisição reverterão em favor do Cliente.

b. O Consultor e seus Associados não poderão participar de certas atividades

21.1.3 O Consultor concorda que, durante a execução deste Contrato e após o seu encerramento, ele e qualquer de suas entidades associadas, bem como quaisquer Subconsultores e as entidades afiliadas a esses subconsultores, estarão desqualificados para o fornecimento de bens, obras e serviços resultantes ou diretamente relacionados aos Serviços de Consultoria prestados na preparação ou implementação do projeto, salvo disposição em contrário.

c. Proibição de Atividades Conflitantes

21.1.4 O Consultor não deverá se envolver e não levará os seus Especialistas, bem como os seus Subconsultores a participar direta ou indiretamente de atividade comercial ou profissional que possa conflitar com as tarefas que lhes foram atribuídas de acordo com o Contrato.

d. Dever restrito de divulgar atividades conflitantes

21.1.5 O Consultor tem a obrigação e deverá garantir que Especialistas e Subconsultores também tenham a obrigação de divulgar qualquer situação de conflito real ou potencial que impacte sua capacidade de servir aos melhores interesses do seu Cliente ou que possa ser interpretada como tal. A não divulgação dessas situações pode levar à desqualificação do Consultor ou à rescisão do seu Contrato.

22. Confidencialidade

22.1 Exceto mediante consentimento prévio por escrito do Cliente, o Consultor e os seus Especialistas nunca poderão revelar a qualquer pessoa ou entidade qualquer informação confidencial obtida durante a execução dos Serviços nem tornar públicas as recomendações formuladas ao longo ou resultantes dos Serviços.

23. Responsabilidade do Consultor

23.1 Sujeita a disposições adicionais, se houver, definidas nas **CE**, a responsabilidade do Consultor prevista neste Contrato será determinada pela Legislação Aplicável.

24. Seguro a ser obtido pelo Consultor

24.1 O Consultor (i) contratará e manterá, e fará com que os Subconsultores contratem e mantenham, às suas próprias expensas (ou dos Subconsultores, conforme o caso), nos termos e condições aprovados pelo Cliente, um seguro contra riscos e com as coberturas especificadas nas **CE**, e (ii) a pedido do Cliente, fornecerá as comprovações necessárias da obtenção e manutenção do seguro, assim como do pagamento dos prêmios vigentes. O Consultor deverá garantir que esse seguro está em vigor antes do início dos Serviços, conforme definido na Cláusula CG 13.

25. Contas, Inspeção e Auditoria

25.1 O Consultor deverá manter e envidar todos os esforços possíveis para assegurar que seus Subconsultores mantenham contas e registros precisos e sistemáticos em relação aos Serviços e em tal forma e detalhes que identifiquem claramente as mudanças de data e de custos pertinentes.

25.2 O Consultor deverá permitir e incentivar que seus Subconsultores permitam, que o Banco e/ou pessoas indicadas pelo Banco inspecione o local e/ou todas as suas contas e registros referentes à execução do Contrato e ao envio da Proposta para o fornecimento dos Serviços e submeta tais contas e registros à auditoria por auditores indicados pelo Banco se este assim o exigir. O Consultor deve dar a devida atenção à Cláusula CG 10 que dispõe, *inter alia*, que atos que objetivem impedir concretamente o exercício dos direitos de inspeção e auditoria do Banco, nos termos da Cláusula CG 25.2 constituem uma prática proibida sujeita à rescisão contratual (bem como à

determinação de inelegibilidade de acordo com os procedimentos de sanções do Banco).

26. Obrigações de apresentar relatórios

26.1 O Consultor deverá apresentar ao Cliente os relatórios e documentos indicados no **Apêndice A** deste Contrato na forma, quantidade e prazos fixados no referido Apêndice.

27. Direitos de propriedade do Cliente nos relatórios e registros

27.1 A menos que seja indicado de outro modo nas **CE**, todos os relatórios e dados relevantes, bem como informações como mapas, diagramas, planos, bancos de dados, outros documentos e *software*, registros de apoio ou materiais compilados ou preparados pelo Consultor para o Cliente durante o Serviço deverão ser confidenciais e tornar-se propriedade absoluta do Cliente. O Consultor deverá, no máximo na rescisão ou expiração deste Contrato, entregar todos esses documentos ao Cliente, juntamente com um inventário detalhado desses documentos. O Consultor poderá reter uma cópia desses documentos, dados e/ou software, mas não deverá usá-la para fins que não estejam relacionados a este Contrato sem aprovação prévia por escrito do Cliente.

27.2 Se forem necessários ou apropriados acordos de licença entre o Consultor e terceiros para fins de desenvolvimento dos planos, desenhos, especificações, projetos, bancos de dados, outros documentos e *software*, o Consultor deverá obter a aprovação prévia por escrito do Cliente para esses acordos e o Cliente terá o direito, a seu critério, de exigir a recuperação das despesas relativas ao desenvolvimento do(s) programa(s) em questão. Outras restrições sobre o uso futuro desses documentos e software, se houver, serão especificados nas **CE**.

28. Equipamentos, Veículos e Materiais

28.1 Equipamentos, veículos e materiais colocados à disposição do Consultor pelo Cliente, ou adquiridos pelo Consultor com recursos integrais ou parciais fornecidos pelo Cliente serão de propriedade do Cliente e deverão ser identificados de modo adequado. Quando da rescisão ou encerramento deste Contrato, o Consultor apresentará ao Cliente o inventário dos referidos equipamentos, veículos e materiais, e os entregará de acordo com as suas instruções. Enquanto estiver de posse dos equipamentos, veículos e materiais, o Consultor deverá providenciar o seguro desses itens, às expensas do Cliente, no valor equivalente à sua total substituição, salvo determinação em contrário e por escrito do Cliente.

28.2 Qualquer equipamento ou material trazido para o País do Cliente pelo Consultor ou seus Especialistas tanto para uso pessoal ou no projeto, permanecerá de propriedade do Consultor ou dos Especialistas, conforme aplicável.

D. Especialistas do Consultor e Subconsultores

29. Descrição de Especialistas principais

29.1 Os cargos, as funções, as qualificações mínimas e a carga de trabalho de cada um dos Especialistas Principais do Consultor, estimados para execução dos serviços, estão descritos no Apêndice B.

30. Substituição Especialistas Principais

30.1 Exceto quando o Cliente estabelecer de outro modo, não serão admitidas alterações nos Especialistas Principais.

30.2 Se, por qualquer motivo fora do controle razoável do Consultor, como morte ou doença, entre outras, for necessário substituir qualquer Especialista Principal, o Consultor deverá apresentar solicitação por escrito. Nesse caso, o Consultor deverá apresentar imediatamente como substituto outro profissional com qualificação equivalente ou superior e com a mesma faixa de remuneração.

31. Remoção de Especialistas ou Subconsultores

31.1 Se o Cliente descobrir que algum dos Especialistas ou Subconsultores incorreu em conduta indevida ou foi acusado de ter cometido um ato criminoso, ou se o Cliente determinar que o Especialista ou Subconsultor do Consultor se envolveu em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas durante a execução dos Serviços, o Consultor deverá, por solicitação por escrito do Cliente, providenciar um substituto.

31.2 Caso algum Especialista Principal, Especialista de Apoio ou Subconsultor seja considerado pelo Cliente como incompetente ou incapaz no cumprimento das tarefas atribuídas, o Cliente, especificando os motivos correspondentes, pode solicitar que o Consultor providencie um substituto.

31.3 Os substitutos dos Especialistas ou Subconsultores removidos deverão ter melhores qualificações e experiência e serem aceitáveis para o Cliente.

31.4 O Consultor deverá arcar com todos os custos oriundos ou relativos a qualquer remoção e/ou substituição de tais Especialistas.

E. Obrigações do Cliente

32. Assistência e Isenções

32.1 A menos que especificado de outra forma nas **CE**, o Cliente deverá envidar todos os seus esforços para:

a. Auxiliar o Consultor na obtenção dos vistos de trabalho e outros documentos necessários para permitir que o Consultor preste os Serviços.
b. Auxiliar o Consultor na pronta obtenção, para que os Especialistas e, se for apropriado, os seus dependentes elegíveis recebam prontamente todos os vistos de entrada e

saída, de residência e licença para efetuar câmbio, bem como quaisquer outros documentos necessários à sua estadia no país do Cliente enquanto executam os Serviços previstos neste Contrato.

c. Facilitar a pronta liberação pela alfândega de qualquer bem necessário aos Serviços e dos objetos pessoais dos Especialistas e de seus dependentes elegíveis.
d. Fornecer aos funcionários, agentes e representantes do Governo todas as instruções e informações necessárias ou pertinentes à imediata e eficiente execução dos Serviços.
e. Isente o Consultor, a Equipe e quaisquer Subconsultores contratados pelo Consultor para executar os Serviços de qualquer exigência de registro ou licença referente ao exercício da profissão ou ao estabelecimento individual ou como entidade corporativa no país do Cliente de acordo com a Legislação Aplicável daquele país.
f. Conceder ao Consultor, a qualquer Subconsultor ou às Equipes de ambos, o privilégio, de acordo com a Legislação Aplicável no país do Cliente, de trazer para o país do Cliente valores razoáveis em moeda estrangeira para a finalidade dos Serviços ou para seu uso pessoal, bem como de retirar quaisquer montantes ganhos pela Equipe na execução dos Serviços.
g. Fornecer ao Consultor qualquer outra assistência prevista nas **CE**.

33. Acesso ao Local do Projeto

33.1 O Cliente garante que o Consultor terá acesso livre e gratuito ao local do projeto, necessário à execução dos Serviços. O Cliente será responsável por quaisquer danos a esses lugares ou aos bens neles contidos, que sejam resultantes do referido acesso, e indenizará o Consultor e cada Especialista no que diz respeito à responsabilidade por tais danos, a menos que tenham sido causados por falta ou negligência do Consultor, de quaisquer Subconsultores ou dos Especialistas de ambos.

34. Mudança na Legislaçao Aplicável Relativa a Impostos e Taxas

34.1 Se, após a data deste Contrato, houver alguma alteração na legislação aplicável no país do Cliente com relação a impostos e direitos que aumente ou diminua o custo incorrido pelo Consultor na realização dos Serviços, a remuneração e as despesas reembolsáveis pagáveis de outro modo ao Consultor neste Contrato devem ser aumentadas ou diminuídas de modo adequado pelo acordo entre as Partes neste instrumento, e os ajustes correspondentes deverão ser feitos para o valor do preço do Contrato especificado na Cláusula CG 38.1.

35. Serviços, instalações e bens do Cliente

35.1 O Cliente colocará à disposição do Consultor e da Equipe, para a finalidade dos Serviços a serem realizados e livres de qualquer encargo, os serviços, as instalações e os bens descritos nos Termos de Referência (**Apêndice A**), durante os períodos e no modo especificados no **Apêndice A.**

36. Equipe de Contrapartida

36.1 Se for especificado no **Apêndice A** deste Contrato, o Cliente deverá colocar à disposição do Consultor, gratuitamente, os profissionais e a equipe de apoio de contrapartida, que será designada pelo Cliente com a assessoria do Consultor.

36.2 As equipes de profissionais e de apoio de contrapartida, excluídos os funcionários de ligação do Cliente, deverão trabalhar sob a orientação exclusiva do Consultor. Se qualquer membro da equipe de contrapartida não executar de modo adequado qualquer tarefa compatível com o seu cargo, que lhe seja atribuída pelo Consultor, este poderá solicitar a sua substituição e o Cliente não deverá se negar sem razão a tomar as providências necessárias para atender a esse pedido.

37. Obrigação de pagamento

37.1 Em consideração aos Serviços realizados pelo Consultor neste Contrato, o Cliente deve efetuar tais pagamentos ao Consultor pelos produtos especificados no **Apêndice A** e da forma descrita pela cláusula CGC F a seguir.

F. Pagamentos ao Consultor

38. Preço do Contrato

38.1 O preço do Contrato é fixo e está determinado na **CE.** A discriminação do preço do Contrato é fornecida no **Apêndice C**.

38.2 Qualquer mudança no preço do Contrato especificado na Cláusula 38.1 só pode ser feita se as Partes tiverem concordado com o escopo revisado dos Serviços de acordo com a Cláusula CG 16 e modificado por escrito os Termos de Referência no **Apêndice A**.

39. Impostos e Direitos

39.1 O Consultor, os Subconsultores e os Especialistas são responsáveis por cumprir todas as obrigações fiscais decorrentes do Contrato, exceto quando definido de outro modo na **CE.**

39.2 Como exceção para o estabelecido acima e o definido na **CE,** todos os impostos indiretos locais identificáveis (detalhados e finalizados nas negociações do Contrato) são reembolsados ao Consultor ou pagos pelo Cliente em nome do Consultor.

40. Moeda de Pagamento

40.1 Todos os pagamentos previstos neste Contrato deverão ser feitos nas moedas do Contrato.

41. Forma de Cobrança e de Pagamento

41.1 O total de pagamentos no âmbito deste Contrato não deverá exceder o preço do Contrato especificado na Cláusula CEC 38.1.

41.2 Os pagamentos previstos neste Contrato deverão ser feitos em prestações de preço global relativas aos produtos especificados no **Apêndice**

A. Os pagamentos serão feitos de acordo com o cronograma de pagamentos estabelecido nas **CE**.

41.2.1 *Adiantamento:* A menos que seja indicado de outro modo nas **CE**, será efetuado um pagamento antecipado mediante uma garantia bancária para pagamento antecipado aceitável para o Cliente com valor (ou valores) e na moeda (ou moedas) especificados nas **CE**. Essa garantia (i) deverá permanecer válida até que o adiantamento tenha sido totalmente compensado e (ii) deverá ocorrer na forma definida no **Apêndice D**, ou em qualquer outra forma aprovado por escrito pelo Cliente. Os adiantamentos serão pagos pelo Cliente em parcelas iguais contra as prestações de preço global especificadas nas **CE** até que tais adiantamentos tenham sido totalmente pagos.

41.2.2 *Os Pagamentos das Parcelas de Preço Global.* O Cliente deverá pagar ao Consultor no prazo de sessenta (60) dias após o recebimento, por parte do Cliente, dos produtos e da fatura para o respectivo pagamento da parcela de preço global. O pagamento pode ser retido se o Cliente não aprovar os produtos enviados como satisfatórios e, nesse caso, o Cliente deverá fornecer comentários para o Consultor dentro do mesmo período de sessenta (60) dias. O Consultor deverá imediatamente fazer as correções necessárias e, em seguida, o processo deverá ser repetido.

41.2.3 *O Pagamento Final*. O pagamento final previsto nesta Cláusula deverá ser feito somente depois que o relatório final l tiver sido enviado pelo Consultor e aprovado como satisfatório pelo Cliente. Os Serviços deverão então ser considerados concluídos e finalmente aceitos pelo Cliente. A última parcela do preço global será considerada aprovada para pagamento pelo Cliente no prazo de noventa (90) dias corridos após o recebimento do relatório final pelo Cliente, a menos que ele, nesse período de noventa (90) dias corridos, envie um aviso por escrito ao Consultor especificando em detalhes as deficiências nos Serviços, o relatório final. O Consultor deverá imediatamente fazer as correções necessárias e, em seguida, o processo deverá ser repetido.

41.2.4 Todos os pagamentos neste Contrato devem ser efetuados nas contas do Consultor especificadas nas **CE**.

41.2.5 Com exceção do pagamento final descrito em 41.2.3 acima, os pagamentos não representam a aceitação de todos os Serviços nem eximem o Consultor de quaisquer obrigações aqui descritas.

42. Juros sobre Pagamentos Atrasados

42.1 Se o Cliente tiver pagamentos atrasados com mais de quinze (15) dias após a data de vencimento definida na Cláusula CG 41.2.2, deverão ser

pagos juros ao Consultor sobre qualquer montante devido, e não pago, em tal data de vencimento para cada dia de atraso na taxa anual definida nas **CE.**

G. Equidade e Boa-Fé

43. Boa-Fé

43.1 As Partes comprometem-se a agir de boa-fé com relação aos direitos das duas Partes neste Contrato e a adotar todas as medidas razoáveis para garantir a realização dos objetivos deste Contrato.

H. Resolução de Conflitos

44. Solução Amigável

44.1 As Partes devem procurar resolver qualquer controvérsia de forma amigável por meio de consulta mútua.

44.2 Se uma Parte não concordar com qualquer ação ou inação da outra Parte, aquela que tenha discordado poderá apresentar por escrito à outra Parte uma Notificação de Controvérsia, detalhando as razões do conflito. A Parte que receber a Notificação da Controvérsia a levará em consideração e responderá por escrito até 14 (quatorze) dias após o recebimento. Se essa Parte não responder até quatorze (14) dias, ou se a controvérsia não puder ser resolvida de forma amigável até quatorze (14) dias após a resposta da Parte, a Cláusula CG 49.1 deverá ser aplicada.

45. Solução de controvérsias

45.1 Qualquer conflito resultante deste Contrato, que não possa ser solucionado de forma amigável pelas Partes, será submetido a processo judicial/arbitral de acordo com as disposições especificadas nas **CE.**

II. Condições Gerais

Anexo 1: Política do Banco Mundial - Práticas Corruptas e Fraudulentas

(o texto neste Anexo 1 não deve ser modificado)

"Fraude e Corrupção

1.23 É a política do Banco exigir de todos os Mutuários (inclusive dos beneficiários de empréstimos do Banco), consultores e seus agentes (sejam eles declarados ou não), subcontratados, subconsultores, prestadores de serviço e fornecedores, além de todo funcionário a eles vinculado, que mantenham os mais elevados padrões de ética durante a seleção e execução de contratos financiados pelo Banco[1]. De acordo com essa política, o Banco:

(a) define, para fins dessa disposição, as expressões abaixo da seguinte forma:

(i) "prática corrupta" significa oferecer, entregar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor com a intenção de influenciar indevidamente as ações de terceiros[2];

(ii) "prática fraudulenta" significa qualquer ato, falsificação ou omissão de fatos que, de forma intencional ou irresponsável, induza ou tente induzir uma parte a erro, para obter benefício financeiro ou de qualquer outra ordem, ou com a intenção de evitar o cumprimento de uma obrigação;[3];

(iii) "prática colusiva" significa uma combinação entre duas ou mais partes visando alcançar um objetivo indevido, inclusive influenciar indevidamente as ações de outra parte;[4];

(iv) "prática coercitiva" significa prejudicar ou causar dano ou ameaçar prejudicar ou causar dano, direta ou indiretamente, qualquer parte ou a sua propriedade para influenciar indevidamente as ações de uma Parte[5];

---

[1]Nesse contexto, será imprópria qualquer ação realizada por um consultor ou por qualquer dos seus funcionários, seus agentes ou seus subconsultores, subempreiteiros, prestadores de serviço, fornecedores e/ou seus empregados, no intuito de influenciar o processo de seleção ou a execução do contrato para obter uma vantagem indevida é imprópria.

[2] Para a finalidade deste subparágrafo, "terceiros" refere-se a um funcionário público que atue no processo de seleção ou na execução do contrato. Neste contexto, "funcionário público" inclui a equipe do Banco Mundial e os funcionários de outras organizações que examinam ou tomam decisões sobre a seleção.

[3] Para a finalidade deste subparágrafo, "Parte" refere-se a um funcionário público; os termos "benefício" e "obrigação" são relativos ao processo de seleção ou à execução do contrato; e "ato ou omissão" tem como objetivo influenciar o processo de seleção ou a execução do contrato.

[4] Para os fins deste parágrafo, "parte" refere-se aos participantes do processo de aquisição ou seleção (inclusive funcionários públicos) que tentam por si mesmos ou por intermédio de outra pessoa ou entidade que não participe do processo de aquisição ou seleção simular a concorrência ou estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos ou ter acesso as propostas financeiras e outras condições.

[5] Para a finalidade deste subparágrafo, "parte" refere-se a um participante do processo de seleção ou da execução do contrato.

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47818494) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 27

(v) "prática obstrutiva" significa

(aa) deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigações ou fazer declarações falsas a investigadores, com o objetivo de impedir materialmente uma investigação do Banco de alegações de prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameaçar, perseguir ou intimidar qualquer parte interessada, para impedi-la de mostrar seu conhecimento sobre assuntos relevantes à investigação ou ao seu prosseguimento, ou

(bb) atos que tenham como objetivo impedir materialmente o exercício dos direitos do Banco de promover inspeção e auditoria;

(b) rejeitará a recomendação de outorga se determinar que o consultor recomendado para a outorga do contrato, ou algum membro da sua equipe, seus agentes ou seus subconsultores, subempreiteiros, prestadores de serviço, fornecedores e/ou algum empregado destes se envolveu, de forma direta ou indireta, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao concorrer para o contrato em questão;

(c) declarará viciado o processo de seleção e cancelará a parte do Empréstimo alocado para um contrato se, a qualquer momento, concluir que os representantes do Mutuário ou de um beneficiário do Empréstimo se envolveram em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas, durante o processo de seleção ou de execução do contrato em questão, sem que o Mutuário tenha adotado medidas oportunas e adequadas, satisfatórias ao Banco, para resolver essas práticas quando ela ocorrer, inclusive ao não informar ao Banco de modo oportuno no momento que tomou conhecimentos dessas práticas;

(d) sancionará uma firma ou pessoa física a qualquer tempo, de acordo com procedimentos vigentes de sanções do Banco[6], inclusive declarando-a inelegível indefinidamente ou por prazo determinado para: (i) a outorga de um contrato financiado pelo Banco, e (ii) ser designado[7] como subconsultor, consultor, fabricante, fornecedor ou prestador de serviços de uma outra firma elegível a quem tenha sido outorgado um contrato financiado pelo Banco.

---

[6] Uma firma ou uma pessoa física pode ser declarada inelegível para outorga de um contrato financiado pelo Banco após (i) a conclusão do processo de sanções do Banco, conforme seus procedimentos de sanções, incluindo nomeadamente: impedimento cruzado, conforme acordado com outras Instituições Financeiras Internacionais, incluindo Bancos Multilaterais de Desenvolvimento e procedimentos de sanções por fraude e corrupção e (ii) em conseqüência de suspensão temporária ou suspensão temporária preventiva relacionada a procedimento de sanções em andamento. Ver nota de rodapé 12 e parágrafo 8 do Apêndice 1 das Diretrizes de Consultores, datadas de janeiro de 2011.

[7] Um subconsultor, fornecedor, ou prestador de serviços designado é qualquer que (i) foi incluído pelo consultor na sua proposta porque traz experiência específica e conhecimentos específicos ou cruciais que são considerados na avaliação técnica da proposta do consultor para os serviços em questão; ou (ii) designado pelo Mutuário.

III. Condições Especiais do Contrato

[As notas em colchetes são para fins de orientação apenas e devem ser excluídas no texto final do contrato assinado.]

Número da Cláusula CG	Emendas, Suplementos e Cláusulas nas Condições Gerais de Contrato
1.1(b) e 3.1	**O Contrato deve ser interpretado de acordo com a lei do(a)** Brasil
4.1	**O idioma é: português**.
6.1 e 6.2	**Os endereços são:** Cliente: *Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa – ADETUC* A/C de: Lorena Christie Ribeiro de Santana Fax: +55 63 3218-5802 E-mail (onde permitido: pesquisa@adtur.to.gov.br Consultor:_ ***Consórcio Iber-Geo Consulting/Mcrit, S.L/Meridiano Zero, S.L*** A/C de: Judith Muntal Fax::+55 34 609230142 E-mail (onde permitido): jmuntal@ibergeo.com
8.1	**O Membro Lider** em nome do ***Consórcio Iber-Geo Consulting*** com sede na Rua Guardia, 12, Irla B 08001, Barcelona, Espanha CIF N° B-61463188 e CNPJ como empresa domiciliada no exterior sob n° 26.485.154/0001-04, neste ato representado

	pelo seu procurador Sr. Marcelo Marcos da Silva Fonseca, brasileiro, casado, contador, RG 18.606.068-3 SSP/SP e CPF/MF 28.072.088-35
9.1	**Os Representantes Autorizados são:** **Para o Cliente:** Lorena Christie Ribeiro de Santana – Gerente de Pesquisa e Informações Turísticas **Para o Consultor:** Judith Muntal - Representante legal do Consórcio.
11.1	**As condições de vigência são as seguintes**: A partir da emissão da ordem de início dos serviços.
12.1	**Rescisão do Contrato por Não Entrar em Vigor:** **O período deve ser de 90 (noventa) dias.**
13.1	**Início dos Serviços:** **A partir da emissão da ordem de início de serviços.** Confirmação da disponibilidade dos Especialistas Principais para iniciar o Serviço deve ser enviada ao Cliente por escrito, na forma de Declaração assinada por cada Especialista Principal.
14.1	**Término do Contrato:** **O período deve ser 180 (cento e oitenta) dias**
21 b.	**O Cliente se reserva o direito de determinar caso a caso se o Consultor deve ser desqualificado do fornecimento de bens, obras ou serviços de não consultoria devido a um conflito de uma natureza descrita na Cláusula CG 21.1.3.** Sim_____ Não _____
23.1	**Nenhuma disposição adicional.** *[OU:* A seguinte limitação da Responsabilidade do Consultor em relação ao Cliente pode estar sujeita às negociações do Contrato:

	"Limitação da Responsabilidade do Consultor em relação ao Cliente: (a) **Exceto no caso de falta grave ou dolo por parte do consultor ou de qualquer pessoa ou empresa em nome do Consultor na realização dos Serviços, o Consultor, em relação ao dano causado por ele ao bem do Cliente, não será responsabilizado em relação ao Cliente:** (i) **por quaisquer danos indiretos ou emergentes ou prejuízos especulativos; e** **(ii) por quaisquer perdas ou danos diretos que excedam [inserir um multiplicador, por exemplo, uma, duas, três] vezes o valor total do Contrato;** **(b) Esta limitação de responsabilidade não deverá:** **(i) afetar a responsabilidade do Consultor, se houver, por danos a terceiros causados pelo Consultor ou por qualquer pessoa ou empresa em nome do Consultor na execução dos Serviços;** **(ii) ser interpretada como uma disposição que proporcione ao Consultor qualquer limitação ou exclusão de responsabilidade, o que é proibido pelas diretrizes do Banco Mundial, Lei 8666/93 e Lei 4.320/64.** *[Notas para o Cliente e o Consultor: Quaisquer sugestões feitas pelo Consultor na Proposta para apresentar exclusões/limitações de responsabilidade do Consultor nos termos do Contrato deverão ser cuidadosamente analisadas pelo Cliente e discutidas com o Banco antes de aceitar quaisquer alterações no que foi incluído na SDP enviada. Nesse contexto, as Partes devem ficar cientes de que a política do Banco Mundial sobre esse assunto é a seguinte:* *Para ser aceitável para o Banco Mundial, qualquer limitação da responsabilidade do Consultor deve pelo menos estar consideravelmente associada (a) ao dano que o Consultor pode potencialmente causar ao Cliente, e (b) à capacidade do Consultor de pagar uma indenização usando seus próprios ativos e uma cobertura de seguro que possa ser obtida de forma razoável. A responsabilidade do Consultor não deve ser limitada a menos do que um multiplicador do total de pagamentos ao Consultor no Contrato para fins de remuneração e despesas de reembolso. Uma declaração no sentido de que o Consultor é responsável apenas pela nova execução dos Serviços com problemas não é aceitável para o Banco Mundial. Além disso, a responsabilidade do Consultor nunca deve ser limitada pelas perdas ou danos causados por falta grave ou dolo por parte do Consultor.* *O Banco Mundial não aceita uma disposição no sentido de que o Cliente deverá indenizar e isentar de responsabilidade o Consultor contra reclamações de Terceiros, exceto, logicamente, quando uma reclamação for decorrente de perdas ou danos causados por um ato de inadimplemento ou ato indevido por parte do Cliente até onde possível pela legislação aplicável no país do Cliente.]*

24.1	**A cobertura de seguro contra os riscos deve ser feita como a seguir:** **(a) Seguro de responsabilidade profissional, com cobertura mínima de** 268.812,50 EUR (duzentos e sessenta e oito mil, oitocentos e doze euros e cinquenta cêntimos).
27.1	Nenhuma disposição adicional
27.2	**O Consultor não deve usar esses documentos e software para finalidades não relacionadas a este contrato sem a prévia autorização por escrito do cliente.** **O Cliente não deve usar esses documentos e software para finalidades não relacionadas a este Contrato sem a prévia aprovação por escrito do Consultor.** **Nenhuma das Partes deve usar esses documentos e software para finalidades não relacionadas a este Contrato sem a prévia aprovação por escrito da outra Parte.**
32.1 **(a) até (e)**	Nenhuma disposição adicional
32.1(f)	Não se aplica
38.1	**O preço do Contrato é:** 268.812,50 EUR (duzentos e sessenta e oito mil, oitocentos e doze euros e cinquenta cêntimos). **Quaisquer impostos locais indiretos passíveis de cobrança em relação a este Contrato para os Serviços fornecidos pelo Consultor devem reembolsados pelo Cliente o Consultor.** **O montante de tais impostos é** 53.762,50 EUR (cinquenta e três mil, setecentos e sessenta e dois euros e cinquenta cêntimos).
39.1 e 39.2	**O Cliente reembolsará o Consultor, os Subconsultores e os Especialistas, quaisquer impostos indiretos, encargos, taxas, tributos e outras imposições aplicadas ao Consultor, aos Subconsultores e Especialistas nos termos da legislação aplicável na legislação do país do Cliente em relação a:** **(a) quaisquer pagamentos efetuados ao Consultor, Subconsultores e Especialistas (exceto nacionais ou residentes permanentes do país do Cliente), juntamente com a realização dos Serviços;**

(b) **quaisquer equipamentos, materiais e suprimentos trazidos para o país do Cliente pelo Consultor ou Subconsultores com o objetivo de realizar os Serviços e que, após terem sido trazidos para tais territórios, serão mais tarde retirados por eles;**

(c) **quaisquer equipamentos importados, com o objetivo de realizar os Serviços e pagos com os recursos financeiros fornecidos pelo Cliente e que são tratados como bens do Cliente;**

(d) **quaisquer bens trazidos para o país do Cliente pelo Consultor, quaisquer Subconsultores ou Especialistas (exceto nacionais ou residentes permanentes do país do Cliente), ou pelos dependentes legais daqueles Especialistas para seu uso pessoal e que serão posteriormente retirados por eles ao partirem do país do Cliente, desde que:**

(i) o Consultor, Subconsultores e Especialistas cumpram os procedimentos normais de alfândega do país do Cliente na importação de bens para o país do Cliente; e

(ii) se o Consultor, Subconsultores ou Especialistas não retirarem, mas descartarem quaisquer bens no país do Cliente que tenham sido beneficiados com isenção de impostos e direitos aduaneiros, o Consultor, Subconsultores ou Especialistas, conforme o caso, (a) assumirão os impostos e direitos aduaneiros de acordo com as regulamentações do país do Cliente, ou (b) reembolsarão o Cliente caso este os tenha pagado no momento em que os bens em questão foram trazidos para o país do Cliente.

41.2 **O cronograma de pagamento:**

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E DESEMBOLSO			
Produtos	Descrição	Prazo (acumulativo)	Desembolso
	➢ Revisão e Ajustes do Plano de Trabalho	02 dias	---
PRODUTO 01 - MODELO DE GOVERNANÇA	➢ Definição do modelo de governança e elaboração do planejamento estratégico e operacional do observatório de turismo do estado do	29 dias	30%

	PRODUTO 02 – ESTUDOS E PESQUISAS	➢ Realização de estudos e pesquisas e elaboração do Boletim de Desempenho Econômico do Turismo no Estado do Tocantins	59 dias	30%
	PRODUTO 03 – CAPACITAÇÃO EM ESTATÍSTICA, PLANEJAMENTO E METODOLOGIAS PARA OPERAÇÃO DE PESQUISAS E INDICADORES DE TURISMO	➢ Capacitação em planejamento e metodologias de operação e análise em estudos, pesquisas e indicadores de turismo.	112 dias	30%
	RELATÓRIOS PRELIMINARES E FINAL	➢ Versão final - Elaboração de Relatórios e Apresentação dos produtos anteriores 01, 02, 03.	120 dias	10%
41.2.1	Não será efetuado nenhum pagamento antecipado.			
41.2.4	**As contas são:** **1) IBER-GEO CONSULTING, S.LU. (54%)** CIF nº B-61463188 CNPJ: 26.485.154/0001-04 Dados bancários: Banco: BANC DE SABADELL (SWIFT: BSABESBB) IBAN: ES46 0081 0205 5400 0138 2343 **2) MERIDIANO ZERO MARKETING, S.L. (29%)** CIF sob nº B31917149 Dados bancários: Banco: BANKINTER IBAN: ES63 0128 3431 8101 0000 1203 **3) MULTICRITERIA-MCRIT, A.I.E (17%)** CIF nº B58677428 Dados bancários: Banco: CAIXABANK IBAN: ES59 2100 4434 8602 0000 4881			

42.1	**A taxa de juros é**: 6%a.m
45.1	*[Em contratos com consultores estrangeiros, o Banco Mundial requer que seja usada a arbitragem comercial internacional em um local neutro.]* **As controvérsias serão resolvidas por arbitragem de acordo com as seguintes disposições:** 1. Seleção de Árbitros. Cada controvérsia enviada por uma Parte à arbitragem deve ser ouvida por um único árbitro ou por um painel de arbitragem composto de três (3) árbitros, de acordo com as seguintes disposições: (a) Quando as Partes concordarem que o objeto da disputa refere-se a um assunto técnico, poderão ajustar a indicação de um só árbitro ou, caso não haja consenso sobre a identidade deste até 30 (trinta) dias depois que a outra Parte tiver recebido a proposta de um nome pela Parte que iniciou o processo, qualquer das Partes poderá solicitar *à(ao) Federação Internacional de Engenheiros Consultores (FIDIC) de Lousanne, Suiça uma relação com cinco candidatos no mínimo* e, uma vez recebida essa lista, as Partes eliminarão alternadamente os nomes nela contidos até restar apenas um, que será o do único árbitro responsável pela solução do conflito. Caso o último candidato não tenha sido selecionado dessa maneira no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de recebimento da lista, à*Federação Internacional de Engenheiros Consultores (FIDIC) de Lousanne, Suiça* apontará, por solicitação de qualquer uma das Partes, um único árbitro para resolver tal disputa, com base na lista apresentada ou de outro modo (b) Quando as Partes não concordarem que a disputa refere-se a uma questão técnica, o Cliente e o Consultor indicarão separadamente um árbitro, e esses dois árbitros designarão um terceiro árbitro que presidirá o tribunal de arbitragem. Se os árbitros indicados pelas Partes não obtiverem sucesso na escolha de um terceiro árbitro no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data da designação do último dos dois árbitros, a pedido de qualquer das Partes, o terceiro árbitro será indicado pelo *Secretário da Corte Permanente de Arbitragem de Haia.*(c) Se, em uma disputa sujeita à Cláusula CE 8.2.1 (b), uma Parte não indicar um árbitro no prazo de 30 (trinta) dias após a outra Parte ter designado o outro árbitro, a Parte que fez a designação poderá solicitar [ao] [à] *Secretário da Corte Permanente de Arbitragem de Haia*. que aponte um único árbitro, a quem caberá solucionar a disputa.

	2. Normas de procedimento. Exceto conforme estabelecido neste Contrato, o processo de arbitragem será conduzido de acordo com as normas para essa finalidade estabelecidas pela Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional (UNCITRAL), que estejam em vigor na data deste Contrato. 3. Substituição de árbitros. Se, por qualquer razão, um árbitro não puder desempenhar suas funções, será apontado um substituto da mesma forma adotada para indicação do árbitro original. 4. Nacionalidade e Qualificações de Árbitros. O árbitro único ou o terceiro árbitro indicado de acordo com os parágrafos 1(a) até 1(c) acima, deverá ser um especialista em questões jurídicas ou técnicas internacionalmente reconhecido e com vasta experiência na matéria em disputa, não podendo ser natural do país de origem do Consultor *[Se o Consultor consistir em mais de uma entidade, acrescente:* nem do país de origem de nenhum de seus Membros ou Partes*]* nem do país do Governo. Para a finalidade desta Cláusula, "país de origem" significa: (a) o país de incorporação do Consultor *[Se o Consultor consistir em mais de uma entidade, acrescente:* ou de qualquer de seus Membros ou Partes*]*; ou (b) o país onde está situado o local de negócios principal do Consultor [ou de qualquer dos seus Membros ou Partes]; ou (c) o país de nacionalidade da maioria dos acionistas do Consultor [ou de qualquer dos seus Membros ou Partes]; ou (d) o país de nacionalidade dos Subconsultores envolvidos, quando a disputa se referir a um subcontrato.
	5. Disposições gerais. Em qualquer processo de arbitragem nos termos deste Contrato: (a) exceto quando as Partes acordarem de outra forma, esses procedimentos serão realizados em *Lousanne, Suíça.* (b) o idioma*português* será o idioma oficial para todos os fins; e (c) a decisão do único árbitro ou da maioria dos árbitros (ou do terceiro árbitro não havendo essa maioria) será final e obrigatória, aplicável por qualquer tribunal da jurisdição competente, renunciando as Partes, por meio deste instrumento, a qualquer objeção ou reivindicação de imunidade em relação ao cumprimento de tal decisão.

IV. Apêndices

APÊNDICE A - TERMOS DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO OBSERVATÓRIO DE TURISMO DO ESTADO DO TOCANTINS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO OBSERVATÓRIO DO TURISMO DO ESTADO DO TOCANTINS

1. INTRODUÇÃO

O Turismo vem se consolidando como atividade socioeconômica de significativa importância na economia mundial. Os dados referentes a 2014 confirmaram as expectativas otimistas da agência especializada de turismo das Nações Unidas a World Tourism Organization – UNWTO (Organização Mundial de Turismo – OMT), estimando-se que tenham sido alcançadas 1,138 bilhão de chegadas, ou seja, cerca de 51 milhões a mais do que em 2013 – o aumento de 4,7% é bem mais elevado do que o projetado pela UNWTO para o período 2010/2020 (+3,8%), valendo destacar que 2014 bateu um novo recorde em termos de chegadas internacionais de turistas, superando a marca de 1,1 bilhão.

Segundo a Braztoa (Associação Brasileira de Operadoras de Turismo) embarcaram 5,12 milhões de passageiros durante todo o ano, apontando um aumento, mesmo que tímido, em relação ao ano interior, impulsionado pelo crescimento da procura pelos destinos domésticos. No setor de distribuição de viagens de lazer, o turismo conseguiu passar por 2016 registrando aumento em faturamento, atingindo R$ 11,33 bilhões de movimentação financeira por parte das operadoras de turismo. A intensa movimentação do fluxo turístico doméstico e a valorização do dólar frente ao real, incentivando a atração de turistas internacionais, vêm possibilitando a estruturação e manutenção da oferta de produtos e serviços turísticos e gradativamente fortalecendo a atividade turística no País, o que evidencia a importância do mercado interno para a consolidação do turismo de forma sustentável.

A atração de demandas turísticas induzidas ou espontâneas, assim como investidores, empresas e serviços do setor turístico dependem cada vez mais da produção de informações relevantes, confiáveis, em tempo hábil e a custo condizente, atendendo aos requisitos operacionais, gerenciais e possibilitando a tomada de decisão.

Com vistas a avaliação e ao acompanhamento do fluxo turístico doméstico nacional e internacional no Estado do Tocantins, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura busca por meio desta consultoria implantar o Observatório de Turismo do Estado do Tocantins, com sede em Palmas – TO.

O Observatório do Turismo será de grande importância para produção de informações específicas sobre o fenômeno turístico no Estado do Tocantins, contribuindo com a coleta, tratamento, análise, geração e monitoramento de dados e informações turísticas, transformando-se num instrumento de suporte para o planejamento, a gestão e o monitoramento do turismo, subsidiando as decisões empresariais de investimentos e a formatação de políticas públicas sustentáveis voltadas para os destinos turísticos do Estado do Tocantins.

2. CONTEXTO DOS SERVIÇOS E ANTECEDENTES

O Governo do Estado do Tocantins negociou umcontrato de empréstimo (Nº 8185-0/BR) com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), para financiamento da execução do Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável do Tocantins (PDRIS).

A presente contratação de consultoria para Implantação do Observatório do Turismo do Estado do Tocantins tem como fonte financiadora o PDRIS que tem como executores a Secretaria do Planejamento e Orçamento (SEPLAN)a Agência Tocantinense de Transportes e Obras (AGETO), a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH), a Secretaria da Educação, Juventude e Esportes (SEDUC), a Secretaria da Agricultura, da Pecuária e do Desenvolvimento Agrário (SEAGRO) e o Instituto Natureza do Tocantins (NATURATINS). Em novembro de 2015, na Missão do BIRD a Revisão de Meio Termo do PDRIS a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura - SEDEN passou a integrar ao conjunto de entidades executoras do Acordo de Empréstimo Nº 8185-0/BR.

A coordenação geral do PDRIS está sob responsabilidade da Unidade de Gerenciamento do Projeto - UGP-PDRIS, por meio da Diretoria Geral de Assuntos Estratégicos da SEPLAN.

O Projeto tem por objetivo fomentar o melhoramento da eficácia do transporte rodoviário e a eficiência na seleção dos serviços públicos em apoio ao desenvolvimento integrado e territorialmente equilibrado do Estado, os objetivos serão atingidos com o apoio ao melhoramento da acessibilidade das populações, territórios e regiões produtivas aos trabalhos, serviços, recursos e mercados e o reforço institucional para contribuir na modernização da gestão do serviço público, reforço das atividades econômicas locais nos territórios, melhoria da gestão ambiental e nos serviços educacionais. O Projeto é constituído pelos seguintes componentes e seus respectivos subcomponentes:

(1) O melhoramento da eficácia do transporte rural:

(i) *Melhoramento das condições de transporte nas redes municipais;*

(ii) *Rejuvenescimento e melhoramento da eficiência do gerenciamento da malha rodoviária estadual pavimentada através da implementação de contratos CREMA (Conservação, Restauração e Manutenção);*

(iii) *Melhoramento das condições de transporte na rede estadual e da segurança rodoviária nas estradas estaduais não pavimentadas;*

(iv) *Melhoramento da capacidade de planejamento e gerenciamento do transporte e da logística, incluindo nos seus aspectos de segurança, no Estado através de apoio institucional.*

(2) O melhoramento da eficiência e seleção dos serviços públicos:

(i) *Modernização da administração via a introdução de uma cultura de Gestão para Resultados, onde o Planejamento Estratégico é o pilar principal. Cada órgão deverá ter seu planejamento estratégico e o Mapa Estratégico alinhado às estratégias do governo;*

(ii) *Apoio ao desenvolvimento da produção local, principalmente por meio do desenvolvimento de projetos pilotos de capacitação, infraestrutura e cadeia de produção;*

(iii) *Melhoramento do gerenciamento ambiental e desenvolvimento rural em articulação com os outros componentes e o GEF, nas áreas do melhoramento do licenciamento, da proteção da biodiversidade e da gestão dos recursos hídricos;*

(iv) *Melhoramento da qualidade na educação via a implementação de sistemas de informação e gerenciamento, capacitação e apoio a populações frágeis.*

No Melhoramento da Eficiência dos Serviços Públicos Selecionados objetiva-se fomentar o desenvolvimento local com crescimento sustentável e melhorar os serviços públicos: (i) modernização da administração via a introdução de uma cultura de Gestão para Resultados, a descentralização e a otimização do uso da terra; (ii) apoio ao desenvolvimento da produção local, principalmente, através do desenvolvimento de projetos pilotos de capacitação, infraestrutura e cadeia de produção; (iii) melhoramento do gerenciamento ambiental e desenvolvimento rural em articulação com os outros componentes e o GEF nas áreas do melhoramento do licenciamento, da proteção da biodiversidade e da gestão dos recursos hídricos; e (iv) melhoramento da qualidade na educação via a implementação de sistemas de informação e gerenciamento, capacitação e apoio a populações frágeis.

3. ÁREA DE ABRANGÊNCIA

Para implantação do Observatório de Turismo do Estado do Tocantins Governo do Estado foi escolhida a capial Palmas, com sede na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura do Estado do Tocantins – SEDEN.

PALMAS:

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47818494) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 40

A cidade de Palmas está situada na região central do Estado e é a mais nova capital planejada do País, entre o Lago da UHE – Lajeado, com 680 km², e a Serra do Lajeado. Foi eleita como destino indutor de desenvolvimento do turismo pelo Ministério do Turismo. Conta com o Aeroporto Brigadeiro Lysias Rodrigues com capacidade de 370 mil pax/ano e atualmente tem uma média de embarque/desembarque 221 mil pax/ano. O principal potencial é o turismo de negócios e eventos além de receber os turistas com destino aos todos os polos turísticos do Estado.

4. DELIMITAÇÕES GERAIS DO OBJETO

O objeto de contratação deste Termo de Referência visa a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria visando à Implantação do Observatório do Turismo do Estado do Tocantins. A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura – SEDEN sediará o observatório em referência. Os serviços incluem a elaboração do modelo de governança e de estrutura organizacional do observatório do Observatório de Turismo do Estado do Tocantins, assim como o seu plano estratégico, operacional e de sustentabilidade orçamentária; a realização de estudos e pesquisas primárias e o levantamento e análise de informações e dados econômicos para elaboração do Boletim de Desempenho Econômico do Turismo no Estado do Tocantins, além de realização de capacitações para a equipe do observatório de turismo (permanente/colaboradores) em metodologias de planejamento, operações e análises de estudos e pesquisas sobre o setor turístico tocantinense.

O projeto do Observatório do Turismo do Tocantins foi concebido a partir do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável - PDITS, com a perspectiva de apoiar na implementação da Política Estadual de Turismo do Estado, por meio da elaboração e consolidação das estratégias de gestão pública do turismo estadual.

5. OBJETIVO GERAL

Conceber um arcabouço e metodologias de gestão e de governança, realizar capacitações, elaborar estudos, pesquisas e indicadores de turismo, assim como o planejamento estratégico e operacional para subsidiar a construção e implantação do Observatório do Turismo do Estado do Tocantins, com vistas a conformação de uma ferramenta de referência para o apoio às estratégias e aos processos de tomada de decisão, que possam reforçar as capacidades institucionais na gestão, nas estratégias e açoes de marketing e de comunicação das informações turísticas, assim como na formulação e monitoramento de políticas públicas e mobilização da iniciativa privada.

5.1 Objetivos Específicos

- Criaro modelo metodológico e o arcabouço de gestão e governança, assim como elaborar

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47818494) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 41

o planejamento estratégico e operacional do Observatório de Turismo do Estado do Tocantins;

- Elaborar o Boletim de Desempenho Econômico do Turismo no Estado do Tocantins por meio de estudos, pesquisas e levantamento e análises de dados e informações disponíveis;
- Realizar capacitações para transferência de conhecimento emmetodologias de planejamento, operações e análises de estudos e pesquisas do setor de turismo tocantinense.
- Definir indicadores qualitativos e quantitativos para gestão das atividades turísticas.

6. JUSTIFICATIVA

Com o panorama social marcado pela valorização do conhecimento, pela facilidade de acesso a informação e pelo aumento da competitividade, a tomada de decisões no direcionamento de esforços e no dimensionamento do investimento públicoou privado vem dependendo cada vez mais da disponibilidade de informações estratégicas e confiáveis.

Neste sentido o monitoramento de informações estratégicas e indicadores do segmento turístico de forma constante e consistente são imprescindíveis para promoção turística e para o aumento da qualidade e competitividade dos destinos, produtos e serviços turísticos ofertados no Estado do Tocantins.Os estudos e pesquisassão de grande utilidade para o desenvolvimento de políticas públicas para atração de fluxos turísticos nacionais e internacionais, assim como para a criação, atração e fixação de empreendimentos privados.

Dianteda escassez de informações a respeito do setor de turismo no Estado do Tocantins e a falta de dados confiáveis para avaliar a dimensão do impacto do turismo na economia estadual, e nas localidades receptoras de turistas, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura do Tocantins (SEDEN) objetiva implantar o Observatório de Turismo do Estado do Tocantins e iniciar a formação de uma base de dados socioeconômicos e setoriais capaz de fornecer informações sobre a situação histórica e atual do mercado turístico estadual.

7. ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DO OBSERVATÓRIO DE TURISMO DO ESTADO DO TOCANTINS

Deverão ser considerados, os seguintes aspectos quanto aos serviços, estrutura organizacional/operacional pelo Observatório de Turismo do Estado do Tocantins a partir da sua implantação, a saber:

7.1 Principais Serviços do Observatório de Turismo

- Geração de estudos e pesquisas primárias e secundárias sobre o mercado turístico local e regional;
- Monitoramento da matriz de indicadores qualitativos e quantitativos quanto ao desenvolvimento da atividade turística (avanço do setor) em nível local e regional, incluindo indicadores de impacto sociocultural, ambiental e econômico e de qualidade dos serviços turísticos;
- Subsidiar dados e informações para a tomada de decisão nos processos de elaboração, execução e monitoramento de políticas públicas e projetos estratégicos voltados para o desenvolvimento turístico estadual;
- Realização de capacitações, congressos, feiras e eventos afins;
- Gestão e divulgação de dados e Informações de apoio ao turista e ao empreendedor.

7.2 Estrutura Organizacional e Operacional

O Observatório de turismo terá como sede a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura – SEDEN, município de Palmas, onde serão alocados o Centro Operacional e o Banco de Dados do Observatório de Turismo. A proposta de estrutura organizacional do observatório de turismo deverá considerar a análise da estrutura organizacional /operacional existente pela SEDEN, incluindo a disponibilidade atual e futura de técnicos permanentes, temporários e colaboradores eventuais.

Sob responsabilidade da Diretoria de Planejamento e Projetos Estratégicos / Gerência de Pesquisa e Informação Turística, o Observatório de Turismo irá dispor para sua operacionalização de técnicos e gestores, eventuais colaboradores, lotados na Superintendência de Turismo da SEDEN e demais instituições. Na equipe permanente do Observatório de Turismo incialmente serão alocados profissionais com as seguintes formações: 04 bacharéis em Turismo, 01 bacharel em economia; 01 bacharel em comunicação social, 03 assistentes administrativos / pesquisadores.

7.3 Governança, Gestão e Manutenção

A sede da SEDEN (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura) foi selecionada para implantação do Observatório. Desta forma a manutenção das instalações físicas, equipamentos, recursos humanos e atividades operacionais do Observatório de Turismo serão de responsabilidade da SEDEN, por meio da **ação orçamentária nº 2084 - Implantação, Manutenção e Operacionalização do Observatório de Turismo do Estado do Tocantins,**prevista no PPA do Governo do Estado do Tocantins (2006-2019), aprovado pela Lei Estadual nº 3.051, de 21 de dezembro de 2015. A referida ação orçamentária está relacionada ao objetivo estratégico "Ampliar a Gestão e a Disponiblilização de Informações Turísticas" previsto na Agenda Estratégica do Governo do Tocantins - 2030, vinculada e priorizada no Mapa Estratégico do Estado. Este objetivo estratégico prevê metas para

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47818494) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 43

serem alcançadas até o ano de 2019, no âmbito da ação orçamentária nº 2084, tendo como indicador de monitoramento do PPA: "Índice de Estrtuturação do Observatório de Turismo do Estado do Tocantins".

O modelo de governança, gestão, operação do observatório deverá considerar e apresentar os aspectos legais, a sustentabilidade orçamentária e a estrutura necessária para criação e manutenção do observatório.

A criação, definição e implementação do modelo de gestão e governança do Observatório de Turismo do Estado do Tocantins será de responsabilidade da empresa contratada, assim como a elaboração do plano estrátégico e operacional do Observatório de Turismo do Estado do Tocantins.

8. PLANO DE TRABALHO

Antes de iniciar a execução dos serviços previstos nos produtos deste Termo de Referência a empresa contratada deverá realizar o planejamento da consultoria e apresentar plano de trabalho revisado.

Após aprovado o plano de trabalho revisado, pela equipe técnica responsável da SEDEN, a empresa deverá imediatamente executar os serviços planejados para entrega dos produtos previstos neste Termo de Referência.

9. PRODUTOS E SERVIÇOS ESPERADOS

A seguir são apresentadas os serviços previstos neste Termo de Referência, que incluem: a elaboração do modelo de governança e de estrutura organizacional do observatório do Observatório de Turismo do Estado do Tocantins, assim como o seu plano estratégico e operacional;o levantamento e análise de informações e dados econômicos para elaboração do Boletim de Desempenho Econômico do Turismo no Estado do Tocantins, além de realização de capacitações para a equipe do observatório de turismo (permanente/colaboradores) em metodologias de planejamento, operações e análises de estudos e pesquisas sobre o setor turístico tocantinense.

9.1 PRODUTO 01 –DEFINIÇÃO DO MODELO DE GOVERNANÇA E ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E OPERACIONAL DO OBSERVATÓRIO DE TURISMO DO ESTADO DO TOCANTINS

Neste produto a consultoria contratada deverá elaborar e apresentar o modelo de governança e de estrutura organizacional do observatório do Observatório de Turismo do Estado do Tocantins, assim como o seu plano estratégico e operacional.

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47818494) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 44

O observatório de turismo terá sede em Palmas, sendo um departamento alocado juntoao órgão oficial de turismo do Tocantins, atualmente integrado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Turismo e Cultura do Tocantins – SEDEN. Para concepção do modelo de governança, de gestão operação, e da estrutura organizacionaldo Observatório de Turismo do Estado do Tocantins a contratada deverá observar outros Observatórios de Turismo já implantados assim como organizações similares existentes nos no Brasil ou em outros países. Deverão ser pesquisados, avaliados e apresentados modelos de no mínimo 03 Observatórios de Turismo como referências.

Atividade 01 – Elaboração do Modelo de Governança e Estrutura Organizacional do Observatório do Observatório de Turismo do Estado do Tocantins

A empresa contratada deverá elaborar e apresentar modelos metodológicos de gestão, incluindo a estrutura organizacional e de governança do observatório de turismo, que deverão ser definidas, juntamente com a SEDEN, assim como as atribuições do observatório, a capacidade operacional e a equipe necessária para execução das ações e alcance dos seus objetivos planejados.

Atividade 02 - Planejamento Estratégico/Operacional do Observatório de Turismo

Nesta atividade a contratada deverá elaborar o plano estratégico e operacional do observatório de turismo, incluindo o plano de sustentabilidade orçamentária. Serão definidas juntamente com a SEDEN, a missão, visão, valores e as estratégias de atuação e de interação/gestão do observatório com os demais departamentos do órgão oficial de turismo do Estado do Tocantins, além de indicar seus objetivos estratégicos, programas, ações, estudos, pesquisas e painel de indicadores, com seus respectivos atributos. Quanto a seleção de procedimentos, ações e projetos de pesquisa:o Plano de Ação deve apresentar uma visão geral do conjunto de ações, atividades e projetos de pesquisa a serem realizados para o alcance dos objetivos do Observatório de Turismo do Tocantins em um horizonte temporal, no mínimo, 10 anos, e devendo ser estabelecida a relação de cada ação com as estratégias, vinculando-as aos objetivos e às correspondentes metas físicas e orçamentárias. Neste sentido o referido planejamento operacional do observatório de turismo deverá prever um plano de sustentabilidade orçamentária para assegurar a sua manutenção e o alcance dos seus objetivos.

As açõespropostas devem ser agrupadas por componente, preparando-se uma descrição do seu conjunto, com as seguintesindicações: Objetivo; Justificativa; Descrição da ação; Custo Estimado; Produtos e Resultados, Indicador de turismo e fontes de verificação destes indicadores;

Deverão ser acrescentadas às descrições contidas no Plano de Ação, os seguintes itens: entidades parceiras para implantação/ operação/ manutenção do serviço (com estimação de custos de contrapartidas) e cronograma temporal das ações e atividades a serem realizadas. Deverão ser apresentadas as memórias de cálculo ou documentos de referência para dimensionamento das contrapartidas.

O dimensionamento do Investimento Total deverá ocorrer de forma a indicar as açõespor componente. Deverá ainda ser estruturado umquadroque apresente os investimentostotais a serem realizados, identificando-se a cotação de câmbio utilizada. Deverão ser apresentadas as memórias de cálculo ou documentos de referência para dimensionamento dos investimentos.

As ações deverão serobjeto de priorização, seja em decorrência da lógica da relaçãoentre as mesmas, ou por necessidade de préviacapacitação institucional do seu executor. Deverão ser concebidas ações de curto, médio, longo prazo e contínuas, de forma a serem integradas nos Planos Plurianuais, Leis Orçamentárias Anuais e Leis de Diretrizes Orçamentárias do órgão oficial de turismo do governo do Estado do Tocantins.

9.2 PRODUTO 02 – ELABORAÇÃO DO BOLETIM DE DESEMPENHO ECONÔMICO DO TURISMO NO ESTADO DO TOCANTINS

Boletim de Desempenho Econômico do Turismo

Neste produto deverá ser elaborado a1ª versão do Boletim de Desempenho Econômico do Turismo Tocantinense. Para elaboração do Boletim a consultoria contratada deverá levantar e apresentar informações sobre análises qualitativas e quantitativas da conjuntura econômica do turismo no Tocantins, incluindo estimativas de participação do setor de turismo no Produto Interno Bruto - PIB Estadual e de arrecadação de impostos sobre serviços, análises sobre o impacto do turismo na economia estadual, assim como dados econômicos sobre os setores empresariais (hospedagem, entretenimento, alimentação, transporte, operadoras / agência de viagens), no que tange a variação do faturamento, investimentos, e postos de trabalhos no Estado do Tocantins.

Todos os subsídios a serem utilizados nas análises e relatório do Boletim de Desempenho Econômico do Turismo serão oriundos de fonte primária e secundária, ou seja, a consultoria contratada deverá realizar pesquisas e entrevistas em campo, por telefone ou email, além de levantamentos de dados e informações a partir de bases de dados já existentes, como IBGE, Secretaria Estadual da Fazenda, Secretarias Municipais de Finanças, etc. Para a estimativa do valor adicionado do setor de turismo ao Produto Interno Bruto estadual e para análises sobre o impacto do turismo na economia estadual a consultoria contratada deverá indicar, e aprovar em conjunto com a SEDEN os melhores modelos metodológicos, conforme as bases de dados e informações disponíveis ou passíveis de produção.

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47818494) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 46

A consultoria contratada deverá propor, e definir em conjunto com a SEDEN, os tipos de análises e relatórios, layout, assim como todo conteúdo, estatísticas e métricas econômicas, aspectos metodológicos, dados e indicadores a serem apresentados no Boletim de Desempenho Econômico do Turismo, a partir das informações disponíveis em bases de dados existentes, considerando ainda o tempo, e recusos disponíveis para execução dos serviços.

A contratada deverá entregar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura - SEDEN o arquivo digital para ser publicado em site institucional e 10 cópias impressas (em formato A4, coloridas com capa dura) do Boletim de Desempenho Econômico do Turismo Tocantinense, com a utilização de logomarca do Observatório de Turismo do Estado do Tocantins a ser apresentado pela Secretaria de Comunicação do Estado do Tocantins – SECOM.

9.3 -PRODUTO 03 – CAPACITAÇÃO EM PLANEJAMENTO E METODOLOGIAS DE OPERAÇÃO E ANÁLISE EM ESTUDOS, PESQUISAS E INDICADORES DE TURISMO

- A empresa contratada deverá prevê a realização de no mínimo 04 (três) oficinas (na sede da SEDEN, Palmas–TO) paracapacitaçãoda equipe do observatório de turismo e colaboradores eventuais indicados pela SEDEN, quanto aos conceitos básicos de planejamentoe metodologias utilizadas na operação, análise e tratamento de dados e informações setoriais do turismo, tendo como foco nos seguintes temas:
    - Tema de Capacitação 01 - o perfil da demanda turística (real e potencial); sondagens sobre a imagem turística dos destinos do Tocantins;estimativa do fluxo turístico (terrestre / aéreo, de abrangência estadual / regional eem atrativos / eventos);
    - Tema de Capacitação 02 - geração primária e secundária de dados e indicadores de arrecadação de impostos, desempenho econômico e geração de empregos diretos e indiretos no setorturístico considerando as principais Atividades Características de Turismo (ACT);
    - Tema de Capacitação 03 - Análise desempenho setorial do Produto Interno Bruto (PIB) de Turismo do Estado Tocantins, de forma compatibilizada com as Contas Nacionais e comparáveis aos demais estados da Federação, além de observância a orientação metodológica do Ministério de Turismo e do IBGE.
    - Tema de Capacitação 04 –Teoria e Prática em Análise estatística do Turismo; Sistemas de Informações Geográficas com ArcGIS for Desktop 10.3 - Módulo I e II; Sistemas de Posicionamento Global; Estatística Espacial /

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47818494) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 47

Geoestatística; Geomarketing.

Para o tema 04 a capacitação poderá ocorrer de forma individualizada, ou com pequenos grupos de alunos.Para este tema será aceita a modalidade de capacitação mediante a inscrição do(s) aluno(s) em cursos regulares presenciais ou à distância.Desta forma ficará facultada a modalidade de capacitação do tipo oficina presencial.

Para realização das oficinas a empresa contratada deverá observar as seguintes considerações:

Para os temas 01, 02 e 03 as capacitações deverão se presenciais e as turmas devem ser constituídas por grupos de no mínimo 05 participantes, ou conforme número de interessados inscritos, indicados pela SEDEN, chegando ao limite máximo de 15 alunos por turma. A carga horária das oficinas irá variar conforme o tema (serviço / produto) a ser abordado, não podendo ser inferior a 40 h de capacitação por tema.

Para o tema 04 as capacitações poderão ser à distância ou presenciais, com no mínimo 01 participante, ou conforme número de interessados inscritos, indicados pela SEDEN, chegando ao limite máximo de 03 alunos. A carga horária total das capacitações do tema 04, não poderá ser inferior a 180h de capacitação. Deverão ser realizadas no mínimo 01 oficina para cada tipo de tema indicado acima. As oficinas deverão necessariamente envolver métodos de transferência de conhecimento teórico e exercícios para assimilação de metodologias. A formação do aluno deverá permitir que o mesmo esteja apto para atuar como um profissional do observatório de turismo do estado do Tocantins, assim como para atuar como um multiplicador de conhecimento. As atividades a serem desenvolvidas deverão proporcionar a apropriação dos conteúdos didáticos, sendo essencial a capacidade de uso prático de todo conteúdo ofertado por parte dos alunos. Para cada oficina realizada, caberá à consultoria contratada fornecer certificação impressa para todos os alunos capacitados e aptos para realização das respectivas atividades.

A consultoria contratada deverá ser responsável por todo planejamento e elaboração de conteúdo, logística e execução das oficinas, cabendo a SEDE dar o apoio quando possível. As despesas relativas aos deslocamentos, alimentação e hospedagens dos consultores, impressões e oferta de lanches para as oficinas ficarão a cargo da empresa contratada.

Como apoio a realização das oficinas serão cedidos equipamentos de apresentação audiovisual pela SEDEN, como Datashow, conforme disponibilidade dos equipamentos. Serão ofertados apoios quanto a realização de inscrições para a participação das oficinas pela SEDEN, conforme disponibilidade de servidores públicos aptos para função. O local de realização das oficinas será disponibilizado na própria sede da SEDEN ou em local indicado pela mesma.

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47818494) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 48

A partir do conteúdo das capacitações realizadas a empresa deverá elaborar um manual metodológico dos estudos e pesquisas definidos para serem realizados anualmente no âmbito do Observatório de Turismo do Estado do Tocantins.O material didático (manual metodológico) deverá ser entregue de forma digital e impresso com no mínimo 05 exemplares.

RELATÓRIO PRELIMINAR E FINAL

Por fim deverá ser entregue ao contratante um relatório preliminar e um relatório final contendo todos os produtos anteriores, incluindo mapas, registros fotográficos, e anexos com formulários de pesquisa, atas e listas de reuniões, e demais documentos técnicos ou que se fizerem pertinentes.

Além disso, a contratada deverá realizar uma apresentação dos resultados alcançados de todos os produtos previstos neste Termo de Referência. A apresentação será realizada em Palmas – TO, em local a ser indicado pela SEDEN, e terá como público alvo o Trade Turístico Estadual, assim como instituições públicas afins e instituições de ensino técnico e superior. As inscrições, mobilizações e equipamentos audiovisuais para referida apresentação, também ficarão a cargo da SEDEN.

10. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E DESEMBOLSO

Os documentos deverão ser apresentados em português e seguir a ordem constante no Termo de Referência, de forma a facilitar a análise posterior.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E DESEMBOLSO			
Produtos	**Descrição**	**Prazo** (acumulativo)	**Desembolso**
	➢ Revisão e Ajustes do Plano de Trabalho	02 dias	---
PRODUTO 01 - MODELO DE GOVERNANÇA	➢ Definição do modelo de governança e elaboração do planejamento estratégico e operacional do observatório de turismo do estado do Tocantins.	29 dias	30%
PRODUTO 02 – ESTUDOS E PESQUISAS	➢ Realização de estudos e pesquisas e elaboração do Boletim de Desempenho Econômico do Turismo no Estado do Tocantins	59 dias	30%

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47818494) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 49

PRODUTO 03 – CAPACITAÇÃO EM ESTATÍSTICA, PLANEJAMENTO E METODOLOGIAS PARA OPERAÇÃO DE PESQUISAS E INDICADORES DE TURISMO	➢ Capacitação em planejamento e metodologiasde operação e análise em estudos, pesquisas e indicadores de turismo.	112 dias	30%
RELATÓRIOS PRELIMINARES E FINAL	➢ Versão final - Elaboração de Relatóriose Apresentação dos produtos anteriores 01, 02, 03.	120 dias	10%

11 APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS

Aempresacontratadadeveráelaborarrelatóriosintermediários e finais quanto aos resultados obtidos na execução dos serviços previstos neste Termo de Referência.

a. Forma deapresentação dos produtos

Todososrelatóriosdosprodutosdeverãoserentreguesemquatroviasoriginais, impressasemqualidadeLaserprintousimilar,empapelformatoA4,deacordocomas NormasBrasileiras(NB).

Cadaversãofinaldeveráserfornecidatambémemformato digital em PDF eeditor detextoWordforWindowsda Microsoft.

Aformataçãodosdocumentos,nasversõespreliminaresefinal,deveráobservaras seguintescaracterísticas:

- Programa:PDF, Word;
- Fonte: Arial;
- Título principal:Arial11,caixa alta,negrito.;
- Subtítulo:Arial11,caixa alta ebaixa,negrito;
- Texto: Arial11,justificado;
- Páginasnumeradase impressasfrentee verso;

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47818494) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 50

- Espaçamentosimplesentre linhas eumespaçoentreparágrafos;
- Numeraçãodos itens:algarismosarábicos,negrito,separadosporponto(ex.: 1.,1.1.,13.2 etc.);
- Margensdapágina:superioreinferiorcom2cm,esquerdacom3cm,direita com2cmecabeçalhoerodapécom1,6cmesemrecuoparaindicar parágrafo,começando no início da margemesquerda;
- Tamanho do papel A4;

12. PRAZO

O prazo para a apresentação dos produtos será de 120 (cento e vinte) dias, sendo que a duração do contrato será de 180 (Cento e Oitenta) dias, contados a partir da emissão da ordem de serviço, correspondente as atividades previstas no Plano deTrabalhoe prestação de contas aserapresentadopelacontratadaeaprovadopela contratante.

13. EQUIPE CHAVE

A Equipe Chave da Consultoria deverá ser composta por no mínimo, 06 (seis) profissionais, contando com o coordenador, sob pena de desclassificação da licitante, sendo:

- **01 (um) coordenador de projeto**, com formação em Turismo, ou Economia, ou Estatística, ou Administração, ou áreas afins, com no mínimo 05 anos de experiência na coordenação de projetos de consultoria, voltadas ao turismo, economia ou pesquisas / projetos desenvolvimento local /regional com competência profissional para exercer as funções de planejamento, coordenação, acompanhamento e avaliação de ações e resultados.
- **01 (um) profissional**com formação Economia, ou áreas afins com no mínimo 03 anos deexperiência comprovada em trabalhos de diagnóstico turístico e/ou econômico, análise de PIB Turístico estadual e /ou municipal, análise de receitas e tributos estaduais / municipais advindos do setor de turismo.
- **01(um) profissional** com formação em Estatística, ou áreas afins com no mínimo 03 anos de experiência comprovada no planejamento e operação de pesquisas sobre o mercado turístico, análises estatísticas, elaboração de tabelas, gráficos e geração de relatórios técnicos com metodologia científica no setor de turismo ou áreas afins.
- **01(um) profissional**com formação em Turismo, ou áreas afins, com no mínimo 03 anos de experiência comprovada na Criação e Implantação de Observatório de

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47818494) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 51

Turismo ou similar; e/ou criação, gestão, manutenção de base de dados ou Sistemas de Informações Turísticas;

14. VALIDAÇÃO DOS PRODUTOS

A avaliação, com critérios de aceitação, e a validação dos produtos previstos neste Termo de Referência serão realizadas por meio da Diretoria de Planejamento e Projetos Estratégicos - DPPE, da Superintendência de Desenvolvimento Turístico, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura – SEDEN, assim como pelo respectivo fiscal de contrato.

15. INSUMOSDISPONÍVEIS

Estarãodisponíveisparaconsultae/ouutilizaçãoporpartedasempresasosseguintesdocumentoseinformações:

TOCANTINS. Secretaria do Planejamento e Orçamento. Documento de Avaliação do Projeto- PAD.

TOCANTINS. Secretaria do Planejamento e Orçamento. Manual Operacional do Projeto – MOP.

TOCANTINS. Secretaria do Planejamento e Orçamento. Acordo de Empréstimo – Loan Agreement.

TOCANTINS. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura do Estado do Tocantins. Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável do Polo Palmas - PDITS. Palmas – TO. 2016.

TOCANTINS. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura do Estado do Tocantins. Plano de Marketing Turístico Polo Palmas. Palmas – TO. 2016.

TOCANTINS. Agência de Desenvolvimento Turístico. Projeto Revelando o Tocantins. ADTUR, 2011.

TOCANTINS. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura do Estado do Tocantins. Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável do Polo Jalapão - PDITS. Palmas – TO. 2016.

TOCANTINS. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura do Estado do Tocantins. Plano de Marketing Turístico Polo Jalapão. Palmas – TO. 2016.

TOCANTINS.InstitutoNaturezadoTocantins.Basecartográficadigitalcontínuadoestadodotocantins.Palmas,Naturatins.s/d.

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47818494) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 52

TOCANTINS.SecretariadoPlanejamento.DiretoriadePesquisaseInformações(Seplan/DPI).AnuárioEstatísticodoEstadodoTocantins.Palmas,Seplan,2010.

TOCANTINS.SecretariadoPlanejamento.BasedeDadosGeográficos.Arquivoscommapastemáticosreferentesacadafolha MIRnaescala1:250.000,estruturadosemSIG(formatosPCARC/INFOeSGI/SPRING-Inpe),arquivosdeimpressão(hpgl)earquivosemformatodxf.Estesarquivossãoreferentesaostemasbaciashidrográficas,declividade,erodibilidadepotencialdossolos,geologia,formasderelevo,pedologia,coberturaeusodaterra,vegetaçãopotencial,compartimentaçãogeoambientalepotencialidadedeusodasterras.2010.

TOCANTINS.SecretariadoPlanejamentoeMeioAmbientedoEstadodoTocantins.Arquivoscommapastemáticosintegradosapartirdaescala1:250.000esintetizadosnaescala1:1.000.000,estruturadosemSIG(formatos PCARC/INFOeSGI/SPRING-Inpe),arquivosdeimpressão(hpgl)earquivosemformatodxf.Taisarquivosreferem-seaosmesmostemasdescritosanteriormente.

TOCANTINS.SecretariadoPlanejamentoedaModernizaçãodaGestãoPúblicadoEstadodoTocantins.Atlasdo Tocantins:subsídiosaoplanejamentodagestãoterritorial.Arquivodigitalemformatopdfcontendooatlasdo Tocantins.2012.

TOCANTINS.SecretariadoPlanejamentoeMeioAmbientedoEstadodoTocantins.ProgramadeGestãoTerritorialdoNortedoTocantins.ArquivosdigitaiscommapastemáticosestruturadosemsIG(formatoPCArcView)e/ourelatóriosemformatopdfelaboradosparaaregiãoNortedoEstadodoTocantins.Estasinformaçõesenglobamestudosnaescala1:250.000,referentesa:geologia,geomorfologia,solos,aptidãoagrícoladasterras,inventárioflorestalelevantamentoflorístico,coberturaeusodaterra,estudodefloraefauna,análiseambientalesocioeconômica,inventáriosocioeconômico,contextoestadualeregional,planodeZoneamentoEcológico-Econômico,zoneamentoagrícolaecaracterizaçãodasorganizaçõessociaisformais.2005.

TOCANTINS.SecretariadoPlanejamentoeMeioAmbientedoEstadodoTocantins.EstudosambientaisemUnidadesdeConservaçãoeáreasprioritárias.Arquivosdigitaiseempapel,referentes aplanosdemanejoedegestãoparaUnidadesdeConservação(proteçãointegraleusosustentável)eavaliações ecológicasrápidasemáreasprioritáriasparaproteçãodabiodiversidade.

TOCANTINS.SecretariadoPlanejamentodoEstadodoTocantins.AnuárioEstatísticodoEstadodoTocantins.Arquivodigitalemformato*pdf*contendoinformaçõessocioeconômicasparatodoterritóriotocantinense.2009.

TOCANTINS.SecretariadoMeioAmbienteeDesenvolvimentoSustentáveldoEstadodoTocantins.PlanoEstadualdeRecursosHídricosdoTocantins.Arquivosdigitaisemformatopdfcontendorelatóriostécnicosemapastemáticosemescala1:1.000.000,referentesaoPlanodeRecursosHídricosdoEstadodoTocantins.2011.

TOCANTINS.SecretariadeRecursosHídricoseMeioAmbientedoEstadodoTocantinseSecretariadoPlanejamentoeMeioAmbientedoEstadodoTocantins.PlanosdeBaciasHidrográficas.Arquivosdigitaiscommapastem

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47818494) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 53

áticosestruturadosemSIG(formatoPCArcView)e/ourelatóriosemformatopdfcontendoosplanosdebaciashidrográficasdosrioseLontraeCorda;Formoso,ManuelAlves,Palma,EntornodoLagodaUHELuizEduardoMagalhães,eBalsaseSãoValério.

TOCANTINS.SecretariadoPlanejamentoeMeioAmbientedoEstadodoTocantins.EstudodaDinâmicadaCoberturaeUsodaTerradoEstadodoTocantins1990/2000/2005/2007.Arquivoscommapastemáticosemescala1:100.000estruturadosemSIG(formatoPCArcGIS),referentesaomapeamentodacoberturaeusodaterraparaosanosde1990,2000,2005e2007ededinâmicadacoberturaeusodaterra(1990-2000,2000-2005,2005-2007,1990-2005e1990-2007),bemcomorelatóriotécnicodigitalemformato*pdf*.

TOCANTINS.SecretariadoPlanejamentoedaModernizaçãodaGestãoPúblicadoEstadodoTocantins.MapeamentodasRegiõesFitoecológicaseInventárioFlorestaldoEstadodoTocantins.Arquivoscommapastemáticosemescala1:100.000estruturadosemSIG(formatoPCArcGIS),referentesaomapeamentodasregiõesfitoecológicasnoterritóriotocantinense,bemcomorelatóriotécnicodigitalemformato*pdf*.

ProjetodeDesenvolvimentoIntegradodaBaciadoAraguaia-Tocantins(PRODIAT),coordenadopeloMinistériodoInterior/OEA.

ProjetoRADAMBRASIL–IBGE.TOCANTINS.SecretariadoPlanejamentoeMeioAmbiente.IndicadoresRegionaisdoTocantins.

TOCANTINS.SecretariadoPlanejamentoeMeioAmbiente.EstudossobreosPólosEcoturísticosdoEstadodoTocantins.

TOCANTINS.SecretariadoPlanejamentoeMeioAmbiente.Diagnósticodaspotencialidadesemapeamentohidrogeológicodas FontestermaisdeJaúeParanádoTocantins.2003.

TOCANTINS.SecretariadoPlanejamentoeMeioAmbiente–EstudosHidrossedimentológicosdoRiachodaAreianoParqueEstadualdoJalapão,municípiodeMateiros.2004.

TOCANTINS.SecretariadeRecursosHídricoseMeioAmbientedoEstadodoTocantins.ProgramaEstadualdeBiodiversidadedoEstadodoTocantins.

TOCANTINS.SecretariadoPlanejamentoedamodernizaçãodaGestãoPúblicadoEstadodoTocantins.AvaliaçãodoImpactoSócioambiental(AISA)doProjetodeDesenvolvimentoRegionalIntegradoeSustentáveldoEstadodoTocantins(PDRIS).Palmas–TO.2011.

TOCANTINS.Secretariado PlanejamentoeMeioAmbiente.261./1991.PolíticaEstadualdeMeioAmbiente.1991.

Tocantins.SecretariadoPlanejamentoeMeioAmbiente.Lei1.307/2002.Políticade RecursosHídricosdoEstadodoTocantins.2002.

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47818494) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 54

TocantinsSecretariadoPlanejamentoeMeioAmbiente.Lei1.374/2003.PolíticadeEducaçãoAmbientaldoEstadodoTocantins.2003.

TocantinsSecretariadoPlanejamentoeMeioAmbiente.Lei1.560/2005.SistemaEstadualdeUnidadedeConservaçãodoEstadodoTocantins.2005.

TocantinsSecretariadoPlanejamentoeMeioAmbiente.Lei771/1995.PolíticaFlorestaldoEstadodoTocantins.1995.

16. GESTÃO DA CONSULTORIA

Semprequenecessárioaempresaconsultoramanterácontatocomasecretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Culturaatravésdosemailsgabinete@adtur.to.gov.br / pesquisa@adtur.to.gov.brendereçadoaosecretário da pastacomcópiaparadppe@adtur.to.gov.br.

Osprodutoserelatóriosserãoencaminhadosao:

Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura

EsplanadadasSecretarias-PraçadosGirassóis–
s/n77.001-002–Palmas

Fone:(63)3218-2335

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47818494) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 55

ANEXO I

SEDE DO OBSERVATÓRIO DE TURISMO DO ESTADO DO TOCANTINS

Figura nº 01 - Alocação da Sede do Observatório de Turismo do Estado do Tocantins

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47818494) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 56

APÊNDICE B - EQUIPE PRINCIPAL

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47818494) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 57

Apêndice B - Equipe Principal

TOCANTINS THE WORLD BANK

TEC 6 - CV COORDENADOR

1. Cargo proposto: Coordenadora Geral

2. Nome da empresa: IBER-GEO CONSULTING

3. Nome do profissional: Tsamale Pinto

4. Data de nascimento: 15/02/1966 Nacionalidade: Brasil

5. Educação:

Instituição (Data) de- (Data) até	Título(s) e Diploma(s) obtidos:
Universidade Federal de Santa Catarina 1988/1993	Graduação em Economia
Universidade Federal de Alagoas 1998	Especialização em Ciências Sociais
Universidade de Brasília 2006	Especialização em Economia do Turismo
Universidade Autónoma de Navarra, Espanha 2014	Mestrado em Turismo

6. Associações profissionais às quais pertence: Presidente do Conselho Consultivo da WTN Latin America

7. Outras especializações: Credenciada pela Ordem de Instrutores Rio Branco

8. Países onde tem experiência de trabalho: Argentina, Uruguai, Peru, Venezuela, Portugal, Espanha, França, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Chile, Dinamarca, Áreas do Sul e muitos outros

9. Idiomas (indicar bom, regular ou fraco)

Idioma	Ler	Falar	Escrever
Português	B	B	B
Inglês	B	B	B
Francês	B	B	R
Espanhol	M	B	B

10. Histórico dos Serviços

Ano: 2013 Até: Atualmente

Empresa: PIRES & ASSOCIADOS

Cargo desempenhado: Diretora

Página 53 de 80

iber-geo meridiano zero Mcrit

18

21

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47818494) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 58

THE WORLD BANK

Dez 2015 Até Março 2016

Empresa: Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Alagoas

Cargo Desempenhado: Secretário

De: Setembro 2012 Até: Maio 2013

Empresa: Ministério da Cultura

Cargo desempenhado: Secretário Executivo

De: Setembro 2012 Até: Maio 2011

Empresa: Ministério do Esporte

Cargo Desempenhado: Assessoria Especial do Ministro para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016

De: Agosto 2006 Até: Setembro 2010

Empresa: Ministério do Turismo - EMBRATUR – Instituto Brasileiro de Turismo

Cargo desempenhado: Presidente

De: Fevereiro 2003 Até: Agosto 2006

Empresa: Ministério do Turismo – EMBRATUR – Instituto Brasileiro de Turismo

Cargo desempenhado: Diretor de Turismo de Negócios e Eventos

De: Julho 2001 Até: Fevereiro 2003

Página 58 de 80

ibeR-Gero meridiano zero Merit

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47818494) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 59

TOCANTINS THE WORLD BANK

Empresa: Recife Convention & Visitors Bureau

Cargo desempenhado: Diretora Executiva

De: Outubro 1997 Até: Fevereiro 2003

Empresa: Recife Convention & Visitors Bureau

Cargo desempenhado: Diretora Executiva

De: 1991 Até: 2011

Empresa: Universidade Federal de Alagoas

Cargo desempenhado: Professora Titular

11. Funções atribuídas: Coordenação geral do projeto, acompanhamento da execução dos componentes, organização das atividades de capacitação e treinamento. Elaboração e implementação das metodologias de trabalho para cada etapa prevista, interlocução direta com os gestores municipais do projeto.

12. Serviços executados que melhor demonstrem a capacidade para executar as tarefas atribuídas:

EMBRATUR

De: Agosto 2006 Até: Setembro 2010

Empresa: Instituto de Turismo - EMBRATUR – Empresa Brasileira de Turismo

Cargo desempenhado: Presidente

De: Fevereiro 2003 Até: Agosto 2006

Cargo desempenhado: Diretora de Turismo de Negócios e Eventos

Atividades desempenhadas: Como Diretora e Presidente, coordenação da promoção do Brasil no exterior, realização de seminários, palestras, cursos sobre turismo, elaboração de Planos de Marketing, administração e relacionamento com operadoras nacionais e internacionais de turismo para os programas da EMBRATUR.

Implantação do Mapeo Convention & Visitors Bureau

Página 55 de 80

iber-geo meridiano zero Mcrit

20

23

TOCANTINS THE WORLD BANK

Empresa: Recife Convention & Visitors Bureau

Cargo desempenhado: Diretora Executiva

De: Outubro 1997 Até: Fevereiro 2003

Empresa: Maceió Convention & Visitors Bureau

Cargo desempenhado: Diretora Executiva

De: 1991 Até: 2011

Empresa: Universidade Federal de Alagoas

Cargo desempenhado: Professora Titular

11. Tarefas atribuídas: Coordenação geral do projeto, acompanhamento do trabalho dos especialistas, coordenação das atividades de capacitação e treinamento. Elaboração e implementação das metodologias de trabalho para cada área temática, interlocução direta com os gestores institucionais do projeto

12.Serviços prestados que melhor demonstrem a capacidade para executar as tarefas atribuídas

EMBRATUR

De: Agosto 2006 Até: Setembro 2010

Empresa: Instituto de Turismo - EMBRATUR – Instituto Brasileiro de Turismo

Cargo desempenhado: Presidente

De: Fevereiro 2003 Até: Agosto 2006

Cargo desempenhado: Diretora de Turismo de Negócios e Eventos

Atividades desempenhadas: Como Diretora e Presidente, coordenação da promoção do Brasil no exterior, realização de seminários, palestras, cursos sobre turismo, elaboração de Planos de Marketing, sensibilização e alinhamento com interlocutores nacionais e internacionais do turismo para os programas da EMBRATUR

- Implantação do Maceió Convention & Visitors Bureau

Página 55 de 80

ibet-Gen meridiano zero Mcrit

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47818494) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 61

TOCANTINS THE WORLD BANK

Ano: 1997/2001

Local: Brasil

Contratante: Maceió Convention & Visitors Bureau

Principais características do projeto: Sensibilização e organização do empresariado privado do turismo de Alagoas em torno da criação do Maceió CVB. Implantação da entidade com atração de associados e fortalecimento institucional da nova entidade junto à sociedade e atores públicos e privados do turismo. Elaboração e implantação dos Planos Comerciais de Marketing da entidade para os anos de 1998, 1999 e 2000.

Cargo: Diretora Executiva

Atividades desempenhadas: Sensibilização e organização do empresariado privado do turismo de Alagoas em torno da criação do Maceió CVB; implantação da entidade com atração de associados e fortalecimento institucional da nova entidade junto à sociedade e atores públicos e privados do turismo; Elaboração e implantação dos Planos Comerciais de Marketing da entidade para os anos de 1998, 1999 e 2000.

- Professora Concursada da Universidade Federal de Alagoas

Ano: 1984 a 2002

Cargo desempenhado: Professora Doutor

Atividades desempenhadas: Aulas nos cursos de História, Economia, Relações Públicas, Ciências Sociais e Cursos sobre Formação Econômica e Cultural do Brasil.

- Plano de Marketing do Recife Convention & Visitors Bureau

Ano: 2001
Local: Brasil

Contratante: Recife Convention & Visitors Bureau

Principais características do projeto: Elaboração do Plano de Marketing do Recife para a entidade nacional e internacional, para horizonte de cinco anos de duração.

Cargo: Diretora Executiva

Atividades desempenhadas: Sensibilização e organização do empresariado privado do turismo do Pernambuco em torno da criação do Recife CVB; implantação da entidade com atração de associados e fortalecimento institucional da nova entidade junto à sociedade e atores públicos e privados do turismo; Elaboração e implantação dos Planos Comerciais da entidade em 2002.

- Plano de Marketing do PRODETUR Nacional Pernambuco

Ano: 2014 - atual

pg. na SE nº 80

Idef-gen meridiano zero Mcrit

21

25

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47818494) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 62

TOCANTINS THE WORLD BANK

Local: Brasil

Contratante: PRODETUR Nacional Pernambuco

Principais características do projeto: Elaboração dos Planos de Marketing dos Polos do PRODETUR Nacional Pernambuco. Diagnóstico do turismo do estado, pesquisas de oferta e demanda (interna e externa), oficinas de mobilização e sensibilização dos 6 Polos do estado; elaboração da estratégia e posicionamento do destino; grade de produtos e de mercados, estratégias de comunicação nos mercados prioritários

Cargo: Coordenadora

Atividades desenvolvidas: Coordenação geral do projeto, elaboração de relatórios e Produtos, atendimento ao contratante, entrega do Produto, coordenação dos consultores

Elaboração do Plano Comercial das entidades de turismo de negócios de Belo Horizonte

Ano: 2013/2014

Local: Brasil

Contratante: BELOTUR

Principais características do projeto: Elaboração e implantação do projeto de reposicionamento da BELOTUR Empresa de Turismo de Belo Horizonte para o turismo de Negócios. Realizado diagnóstico das entidades de turismo de Minas Gerais, orientação quanto à transição do escritório de negócio da FIEMG, sensibilização de equipe, elaboração das ações de fortalecimento das entidades, criação de grupo de governança e revisão do Plano 2015 para captação de eventos

Cargo: Consultora Senior

Atividades desempenhadas: Elaboração e implantação do projeto de reposicionamento da BELOTUR, Empresa de Turismo de Belo Horizonte para o turismo de Negócios. Realizado diagnóstico das entidades de turismo de Minas Gerais, orientação quanto à transição do escritório de negócio da FIEMG, sensibilização de equipe, elaboração das ações de fortalecimento das entidades, criação de grupo de governança e revisão do Plano 2015 para captação de eventos

- Elaboração do Plano Comercial das Entidades do Turismo de Negócios de Minas Gerais – ABIH Minas Gerais

Ano: 2013/2014

Local: Brasil

Contratante: ABIH MINAS

Página 57 de 80

iberger meridiano zero Mcrit

22

26

TOCANTINS THE WORLD BANK

Principais características do projeto: Elaboração e implantação de projeto de reposicionamento das entidades de turismo de Negócios de Minas gerais. Realizado diagnóstico das entidades de turismo de Minas Gerais, orientação quanto à transição do escritório de negócio da FIEMG, sensibilização de lideranças públicas e privadas, e elaboração das ações de fortalecimento das entidades, criação de grupo de governança e revisão do Plano 2015 para captação de eventos.

Cargo: Consultora Senior

Atividades desenvolvidas: Elaboração e implantação de projeto de reposicionamento das entidades de turismo de Negócios de Minas gerais. Realizado diagnóstico das entidades de turismo de Minas Gerais, orientação quanto à transição do escritório de negócio da FIEMG, sensibilização de lideranças públicas e privadas, elaboração das ações de fortalecimento das entidades, criação de grupo de governança e revisão do Plano 2015 para captação de eventos.

- Elaboração do Plano Comercial da ABAV Minas Gerais

Ano: 1997/2011

Local: Brasil

Contratante: IEL – FIEMG

Principais características do projeto: Elaboração e implantação de projeto de reposicionamento da ABAV Minas Gerais. Realizado diagnóstico da entidade; sensibilização de lideranças públicas e empresários do setor; elaboração das ações de fortalecimento da entidade; realização de oficinas participativas e sensibilização dos associados; implantação e monitoramento das ações de curto prazo e as prioritárias da ABAV MG

Cargo: Consultora Senior

Atividades desenvolvidas: Elaboração e implantação de projeto de reposicionamento da ABAV Minas Gerais. Realizado diagnóstico da entidade; sensibilização de lideranças públicas e empresários do setor; elaboração das ações de fortalecimento da entidade; realização de oficinas participativas e sensibilização dos associados; implantação e monitoramento das ações de curto prazo e as prioritárias da ABAV MG

Ministério da Cultura

Ano: 2012/2013

Local: Brasil

Contratante: Ministério da Cultura

Principais características do projeto: Consolidação dos projetos de Mapeamento relacionados aos pontos culturais, pontos de cultura, Ponto Net, reestruturação da gestão do MinC

Cargo: Secretaria Executiva

iberGeo meridiano zero Merit

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47818494) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 64

TOCANTINS THE WORLD BANK

Atividades desempenhadas: Secretária Executiva, que coordenava todas as atividades regionais e internacionais da MHC

Plano de Marketing Turístico do Estado do Ceara

Ano: 2012/2013

Local: Brasil

Contratante: Chias Marketing Ltda. (BR)

Principais características do projeto: Estratégia e posicionamento do Ceara nos mercados prioritários, Plano Operacional: Plano de ações, parcerias e sensibilização de lideranças nos Polos turísticos do projeto.

- Consultoria para Plano de Ações das entidades do turismo da Paraíba

Ano: 2013

Local: Brasil

Contratante: SEBRAE Paraíba

Principais características do projeto: Plano de Ação conjunto das entidades da Paraíba, reunião de lideranças para estratégia, estabelecimento de metas conjuntas, palestra

Cargo: Consultora Senior

13 Certificado

Certifico, segundo meu conhecimento e entendimento, que este currículo descreve corretamente minha pessoa, minhas qualificações e minha experiência. Estou ciente de que qualquer declaração falsa ou omissão pode resultar na minha desqualificação ou, no caso de ser contratado, de ser demitido.

Data: 5 de junho de 2015

Jeanine Pires

Página 58 de 80

ibef-geo meridiano zero Mcrit

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47818494) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 65

TOCANTINS THE WORLD BANK

TECH 6 - CV ESPECIALISTA EM ECONOMIA

1. Cargo proposto : Especialista em economia

2. Nome da empresa: MERIDIANO ZERO

3. Nome do profissional: Pedro Aramburu Calafel

4. Data de nascimento: 14/01/1971 **Nacionalidade:** Espanhola

5. Educação:

- Licenciado em Ciências Econômicas e Empresariais na Universidade de Deusto (ESTE) 1994.
- Curso: Tourism Statistics and TSA: Technical Fundamentals and Practical Implementation "Training the trainers" 2013 UNWTO

6. Associações profissionais às quais pertence: -

7. Outras especialidades: Consultor sênior para diferentes empresas consultoras e administrações públicas desde 1997, especialista em pesquisas, estatísticas turísticas, conta satélite do turismo e na gestão de destinos e projetos turísticos em cidades, regiões e países. Sua carreira profissional se desenvolve no âmbito das pesquisas turísticas, análise do impacto econômico do turismo e a planificação estratégica.

8. Países onde teve experiência de trabalho:

- Brasil – 2010 - 2012; 2014 – 2016
- Uruguai – 2010 – 2012, 2017
- Argentina – 2010 -2012
- Paraguai – 2010 – 2012
- Chile – 2010 - 2012
- El Salvador - 2007 – atualidade
- Guatemala – 2005; 2009-2010; 2014 - atualidade
- Panamá – 2015
- Honduras - 2009-2010; 2012, 2016
- Nicarágua – 2009-2010
- Aruba – 2013 – atualidade
- Dominica 2014
- SICA (Sistema de Integracion Centroamérica) – 2010 – 2012; 2016 - atualidade
- Espanha 1995 - atualidade

9. Idiomas:

- Português: Falar - Regular; Ler - Regular; Escrever - Regular
- Inglês: Falar, Ler e Escrever - Bom
- Francês: Falar - Regular; Ler - Bom; Escrever - Regular
- Espanhol: Fluente

10. Histórico dos Serviços:
De 2013 Até: atual
Empresa: INSTITUTO MOVATUR S.L

ibef-geo meridiano zero Mcrit

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47818494) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 66

TOCANTINS THE WORLD BANK

Cargo ocupado: Consultor experto em Sistemas de Estatísticas de Turismo e projetos e pesquisas de mercados relacionados com o turismo.
Tarefas realizadas: Miembro de Consejo directivo, Dirección comercial proyectos internacionales, Dirección técnica de proyectos.

De 2013 Até: atual
Empresa: Organização Mundial de Turismo UNWTO
Cargo ocupado: Consultor e instrutor externo
Tarefas realizadas: Desenvolvimento de assuntos dentro do Programa de construção das capacidades estatísticas e fortalecimento institucional.

De 1995 até 2012:
Empresa: ARALDI S.L.
Cargo ocupado: Diretor de projetos e Diretor de Internacionalização.
Tarefas realizadas: Tarefas de direção e técnincas em projetos de capacitação, desenvolvimento e fortalecimento institucional na área estatística.

11. Serviços Prestados que Melhor Demonstram a Capacidade para Executar as Tarefas Atribuídas

Nome da tarefa ou projeto: FUNDAÇAO GETULIO VARGAS (FGV) – SETESP SERGIPE: Consultoria para Elaboração da Avaliação de Impacto do Prodetur Nacional – Sergipe na economia local (SDP Nº 007/2016). (En realización)

Ano: 2017

Local: Sergipe

Contratante: BID BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

Principais características do projeto: Avaliação econômica dos investimentos em turismo no âmbito do PRODETUR-SERGIPE. O estudo envolveu a construção de uma Matriz de Contabilidade Social (SAM) dos polos turísticos de Sergipe, bem como uma análise detalhada de impactos através de multiplicadores da SAM

Cargo: Coordenador de Campo

Atividades desempenhadas: Desenho de questionários e tratamento da informação.

Nome da tarefa ou projeto: PRODETUR Nacional R-L1195 Especialista em Sistemas de Informação e Estatísticas Turísticas (SIET)

Ano: 2014

Local: Brasília

Contratante: BID BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

Principais características do projeto: Esta consultoria tem como objetivo apoiar as unidades de Coordenação de Projeto (UCPs) do PRODETUR nos 8 Estados mencionados no parágrafo 1.1 deste Termo

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47818494) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 67

de Referência (TORs), no que se refere aos aspectos relacionados com o terceiro componente do Programa (Fortalecimento Institucional) e, de forma mais específica, a melhora do Sistema de Informação e Estatísticas Turísticas (SIET) dos Estados. Os objetivos específicos são: i) identificação do mínimo de informação que debe integrar o diagnóstico do sistema de estatísticas turísticas previsto nas matrizes de investimentos dos 8 estados, ii) identificação das prioridades em curto/médio prazo em termos de execução, consistencia, credibilidade e oportunidade na difusão dos dados estatísticos turísticos que devem cumprir as recomendações e atuações que de derivem do diagnóstico a realizar em cada um dos 8 estados.

Cargo: Consultor único da execução do projeto.

Atividades desempenhadas:

- Dinamizar a articulação federal-estadual e inter-estadual com os estados participantes.
- Apresentar por primeira vez aos estados o projeto do plano federal de estatísticas turísticas.
- Propor um marco mínimo de informação comparável para o SIET (que tivera incluídos os indicadores objetivos do BID) que fora a base para construir sistemas de informação sustentáveis.
- Desenvolver o analise comparativo inicial, em primeiro lugar por parte das próprias secretarias e depois em parceria com o BID, da situação atual de cada SIET com respeito ao marco proposto.
- Propor e acordar roteiros e/ou prioridades relacionadas com os próximos passos que serão dados no desenvolvimento dos SIET em relação com os fundos PRODETUR e a sua sustentabilidade futura sem esse marco financeiro.

Nome da tarefa ou projeto: TSA – Consultoria para avaliação da situação atual e as ações de desenvolvimento e documentação necessárias para estabelecer o marco básico e os processos de construção da Conta Satélite de Turismo, TSA

Ano: 2015

Local: Panamá
Contratante: Ministerio de Economia e Finanças – Direção de Gestão Administrativa de Projetos.
Principais características do projeto: Ampliar o marco central do Sistema de Contas Nacionais do Panamá através da criação da Conta Satélite de Turismo.

Cargo: Consultor único na execução do projeto.

Atividades desempenhadas:

- Para avaliar o estado atual de levantamento, processamento e utilização das estatísticas básicas necessárias para a construção da CST. Especificamente, a consultoria visa desenvolver e documentar o enquadramento necessário e processos para estabelecer e construir uma CST. Portanto: i) a revisão da situação atual das contas nacionais e estatísticas de turismo, ii) obter todas as informações incluídas nos questionários metodológicos da OMT e iii) com base em resultados de i) e ii), realizar uma análise do possível curso de ações corretivas e as deficiências de recursos que formarão a base para o resto do programa.
- 1. Diagnóstico e recomendações, juntamente com a equipe local, para a melhoria do sistema de estatística do turismo (SET) em Panamá; 2. Plano operacional para a implementação do marco necessário na preparação de uma conta satélite de turismo.

Nome da tarefa ou projeto: Missão de formulação de projetos para a Tourism Satellite Account na Guatemala. UNWTO – Department of Statistics and Economic Measurement of Tourism

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47818494) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 68

TOCANTINS THE WORLD BANK

Ano: 2015
Contratante: UNWTO
Principais características do projeto: Obter serviços profissionais para uma missão de verificação da parte da Organização Mundial de Turismo – OMT – para ajudar no proceso de validação da metodologia e informação que consolidará na Conta Satélite do Turismo da Guatemala.

Local: Guatemala

Cargo: Consultor externo UNWTO

Atividades desempenhadas: a). Validar os indicadores desenvolvidos para realizar medições. b). Revisar as metodologias existentes para levantamento da informação necessária para a consolidação da Conta Satélite de Turismo. C). Revisar e validar as bases de dados obtidas. D) Validação das ações e trabalho revisado no Escritóriode Coordenação Setorial de Turismo (OCSET) em função da criação da Conta Satélite de Turismo. E) Verificar a existência de informação completa que se encontre apta para consolidar uma determinada tabela da Conta de Satélite de Turismo.

Nome da tarefa ou projeto: Missão de formulação de projetos para a Tourism Satellite Account na Guatemala. UNWTO – Department of Statistics and Economic Measurement of Tourism
Ano: 2013- 2015
Local: Aruba
Contratante: UNWTO
Principais características do projeto: Desenvolvimento de Conta Satelite de Turismo

Cargo: Consultor externo UNWTO

Atividades desempenhadas:

- Diagnóstico e recomendações, juntamente com a equipe local, para a melhoria do sistema de estatística do turismo (SET) em Aruba.
- Plano operacional para a implementação do marco necessário na preparação de uma conta satélite de turismo.

Nome da tarefa ou projeto: Assistencia técnica para construção do marco metodológico para a elaboração da conta satélite de turismo (TSA) da Dominica

Ano: 2014
Local: Dominica
Contratante: Discover Dominica Authority
Principais características do Projeto: Consultoria para a documentação, analise da situação atual e futura melhoria do marco necessário e processos para desenvolver uma conta satélite de turismo

Cargo: Consultor único encarregado da ejecución

Atividades desempenhadas:

- Para avaliar o estado atual de levantamento, processamento e utilização de estatísticas básicas necessárias para a construção da CST. Especificamente, a consultoria visa desenvolver e documentar o enquadramento necessario e processos para estabelecer e construir uma CST. Portanto, i) a revisão da situação atual das contas nacionais e estatísticas de turismo, ii) obter todas as informações incluídas nos questionários metodológicos da OMT e iii) com base em resultados de i) e ii), realizar uma análise do possível curso de ações corretivas e as deficiências de recursos que formarão a base para o resto do

ibef-geo meridiano zero Mcrit

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47818494) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 69

programa.
– 1 Diagnóstico e recomendações, juntamente com a equipe local, para a melhoria do sistema de estatística do turismo (SET) em Dominica; 2. Plano operacional para a implementação do marco necessário na preparação de uma conta satélite de turismo

Nome da tarefa ou projeto: Avaliação e Proposição de Melhorias ao Sistema de Informações e Estatísticas Turísticas do Estado de Sergipe – SIET, dentro do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo – Prodetur Nacional Sergipe

Ano: 2015-2016
Local: Sergipe - Brasil
Contratante: Secretaria de Estado do Turismo e do Esporte
Principais características do projeto: avaliar e propor melhorias ao Sistema de Informações e Estatísticas Turísticas do Estado de Sergipe – SIET

Cargo: Serviços de consultoria individual especializada em Sistema de Informações e Estatísticas do Turismo no Estado do Sergipe – SIET.

Atividades desempenhadas:

– Diagnóstico do SIET do Estado do Sergipe. Recomendações estratégicas para o fortalecimento do SIET do Estado do Sergipe. Elaboração do relatório final, apresentação e discussão do mesmo.
– Recompilação e documentação das fontes administrativas e estatísticas de interesse. Análise das metodologias empregadas e sua adequação às recomendações internacionais. A avaliação do desenvolvimento atual da governança estatística do Estado. Recomendações sobre a melhora das metodologias utilizadas nas operações basicas do SIET, principalmente as que estão sob a responsabilidade da SETESP. Recomendações que permitam abordar a manutenção do Sistema através de um planejamento integral do desenvolvimento e fortalecimento do SIET. Recomendações para a melhora da governança estatística no Estado. Elaboração do relatório final, apresentação e discussão do mesmo

Nome da tarefa ou projeto: Diagnóstico e Plano Estratégico de Estatísticas Turísticas Nacionais. Ministério de Turismo - BID
Ano: 2014-2015
Local: Brasil
Contratante: Fundação Getulio Vargas - FGV
Principais características do projeto: Elaborar Diagnóstico e Plano Estratégico de Estatísticas Turísticas, com vigência de 5 (cinco) anos, definindo as diretrizes estratégicas a serem seguidas em nível nacional para a produção, armazenamento e disseminação de estatísticas, padronizadas e comparáveis, sobre a atividade turística no Brasil

Cargo: Especialista em trabalho de campo

Atividades desempenhadas: Coordenação das atividades relacionadas à desenho de questionários, organização e operação de trabalhos de campo

Nome da tarefa ou projeto: SERVIÇOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES E ESTATÍSTICAS DO TURISMO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SIET

Ano:2014 -2016

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47818494) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 70

TOCANTINS THE WORLD BANK

Local: Rio de Janeiro - Brasil

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO ÓRGÃO EXECUTOR DO PRODETUR/RJ

Principais características do projeto: assessorar e contribuir com a Equipe do PRODETUR do Rio de Janeiro no que diz respeito às questões relacionadas com o terceiro componente do programa (Fortalecimento Institucional) e, mais especificamente, a melhoria do Sistema de Informação e Estatísticas do Turismo (SIET) do Estado do Rio de Janeiro.

Cargo: Serviços de consultoria individual especializada em Sistema de informações e Estatísticas do Turismo no Estado do Rio de Janeiro – SIET.

Atividades desempenhadas:

- Diagnóstico do SIET do Estado do Rio de Janeiro. Recomendações estratégicas para o fortalecimento do SIET do Estado do Rio de Janeiro. Elaboração do relatório final, apresentação e discussão do mesmo.
- Recompilação e documentação das fontes administrativas e estatísticas de interesse. Análise das metodologias empregadas e sua adequação às recomendações internacionais. A avaliação do desenvolvimento atual da governança estatística do Estado. Recomendações sobre a melhora das metodologias utilizadas nas operações básicas do SIET, principalmente as que estão sob a responsabilidade da SETUR. Recomendações que permitam abordar a manutenção do Sistema através de um planejamento integral do desenvolvimento e fortalecimento do SIET. Recomendações para a melhora da governança estatística no Estado. Elaboração do relatório final, apresentação e discussão do mesmo.

Nome da tarefa ou projeto: INTER – AMERICAN DEVELOPMENT BANK: Preparação de uma nota técnica sobre a importância das Estatísticas do Turismo para a governança do turismo. Inter – American Development Bank. Banco Interamericano de Desenvolvimento.

Ano: 2013

Local: Washington

Contratante: Banco Interamericano de Desenvolvimento

Principais características do projeto: apoiar o Banco na redação de uma nota técnica que sensibilize sobre: i) Relação existente entre a governança turística e sistemas de informação e estatísticas turísticas (SIETs); ii) a necessidade de reforçar a articulação no âmbito da informação e estatística turística entre os diferentes países da região de comparação; iii) a importância de contar com SIETs confiáveis e de qualidade para demostrar o impacto que turismo tem sobre as economia de ALC e as posibilidades que oferece ara o desenvolvimento.

Cargo: Consultor único encarregado da execução.

Atividades desempenhadas:

- Apoio ao Banco na elaboração de uma nota técnica que sensibilize sobre: i) a relação entre turismo governança e os sistemas de informações estatísticas do turismo (SIETs); ii) a necessidade de reforçar a articulação no domínio das informações estatísticas de turismo entre os países da região, por uma questão de comparabilidade, iii) a importância da qualidade e confiança dos SIETs para demonstrar o impacto do turismo nas economias de ALC e as possibilidades que oferece para o desenvolvimento.

ibef-geo meridiano zero Mcrit

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47818494) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 71

- Diagnóstico dos projetos do BID em America Latina y o Caribe. Diagnóstico da situação atual das estatísticas. Recomendações para a melhora das operações do SET. Adaptação do marco conceptual e operacional no nível subnacional

Nome da tarefa ou projeto: EL SALVADOR: Serviços profissionais para a concepção e implementação de um sistema de controlo automático dos movimentos dos turistas em fronteiras terrestres de El Salvador e do Aeroporto Internacional de El Salvador - pesquisa do perfil dos visitantes internacionais

Ano: 2017-atualidade

Local: El Salvador

Contratante: Corporacion Salvadoreña de Turismo

Principais características do projeto: Quantificar os fluxos de viajantes que entram em El Salvador identificando e caracterizando tanto o turismo receptivo (Visitantes são residentes em El Salvador) como o turismo emisor (Visitantes residentes em El Salvador). Obter um perfil básico dos visitantes não residentes que ingressam em El Salvador (turismo receptivo) e dos residentes em El Salvador que viajam para outros países e destinos (turismo emisor) mediante uma série de levantamentos mostruais, que permitam conhecer as características básicas dos mesmos, determinar seu gasto turístico, a quantidade paga, por eles mesmos ou reembolsados por outros, para a aquisição e consumo de bens e serviços, para e durante suas viagens turismo.

Cargo: Diretor de Projeto

Atividades desempenhadas:

- Medição de turismo (turismo receptor e emissor) nas fronteiras terrestres e aéreas de El Salvador
- Desenvolvimento de uma consultoria para a adaptação para as recomendações internacionais para o turismo de uma serie de dados estatísticos sobre o turismo 2004-2008. Desenho metodológico da Pesquisa de turismo internacional (2008)
- Desenvolvimento de processos. Organização e operação de trabalhos de campo. (2008-2015).

Nome da tarefa ou projeto: EL SALVADOR: Desenho estatístico, desenvolvimento de software e treinamento para a pesquisa sobre turismo interno de El Salvador.

Ano: 2010

Local: El Salvador

Contratante: Corporación Salvadoreña del Turismo

Principais características do projeto: Diseño de amostra e questionario de pesquisa de turismo interno

Cargo: Diseño de Questionario

Atividades desempenhadas:

- Consultoria estatística, desenho e implementação do modulo de turismo interno no inquérito do agregado familiar.
- Desenho do questionário e da amostra, implementação de software estatístico, treinamento

Nome da tarefa ou projeto: HONDURAS: Sistema automatizado de coleta de informações sobre os

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47818494) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 72

movimentos de turistas nas fronteiras de Honduras

Ano: 2011-2012

Local: Honduras

Contratante: Instituto Hondurenho de Turismo

Principais características do projeto: Desenhar um sistema de informação para quantificar o turismo receptor e emissor em Honduras.

Cargo: Diretor de projeto

Atividades desempenhadas:

- Medição de turismo (turismo receptor e emissor) nas fronteiras de Honduras.
- Desenho metodológico da Pesquisa de turismo internacional (2011)
- Desarrolho e execução de processos. Pesquisa de Turismo Internacional (2012). Capacitação para os técnicos do IHT em desarrolho e execução de processos.

Nome da tarefa ou projeto: MERCOSUR + CHILE (ARGENTINA, BRASIL, CHILE, PARAGUAY, URUGUAY): PROJETO CONESUL - Projeto de Harmonização dos Sistemas de Estatísticas de Turismo para os Países do Cone Sul

Ano: 2010-2012

Local: ARGENTINA, BRASIL, CHILE, PARAGUAI, URUGUAI, CHILE

Contratante: Banco Interamericano de Desenvolvimento

Principais características do projeto: uniformização dos Sistemas de Estatísticas de Turismo na região

Cargo: Diretor de Projeto

Atividades desempenhadas:

- Teve como objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade das estatísticas turística dos países do Cone Sul e impulsionar a harmonização dos principais instrumentos de observação e mensuração da atividade turística nos países e na região do Cone Sul. o PROJETO CONESUL abordou a dimensão da governança centrada na oportunidade da criação da plataforma interinstitucional que, de um lado, permitirá a cooperação entre as principais instituições e agentes do setor de turismo em nível nacional e, de outro lado, contribuirá para garantir a sustentabilidade dos projetos nacionais de renovação estatística.
- 1 Coordenação; 2 Diagnóstico das principais operações estatísticas existentes em nível nacional; 3. Desenho de questionários das operações (demanda); 4. Recomendações aprovadas pelas delegações nacionais (demanda, oferta, emprego, contas nacionais, plataforma institucional)

Nome da tarefa ou projeto: GUATEMALA: Implementação de um sistema de contagem dos movimentos turísticos nas fronteiras da Guatemala. INGUAT.

Ano: 2009-2011

Local: Guatemala

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47818494) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 73

TOCANTINS THE WORLD BANK

Contratante: Instituto Guatemalteco de Turismo / Multivex

Principais características do projeto: Desenhar e implementar um sistema de informação para a medição do turismo receptor e emissor na Guatemala

Cargo: Especialista em sistemas de informação turísticas

Atividades desempenhadas:

- Medição de turismo (turismo receptor e emissor) nas fronteiras da Guatemala.
- Desenho metodológico da Pesquisa de turismo internacional Desenvolvimento de processos. Organização e operação de trabalhos de campo.

Nome da tarefa ou projeto: ESPAÑA The Spanish Inbound Tourism Study (FRONTUR) and the Expenditure Survey (EGATUR) 2001 - 2003, 2003 - 2005, 2005 – 2007, 2007 - 2008 and 2008 - 2009. Institute of Tourism Studies.

Ano: 1996-2009

Local: Espanha

Contratante: Instituto Estadístico de Turismo (IET)

Principais características do projeto: Quantificação e caracterização do turismo de entrada na Espanha

Cargo: Técnico encarregado da execução e analise de dados no projeto

Atividades desempenhadas: Análise do Projeto, tratamento de informação, elaboração de relatórios

Nome da tarefa ou projeto: SITCA – SECRETARIA DE INTEGRACIÓN TURISTICA CENTROAMERICANA (GUATEMALA, BELICE, HONDURAS, EL SALVADOR, NICARAGUA, COSTA RICA, PANAMÁ): Harmonização no recolhimento de informações sobre movimentos dos turistas em fronteiras terrestres dos países da América Central. SG-SICA. Sistema de Integración Centroamericana. October, 2007.

Ano: 2007-2008

Local: SICA

Contratante: SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN TURISTICA CENTROAMERICANA

Principais características do projeto: Harmonização no recolhimento de informações sobre movimentos dos turistas em fronteiras terrestres dos países da América Central

Cargo: Técnico especialista em sistema de informação turístico

Atividades desempenhadas:

- Harmonização regional dos sistemas de medição de fluxos turísticos nas fronteiras terrestres.
- Desenho metodológico da Pesquisa de turismo internacional: amostra, questionários, sistema de tratamento estatístico. Capacitação presencial e integrada, coordenação, desenho de comunidades temáticas.

Nome da tarefa ou projeto: GUATEMALA TSA: Fase preparatória para o desenvolvimento da conta satélite de turismo de Guatemala (CSTG). Inter – American Development Bank. Banco interamericano de

ibef-geo meridiano zero Mcrit

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47818494) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 74

TOCANTINS THE WORLD BANK

Desenvolvimento.

Ano: 2004-2006

Local: Guatemala

Contratante: Banco Interamericano de Desenvolvimento

Principais características do projeto: Análise e implementação das estatísticas turísticas necessárias para a realização de uma CST em Guatemala

Cargo: Especialista de campo

Atividades desempenhadas:

– Plano operacional para a implementação da base para o desenvolvimento de uma conta satélite de turismo piloto
– Desenho metodológico e questionários operação pesquisa turismo internacional, pesquisa turismo interno, inquéritos econômicos estruturais das indústrias Turísticas. Desarrolho e execução de processos. Treinamento. Organização e operação de trabalhos de campo.

e) **13. Certificado:**

Certifico, segundo meu conhecimento e entendimento, que este currículo descreve corretamente minha pessoa, minhas qualificações e minha experiência. Entendo que qualquer declaração voluntariamente falsa aqui incluída pode resultar na minha desqualificação ou no cancelamento de meu trabalho, se for contratado.

Pedro Aramburu Calafel 20/07/2017

Nome do Profissional Assinatura

ibef-geo meridiano zero Mcrit

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47818494) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 75

APÊNDICE C - DISCRIMINAÇÃO DO PREÇO DO CONTRATO

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47818494) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 76

TUCANTINS THE WORLD BANK

TECH 6 - CV ESPECIALISTA EM ESTATÍSTICA

1. Cargo proposto: Especialista em Estatística

2. Nome da empresa: iber-geo

3.Nome do profissional: Grazia Burman

4.Data de nascimento: 09 de maio de 1952 **Nacionalidade:** Italiana/Brasileira (dupla cidadania)

5. Educação:

- GRADUAÇÃO: MATEMÁTICA, pela Faculdade de Filosofia Ciências e Letras Santo André em 1973

- MESTRE EM PLANEJAMENTO TERRITORIAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL na UCSal – Universidade Catolica do Salvador em 2007. Título da dissertação: Análise Comparada de Programas de Formação Profissional Rural no Baixo Sul da Bahia.

- **PÓS GRADUAÇÃO: Cursou o Mestrado em ESTATÍSTICA APLICADA** pela Universidade de São Paulo (USP) como aluna regular nos cursos de Modelos Lineares e Técnicas de Amostragem em 1974-1975..

-EXTENSÃO - Fundação Santo André

Pesquisa Operacional I - Estatística II

-EXTENSÃO- CEPOM

Metodologia do Ensino Superior em 1999

-PÓS GRADUAÇÃO: Curso de Projetos – CPE – Centro de Projetos e Estudos 1988, 360 horas

-PÓS GRADUAÇÃO: Consultoria do ILPES – Contabilidade Social e Regional 1983-1986

-PÓS GRADUAÇÃO – do Mestrado da Ciência da Informação – UFBA. Como aluna especial nas disciplinas de: Economia da Informação e da Comunicação, Informação para Negócios e Prospectiva Tecnológica e Inteligência Competitiva, em 2003.

-PÓS- GRADUAÇÃO - AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL – Ministério de Relações Exteriores da República Italiana, OIT e SENAR em 2005.

-PÓS-GRADUAÇÃO – Curso de Desenvolvimento Profissional sobre Mercados Informais de Solo e Regularização de Assentamentos na América Latina em 2012.

6. Associações profissionais às quais pertence: SINOPEC

7. Outras especialidades:

-Curso de Análise de Sistemas e Programação G.P.D. Rodhia

-IV Seminário de Metodologia de Índice de Preços ao Consumidor

-Curso de Projetos -CPE 360 horas

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47818494) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 77

-Autora e debatedora no XVII Encontro Nacional de Economia- ANPEC.

-I Simpósio Latino- Americano de Docentes e Pesquisadores Científicos de Turismo.

-Apresentação na Associação Nacional de Centros de Pós-Graduação em Economia- ANPEC como debatedora e autora da Pesquisa Emprego na Agricultura Irrigada. 1989. Fortaleza.

-Apresentação no I Simpósio Latino Americano de Docentes e Pesquisadores de Turismo, como autora do trabalho: Turismo- Fonte de Receitas para a Bahia.

-Trabalho para publicação e apresentação aceito no INTERCOM, 1999. Impactos da Cultura no PIB da Bahia.

7. Países onde teve experiência de trabalho: Brasil

8.Idiomas

Idioma	Ler	Falar	Escrever
Italiano	Bom	Bom	Bom
Francês	Bom	Bom	Bom
Espanhol	Bom	Bom	Bom
Inglês	Bom	Bom	Bom

9. Histórico dos Serviços:

De: 2012 Até: 2014
Empresa: CETIND - SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.
Cargo ocupado: Professora de Matemática e Física nos Departamentos de Produção, Meio Ambiente, Petróleo e Gas e EAD.
Tarefas realizadas:: Professora Matemática

De: 2010 Até: 2010
Empresa: FEA – Faculdade de Administração da Bahia
Cargo ocupado: Consultora do Plano de Turismo Náutico da Bahia de Todos os Santos
Tarefas realizadas: Pesquisa de mercado, análise SWOT e Estudo de Demanda Turística na BTS

De: 2010 Até: 2011
Empresa: FUNDAÇÃO ODEBRECHT
Cargo ocupado: Consultora da UNDESA – ONU
Tarefas realizadas: Elaboração de Método de Alfabetização de Adultos em áreas Rurais

De: 1997 Até: 2010
Empresa: UCSAL- UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SALVADOR
Cargo ocupado: Professora de Econometria na Faculdade de Ciências Econômicas da UCSal
Tarefas realizadas: Professora de econometria e orientatora de monografias.

De: 2005 Até: 2006
Empresa: SENAR –Brasília – Pesquisa SADES – Sistema de Avaliação de Desempenho do SENAR

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47818494) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 78

TOCANTINS THE WORLD BANK

Cargo ocupado: Consultora estatística para pesquisa de egressos.
Tarefas realizadas: Representar na OIT as Pesquisas do SENAR no Brasil e na Bahia para Pesquisa de Egressos.

De: 2004 Até: 2004
Empresa: SENAR-Ba – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
Cargo ocupado: Consultora da pesquisa de egressos dos cursos do SENAR
Tarefas realizadas:Pesquisa de Demanda e Imagem do SENAR nos Municípios da Bahia.

De: 1996 Até: 1998
Empresa: UNIFACS- FACULDADES SALVADOR
Cargo ocupado: Professora de Estatística para o Turismo e Teoria e Técnica do Turismo e Supervisora do Convênio entre a SETRAS e a FACS, na capacitação de mão-de--obra em turismo.
Tarefas realizadas. Orientar a elaboração de conteúdos e indicar necessidades de qualificação e requalificação de mão-de-obra no setor turismo na Bahia. Ministrar palestras aos alunos e supervisionar a qualidade técnica dos trabalhos.

De: 1995 Até: 1995
Empresa: Secretaria da Indústria Comércio e Mineração da Bahia
Cargo ocupado: Gerente de Indústria
Tarefas realizadas:Atração de Investimentos Industriais na Bahia.

De: 1994 Até: 1994
Empresa: UNIBAHIA - Unidade Baiana de Ensino, Pesquisa e Extensão
Cargo ocupado: Coordenadora de Pesquisa
Tarefas realizadas. Demanda por Cursos no SENAI e projeções .

De: 1994 Até: 1994
Empresa. FACS-FACULDADES SALVADOR
Cargo ocupado: Professora do Curso de Turismo
Tarefas realizadas: Professora na disciplina de "Teoria e Técnica do Turismo" e "Estatística Aplicada"

De: 1994 Até: 1994
Empresa: SEI - SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DA BAHIA - SEPLANTEC
Cargo ocupado: Assessora Técnica
Tarefas realizadas: Elaboração dos artigos publicados na Revista Bahia Análise e Dados, entre eles: Turismo Interno Fonte de Receitas Seguras para a Bahia, Porto Seguro na Dianteira do Turismo da Bahia, e autora permanente da Revista Retrospectiva Anual no setor de turismo, e análise econômica da revista Conjuntura e Planejamento.
-Coordenadora da Pesquisa em convênio com o BNB "Consumo de Produtos Industrializados em Salvador".
-Responsável pelo release mensal Desempenho da Hotelaria Classificada em Salvador, convênio entre o CEI e a Bahiatursa.
- Responsável pela pesquisa mensal e "release" do Comércio Varejista de Salvador.

De: 1994 Até: 1994
Empresa: Faculdade de Turismo da Bahia- CEPOM.
Cargo ocupado. Professora do Curso de Pós- Graduação em Turismo
Tarefas realizadas: Professora na Disciplina " Tendências do Turismo ".

De: 1994 Até: 1994
Empresa: COPAGRI- Coordenação de Economia Agrícola - SECRETARIA DA AGRICULTURA

ibet-geo meridiano zero Mcrit

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47818494) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 79

Cargo ocupado: Gerente de Indicadores
Tarefas realizadas: Elaboração das revistas " Agricultura em Destaque e Boletim da Copagri"

De: 1994 Até: 1994
Empresa: CPE - Centro de Projetos e Estudos - SEPLANTEC
Cargo ocupado:
Tarefas realizadas: Elaboração e publicação das revistas: Projeção da Demanda de Fertilizantes no Nordeste e Uso da Programação Linear na Agricultura Irrigada.

De: 1994 Até: 1994
Empresa: CEI - Centro de Estatística e Informações - SEPLANTEC - Secretaria do Planejamento
Cargo ocupado: Coordenadora
Tarefas realizadas: Montagem do Sistema de Contabilidade Social do Estado da Bahia

De: 1994 Até: 1994
Empresa: CPE - Centro de Planejamento e Estudos- SEPLANTEC - Secretaria do Planejamento, Ciência e Tecnologia
Cargo ocupado: Coordenadora
Tarefas realizadas: Acompanhar mensalmente a conjuntura econômica e aprofundamento global da economia baiana e suas interrelações com o Nordeste e Brasil, publicando o boletim Informe Conjuntural da Bahia.

De: 1977 Até: 1994
Empresa: CEPLAB - Fundação Centro de Planejamento e Estudos- SEPLANTEC
Cargo ocupado: Técnica Estatística / Superintendente
Tarefas realizadas: Responsável pela emissão do Índice de Preços ao Consumidor de Salvador " e sua publicação mensal.
- Responsável pela coleta, cálculos e análise da "Sondagem Industrial da Bahia", bem como a publicação da revista trimestral "Sondagem da Indústria de Transformação ".

ARTIGOS E TRABALHOS PUBLICADOS

BURMAN, Grazia e GUIMARÃES, José Ribeiro Soares. *A Geração de Empregos na Bahia*, Bahia Investimentos, Salvador Ano IV N 2 abr/1997.

BAHIA ANÁLISE & DADOS. *Turismo na Bahia Crescimento e Perspectivas* , CEI, v.4 n2/3 p113 Salvador 1994.

_____, *As Novas Tendências do Turismo*, SEI v.5 n 3 p 119-124 dezembro Salvador dezembro 1995.

_____, *O Produto Turístico Salvador*.SEI v.6 n 4 p 93-100 Salvador março 1997.

CONJUNTURA & PLANEJAMENTO, *Concentração Fundiária na Bahia*, SEI, n 32 Salvador janeiro 1997.

_____, *Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista de Salvador: Aspectos Metodológicos*, SEI n37 Salvador jun.1997.

_____, *Municipalização Turística. Os Exemplos de Porto Seguro e Belmonte* SEI n30 Nov. Salvador, 1996.

BURMAN, Grazia, *Metodologia para a Estimativa da Formação Bruta de Capital Fixo*, Bahia Investimentos- Salvador janeiro 1996.

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47818494) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 80

BURMAN, Grazia, FREITAS, Agnaldo Paiva. *O Índice de Preços ao Consumidor e as Fases do Processamento de Dados*- Séries Especiais CEI- 15 anos de IPC /Salvador.

BNB-BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. *Consumo de Produtos Industriais na Cidade de Salvador*-CEI Salvador 1994.

BURMAN, Grazia e MOREIRA, Vania Maria. *15 Anos de Custo de Vida e as Principais Modificações do Novo IPC*. Séries Especiais CEI- 15 anos de IPC Salvador.

GÓIS, Zélia Maria Abreu e GRAZIA, Burman. *Relações de Emprego na Irrigação- Um Estudo de Caso: Região de Juazeiro (BA)*. SÉRIE ESTUDOS E PESQUISAS –N 8 Salvador junho 1989.

BURMAN, Grazia. *Impactos da Cultura na Economia da Bahia: Participação no Gasto Turístico e Consumo de Residentes e Governo*. Turismo & Análise, São Paulo 9(2) 70-87 nov. 1998.

CONSULTORIAS REALIZADAS

Nome da tarefa ou projeto: PLANO DIRETOR 2000 - ESTUDO DE ATUALIZAÇÃO DO QUADRO CULTURAL DE SALVADOR- Prefeitura Municipal de Salvador PLANO DIRETOR 2000

Ano: 2000-2000

Local: Salvador

Contratante: Prefeitura de Salvador

Principais características do projeto: Elaborar e Georeferenciar o quadro da Cultura em Salvador identificando os investimentos culturais na cidade

Cargo: Coordenadora

Atividades desempenhadas: Pesquisa de mercado de productos culturais em Salvador e georeferenciamento do patrimonio cultural e proposta de projetos de Leis culturais

Nome da tarefa ou projeto: Estimativas da população de todos os municipios baianos até 2020, população urbana e rural

Ano: 2002-2002

Local: Salvador

Contratante: HYDROS Engenharia

Principais caracteristicas do projeto: Eatudos demográficos e projeções.

Cargo: Consultora.

Atividades desempenhadas: Calculos demográficos

Nome da tarefa ou projeto: Estimativas da população de Salvador para a EMBASA

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47818494) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 81

TOCANTINS THE WORLD BANK

Ano: 1996-1996

Local:

Contratante: HYDROS Engenharia

Principais características do projeto: Estudos demográficos e projeções.

Cargo: Consultora.

Atividades desempenhadas: Cálculos demográficos

Nome da tarefa ou projeto: Banco do Nordeste S.A. Consumo de Produtos Industriais na Cidade de Salvador-CEI
Ano: 1994-1994
Local: Salvador
Contratante: Banco do Nordeste do Brasil
Principais características do projeto: Pesquisa de Consumo de Produtos Industriais em Salvador

Cargo: Coordenadora

Atividades desempenhadas: Cálculos econométricos e demográficos

---

Nome da tarefa ou projeto: Estudo da demanda de água consumida pela população de Salvador E
Ano: 2000-2000
Local: Salvador
Contratante: GEOHYDRO ENGENHARIA
Principais características do projeto: Cálculos econométricos e projeções de demanda da agua em Salvador.

Cargo: Consultora

Atividades desempenhadas: Cálculos econométricos e demográficos

---

Nome da tarefa ou projeto: Análise de Viabilidade Econômico-Financeira do Projeto de Coleta de Resíduos Sólidos do Município de Porto Seguro

Ano: 1998-1998
Local: Porto Seguro
Contratante: CONDER UFC/Engenharia
Principais características do projeto: Estudos de demanda

Cargo: Consultora

Atividades desempenhadas: Análise de Viabilidade Econômico-Financeira

---

Nome da tarefa ou projeto: Análise de Viabilidade Econômico-Financeira do Projeto de Coleta de Resíduos Sólidos do Município de Santa Cruz Cabrália

Ano: 1998-1998
Local: Santa Cruz Cabrália
Contratante: CONDER UFC/Engenharia

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47818494) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 82

TOCANTINS THE WORLD BANK

Principais características do projeto: Estudos de demanda

Cargo: Consultora

Atividades desempenhadas: Análise de Viabilidade Econômico-Financeira

Nome da tarefa ou projeto: Análise de Viabilidade Econômico-Financeira do Projeto de Coleta de Resíduos Sólidos do Município de Belmonte

Ano: 1998-1998

Local: Belmonte

Contratante: CONDER UFC/Engenharia

Principais características do projeto:Estudos de demanda

Cargo: Consultora

Atividades desempenhadas: Análise de Viabilidade Econômico-Financeira

Nome da tarefa ou projeto: Elaboração do Plano de Turismo Náutico da Baía de Todos os Santos – Coordenado pela FEA- UFBA para a Secretaria de Turismo da Bahia e Ministério do Turismo

Ano: 2009-2009

Local: Salvador

Contratante: Secretaria de Turismo da Bahia

Principais características do projeto: Estudos do Perfial da Denanda do turismo náutico na BTS e investimentos .

Cargo: Técnica

Atividades desempenhadas: Análise da demanda e caracterização do perfil.

13. Certificado:

Certifico, segundo meu conhecimento e entendimento, que este currículo descreve corretamente minha pessoa, minhas qualificações e minha experiência. Entendo que qualquer declaração voluntariamente falsa aqui incluída pode resultar na minha desqualificação ou no cancelamento de meu trabalho, se for contratado.

GRAZIA BURMAN Data: 5 de maio de 2017

ibet-geo meridiano zero Mcrit

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47818494) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 83

TOCANTINS THE WORLD BANK

TECH 6 - CV ESPECIALISTA EM TURISMO

1. Cargo proposto Especialista em Turismo

2. Nome da empresa : IBERGEO CONSULTING

3. Nome do profissional : Fabio Montanheiro Alves do Nascimento

4. Data de nascimento: 08/12/1980 Nacionalidade: Brasil

5. Educação:

Instituição (Data) de- (Data) até	Titulo(s) o Diploma(s) obtidos:
Universidade Anhembi-Morumbi (2001/2005)	Graduação em Turismo
Universidade de São Paulo (2005/2006)	Especialização em Marketing Turistico
Fundação Getúlio Vargas (2010)	Especialização em Pesquisas em Turismo
Fundação Instituto de Administração/ Universidade de São Paulo (2010)	Especialização em Gerenciamento de Projetos

11. Associações profissionais às quais pertence Membro do Conselho de Turismo da Federação do Comércio de São Paulo (FecomercioSP)

12. Outras especialidades.

Membro fundador do Observatório de Turismo e Eventos, premiado departamento de estudos e pesquisa e unico da categoria na America do Sul membro da Organização Mundial do Turismo

Especialista em metodologias de impacto econômico, com conhecimentos avançados em geointeligência, analise espacial e design infográfico.

Mais de 16 anos de experiência no setor de viagens em turismo

13. Paises onde teve experiência de trabalho: Brasil e Estados Unidos

14. Idiomas (Indicar bom, regular ou fraco)

Idioma	Ler	Falar	Escrever
Português	B	B	B
Inglês	B	B	B
Espanhol	B	R	R

ibergeo meridiano zero Mcrit

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47818494) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 84

TOCANTINS THE WORLD BANK

15. Histórico dos Serviços

De: 2015 Até: Atualmente

Empresa: São Paulo Turismo S/A

Cargo desempenhado: Coordenador Geral

Responsável pelo departamento de pesquisa, gerenciando uma equipe de 3 colaboradores e um orçamento de pesquisa de R$ 1,2 milhão/ ano. Mais de 100 pesquisas publicadas, incluindo eventos importantes, tais como Grande Prêmio do Brasil de F1, Carnaval, Lollapalooza Festival e Virada Cultural, diagnósticos para dois Planos Municipais Turismo (2010-2014 e 2015-2018) e a Sala de Monitoramento do Turismo para a Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014™. Desenvolvimento de metodologias completas para pesquisas, impacto econômico do turismo na cidade, coleta de dados em diversos setores, incluindo hotéis, agências de viagens, atrações, parques, bares e restaurantes, entre outros. O Observatório do Turismo de Eventos é o creditado como primeira iniciativa de investigação de turismo sólida do Brasil e único do gênero na América do Sul a integrar o Núcleo Internacional de Observatórios de Turismo Sustentável das Nações Unidas (UNSTO/UNWTO).

De: 2009 Até: 2014

Empresa: São Paulo Turismo S/A

Cargo Desempenhado: Coordenador Técnico

De: 2006 Até: 2009

Empresa: São Paulo Turismo S/A

Cargo desempenhado: Analista

De: 2002 Até: 2003

Empresa: Walt Disney World Resorts Florida

Cargo desempenhado: Merchandise Host

ibet-geo meridiano . zero Mcrit

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47818494) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 85

TOCANTINS THE WORLD BANK

11. Tarefas atribuídas: levantamento de dados, analise de fontes e elaboração do Boletim de Desempenho Economico do Turismo

12.Serviços prestados que melhor demonstram a capacidade para executar as tarefas atribuídas

São Paulo: Cidade do Mundo - Dados e fatos sobre o setor de viagens, turismo, eventos e negocios na capital paulista

jun de 2017 – dez de 2017

Descrição do projeto

Construído em parceria entre a São Paulo Turismo (SPTuris), o São Paulo Convention & Visitors Bureau (SPC&VB) e as mais diversas entidades ligadas ao turismo paulistano, o documento traz os números oficiais do setor de turismo e eventos da cidade no ano de 2017.

Pesquisa de Demanda Turística - Cidade de São Paulo

fev de 2015 – nov de 2015

Descrição do projeto

Perfil de demanda turística realizada nas principais vias de acesso à cidade de São Paulo, tais como terminais de ônibus, três aeroportos e estradas principais que dão acesso a cidade. O estudo inédito teve como objetivo traçar o perfil do turista que visita a capital do estado e seus hábitos de consumo, enquanto na cidade.

Plano de Turismo Municipal

jan de 2014 – jan de 2015

Descrição do projeto

Elaboração dos diagnósticos para o Plano Municipal de Turismo da Cidade de São Paulo, com diretrizes, analyses de Mercado e diagnósticos voltados ao segmento de viagens, eventos e negocios do turismo na capital paulista

Perfil do Torcedor - FIFA Brazil 2014 World Cup

jun de 2014 – ago de 2014

Descrição do projeto

7.683 entrevistas válidas aplicadas com os moradores, visitantes e turistas que estavam na cidade de São Paulo durante a Copa do Mundo. Este é um perfil completo dos torcedores, com hábitos de consumo para o evento, atividades na cidade, avaliação de São Paulo e outros dados importantes

ibef-geo meridiano zero Mcrit

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47818494) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 86

TOCANTINS THE WORLD BANK

Central de Monitoramento do Turismo - FIFA Brazil 2014 World Cup

Jun de 2014 – jul de 2014

Descrição do projeto

O objetivo principal do projeto foi disponibilizar aos interessados por dados diários sobre os impactos da Copa do Mundo da FIFA 2014 na cidade de São Paulo, um banco de dados organizado e facilmente pesquisável sobre os indicadores para o evento, o movimento de torcedores, turistas hábitos de consumo, perfil sócio-demográfico e serviços diretamente relacionados e indiretamente para o evento.

Anuário Estatístico do Turismo Paulistano

Edições 2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016

Julho 2009 – Janeiro 2017

A compilação de dados do turismo na cidade de São Paulo é projeto pioneiro. O documento inclui dados principais do setor, como a cobrança de impostos, ocupação hoteleira, as chegadas de turistas, principais atrações visitadas e turistas gastaram durante a estadia. Este é o primeiro Anuano Estatístico de um destino no Brasil.

13. Certificado:

Certifico, segundo meu conhecimento e entendimento, que este currículo descreve corretamente minha pessoa, minhas qualificações e minha experiência. Entendo que qualquer declaração voluntariamente falsa aqui incluída pode resultar na minha desqualificação ou no cancelamento de meu trabalho, se for contratado.

Data: 6 de junho de 2018

Fabio Montanheiro Alves do Nascimento

ibeGeo meridiano zero Mcrit

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47818494) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 87

TUCANTINS THE WORLD BANK

FORMULÁRIO FIN – 2 – RESUMO DE CUSTOS

Item	Custo Total EUR (€)
Custo da Proposta Financeira	
Incluindo	
(1) Remuneração de Pessoal	170 350,00
(2) Despesas Reembolsáveis	44 800,00
Valor Total da Proposta de Preço	215 050,00
Impostos Locais	
(a) Impostos Retraçados	53 762,50
Total	268 812,50

iberogeo meridiano zero Mcrit

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47818494) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 88

TOCANTINS THE WORLD BANK

FORMULÁRIO FIN - 3 - DISCRIMINAÇÃO DE REMUNERAÇÃO

Nº	Nome	Cargo		Tarifa Pessoa-Mês		Insumo de tempo em Pessoa/Mês	Total EUR (€)
EQUIPE CHAVE							
E-1	Jerome PINES	Coordenador Geral	Sede	€	6 500,00	4,00	26.000,00
			Campo				
E-2	Pedro ARAMBURU	Especialista em Hidrologia Urbana	Sede	€	6 500,00	3,50	22.750,00
			Campo				
E-3	Gisela BURKART	Especialista em estatísticas	Sede	€	4 000,00	3,00	12.000,00
			Campo				
E-4	Fabio NASCIMENTO	Especialista em turismo	Sede	€	4 000,00	3,00	12.000,00
			Campo				
EQUIPE DE APOIO							
N-1	Judith MUNDAI	Aconselhamento general do contrato	Sede	€	6 500,00	5,00	32.500,00
			Campo				
N-2	Ana RIVAS	Especialista em Observatórios Turísticos	Sede	€	6 500,00	4,00	26.000,00
			Campo				
N-3	Efraim ZABALA	Especialista em SIG e ferramentas informáticas	Sede	€	6 500,00	4,00	26.000,00
			Campo				
N-4	Mario GALVANI	Especialista em desenho gráfico	Sede	€	3 000,00	1,00	3.000,00
			Campo				
N-5	A DETERMINAR	Peloteiro local de apoio	Sede	€	2 500,00	4,00	10.000,00
			Campo				
Total							170.250,00

iberGeo meridiano zero Mcrit

27

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47818494) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 89

Serviços de Consultoria

Preço Global

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47817859) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 90

Sumário

Prefácio **4**
I. Contrato **7**
II.Condições Gerais do Contrato **8**
A. Disposições Gerais **9**
1. Definições 9
2. Relacionamento entre as Partes 10
3. Legislação Aplicável 10
4. Idioma 10
5. Títulos 11
6. Comunicações 11
7. Local 11
8. Autoridade do Membro Líder 11
9. Representantes autorizados 11
10. Práticas corruptas e fraudulentas 11
B. Início, Conclusão, Modificação e Rescisão do Contrato **11**
11. Vigência do Contrato 11
12. Rescisão do Contrato por Falta de Entrada em Vigor 12
13. Início dos serviços 12
14. Encerramento do Contrato 12
15. Totalidade do Acordo 12
16. Modificações ou Variações 12
17. Força Maior 12
18. Suspensão 13
19. Rescisão 14
C. Obrigações do Consultor **16**
20. Disposições Gerais 16
21. Conflito de Interesses 17
22. Confidencialidade 18
23. Responsabilidade do Consultor 18
24. Seguro a ser obtido pelo Consultor 18
25. Contas, Inspeção e Auditoria 18
26. Obrigações de apresentar relatórios 19
27. Direitos de propriedade do Cliente nos relatórios e registros 19

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47817859) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 91

28. Equipamentos, Veículos e Materiais 19
D. Especialistas do Consultor e Subconsultores 20
29. Descrição de Especialistas principais 20
30. Substituição Especialistas Principais 20
31. Remoção de Especialistas ou Subconsultores 20
E. Obrigações do Cliente 20
32. Assistência e Isenções 20
33. Acesso ao Local do Projeto 21
34. Mudança na Legislaçao Aplicável Relativa a Impostos e Taxas 21
35. Serviços, instalações e bens do Cliente 21
36. Equipe de Contrapartida 22
37. Obrigação de pagamento 22
F.. Pagamentos ao Consultor 22
38. Preço do Contrato 22
39. Impostos e Direitos 22
40. Moeda de Pagamento 22
41. Forma de Cobrança e de Pagamento 22
42. Juros sobre Pagamentos Atrasados 23
G. Equidade e Boa-Fé 24
43. Boa-Fé 24
H. Resolução de Conflitos 24
44. Solução Amigável 24
45. Solução de controvérsias 24
Anexo 1: Política do Banco Mundial - Práticas Corruptas e Fraudulentas 25
III.Condições Especiais do Contrato 27
IV. Apêndices 35
Apêndice A - Termos de Referência 35
Apêndice B - Equipe Principal 20
Apêndice C - Discriminação do Preço do Contrato 39
Apêndice D - Formulário de Garantia de Adiantamentos ..... Erro! Indicador não definido.

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47817859) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 92

Prefácio

1. O Contrato consiste em quatro partes: o Contrato a ser assinado pelo Cliente e o Consultor, as Condições Gerais do Contrato (CG), incluindo Anexo 1 (Política do Banco Mundial - Fraude e Corrupção); as Condições Especiais do Contrato (CE) e os Apêndices.

2. As Condições Gerais do Contrato, incluindo o Anexo 1, não devem ser modificadas. As Condições Especiais do Contrato que contenham cláusulas específicas para cada Contrato têm o objetivo de complementar, mas não substituir ou de outro modo contradizer, as Condições Gerais.

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47817859) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 93

CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Preço Global

Nome do Projeto: Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável - PDRIS

Nº *Empréstimo: 8185-0 BR*

CONTRATO Nº19/2019/GABPRES/ADETUC

entre

Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa – ADETUC

e

Consórcio Iber-Geo Consulting/Mcrit, S.L/Meridiano Zero, S.L

PALMAS, 08 DE JULHO DE 2019

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47817859) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 94

I. Contrato

PREÇO GLOBAL

Este CONTRATO (doravante denominado o "Contrato") é celebrado no *[número ordinal]* dia do mês *[mês]*, *[ano]*, entre, por um lado, o Governo do Estado do Tocantins através da *Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa – ADETUC,* CNPJ 32.842.584/0001-39 (doravante denominado o "Cliente") e, por outro lado, o Consórcio ***Iber-Geo Consulting/Mcrit, S.L/Meridiano Zero, S.L*** (doravante denominado o "Consultor"), formado(a) pelas seguintes empresas, ***Iber-Geo Consulting*** com sede na Rua Guardia, 12, Irla B 08001, Barcelona, Espanha CIF Nº B-61463188 e CNPJ como empresa domiciliada no exterior sob nº 26.485.154/0001-04, neste ato representado pelo seu procurador Sr. Marcelo Marcos da Silva Fonseca, brasileiro, casado, contador, RG 18.606.068-3 SSP/SP e CPF/MF 28.072.088-35; ***Mcrit, S.L.,*** com sede estabelecida em Salvador Espriu, 85, Barcelona, Espanha, registrada perante o registro comercial de Barcelona, folha 44, tomo 9.496, livro 8.679, inscrita no CIF sob nº B58677428, neste ato representada por seu bastante procurador Sr. Andreu Ulied Seguí, Espanhol, casado, empresário, nascido em Barcelona, Carteira de Identidade DNI nº 35037418T, residente e domiciliado em Barcelona, Espanha, ***Meridiano Zero, S.L,*** com sede na avenida Sancho el Fuerte, 57, Pamplona, Espanha, Registro comercial de Navarra, folha 93, tomo 1.297, livro NA-25827 e CIF nº B31917149, neste ato representado pela Sra. Ana Rivas Allo, espanhola, empresária, nascida em Pamplona, portadora da Carteira de Identidade DNI nº 33440607X, residente e domiciliada em Pamplona, Espanha,(doravante denominados "Consultor").

CONSIDERANDO QUE

(a) o Cliente tenha solicitado ao Consultor o fornecimento de determinados serviços de consultoria conforme definidos neste Contrato (doravante denominados "Serviços");

(b) o Consultor, tendo declarado ao Cliente possuir as habilidades profissionais necessárias, conhecimento especializado e recursos técnicos, concordou em prestar os Serviços nos termos e condições definidos neste Contrato;

(c) o Cliente recebeu um empréstimo do(a) Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD): em relação ao custo dos Serviços e pretende aplicar uma parte dos resultados deste empréstimo em pagamentos elegíveis sob este Contrato, sabendo que (i) os pagamentos por parte do Banco Mundial serão efetuados apenas a pedido do Cliente e com a aprovação do Banco Mundial; (ii) tais pagamentos estarão sujeitos, em todos os aspectos, aos termos e condições do acordo de empréstimo incluindo as proibições de retirada da conta de empréstimo para efetuar qualquer pagamento a pessoas ou entidades, ou para qualquer importação de mercadorias, se tal pagamento ou importação, quando de conhecimento do Banco Mundial, for proibido por decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas descrito no Capítulo VII da Carta das Nações Unidas; e (iii) nenhuma parte, a não ser o Cliente, deverá obter quaisquer direitos do acordo de empréstimo ou fazer alguma solicitação de recursos de empréstimo

AS PARTES têm por justo e acordado o seguinte:

1. Os seguintes documentos anexos serão considerados como parte integrante deste Contrato:

(a) As Condições Gerais do Contrato (inclusive o Anexo 1 "Política do Banco - Fraude e Corrupção");

(b) As Condições Especiais do Contrato;

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47817859) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 95

(c) Apêndices:

Apêndice A: Termos de referência

Apêndice B: Especialistas Principais

Apêndice C: Discriminação de Preços do Contrato

Apêndice D: Formulário de Garantia de Adiantamentos

No caso de qualquer inconsistência entre os documentos, a seguinte ordem de prioridade deve prevalecer: as Condições Especiais do Contrato; as Condições Gerais do Contrato, incluindo Anexo 1; Apêndice A; Apêndice B; Apêndice C; Apêndice D. Qualquer referência a este Contrato deve incluir, onde o contexto permitir, uma referência a seus Apêndices.

2. Os direitos e obrigações do Cliente e do Consultor serão aqueles estabelecidos no Contrato, em particular:

(a) o Consultor prestará os Serviços de acordo com as disposições do Contrato; e

(b) o Cliente efetuará os pagamentos ao Consultor de acordo com as disposições do Contrato.

EM TESTEMUNHO DO QUE, as Partes assinam o presente Contrato em seus respectivos nomes, no dia e ano acima indicados.

Por e em nome de **Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa – ADETUC.**

ALDISON WISEMAN BARROS DE LYRA
Presidente
ADETUC

Para e em nome de **Consórcio Iber-Geo Consulting/Mcrit, S.L/Meridiano Zero, S.L**

JUDITH MUNTAL
Representante Legal
Consórcio Iber-Geo Consulting/Mcrit, S.L/Meridiano Zero, S.L

Testemunhas:

1)_____

2)_____

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47817859) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 96

II. Condições Gerais do Contrato

A. Disposições Gerais

1. Definições

1.1. A menos que o contexto exija de outra forma, as expressões e termos abaixo terão, para a finalidade do contrato, os seguintes significados:

(a) "Diretrizes Aplicáveis" são as Diretrizes para Seleção e Contratação de Consultores em Empréstimos do BIRD e os Créditos e Subsídios da AID por parte dos Mutuários do Banco Mundial, datados de janeiro de 2011.

(b) "Legislação Aplicável" significa as leis e quaisquer outros instrumentos que tenham força de lei no país do Cliente ou em qualquer outro país especificado nas Condições Especiais do Contrato (CE), que possam ser aprovadas e estar em vigor periodicamente.

(c) "Banco" significa o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e a Associação Internacional de Desenvolvimento (AID).

(d) "Mutuário" significa o Governo, órgão do Governo ou outra entidade que assine o contrato de financiamento com o Banco.

(e) "Cliente" significa a agência executora que assina o Contrato para os Serviços com o Consultor Selecionado.

(f) "Consultor" significa uma empresa de consultoria ou entidade legalmente constituída selecionada pelo Cliente para fornecer os Serviços nos termos do Contrato assinado.

(g) "Contrato" significa o acordo obrigatório por escrito, assinado entre o Cliente e o Consultor e que inclui todos os documentos anexos listados no parágrafo 1 do Contrato (as Condições Gerais (CG), as Condições Especiais (CE) e os Apêndices).

(h) "Dia" significa um dia útil, salvo disposição em contrário.

(i) "Data de vigência" significa a data em que este Contrato passa a vigorar e ter efeito de acordo com a Cláusula CG 11.

(j) "Especialistas" significa coletivamente os "Especialistas Principais", "Especialistas de Apoio" ou qualquer funcionário do Consultor, Subconsultor ou membro(s) do consórcio designado pelo Consultor para executar os Serviços ou qualquer parte deles nos termos do Contrato.

(k) "Moeda estrangeira" significa qualquer moeda que não seja a moeda do país do Cliente.

(l) "CG" significa as Condições Gerais do Contrato.

(m) "Governo" significa o governo do país do Cliente.

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47817859) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 97

(n) "Consórcio" significa uma associação com ou sem personalidade jurídica diferente daquela dos seus membros, de mais de uma entidade onde um membro tem autoridade para realizar todos os negócios por e em nome de todo e qualquer membro do consórcio e onde os membros do consórcio são conjunta e solidariamente responsáveis perante o Cliente pela execução do Contrato.

(o) "Especialista(s) Principal(is)" significa um profissional individual cujas habilidades, qualificações, conhecimento e experiência são críticos para a execução dos Serviços nos termos do Contrato e cujo Curriculum Vitae (CV) foi levado em consideração na avaliação técnica da proposta do Consultor.

(p) "Moeda local" significa a moeda do país do Cliente.

(q) "Especialista(s) de Apoio" significa um profissional fornecido pelo Consultor ou seu Subconsultor para executar os Serviços ou alguma parte deles nos termos do Contrato.

(r) "Parte" significa o Cliente ou o Consultor, conforme o caso, e "Partes" abrange ambos.

(s) "CE" significa as Condições Especiais do Contrato, por meio das quais as Condições Gerais podem ser modificadas ou complementadas, mas não substituídas.

(t) "Serviços" significa o trabalho a ser executado pelo Consultor de acordo com este Contrato, conforme a descrição no Apêndice A deste Contrato.

(u) "Subconsultores" significa uma entidade para quem/a qual o Consultor subcontrata qualquer parte dos Serviços enquanto permanece o único responsável pela execução do Contrato.

(v) "Terceiro" significa qualquer pessoa ou entidade que não seja o Governo, o Cliente, o Consultor ou o Subconsultor.

2. Relacionamento entre as Partes

2.1. Nenhuma disposição neste documento deve ser interpretada como determinante de uma relação de patrão e empregado ou de chefe e subordinado entre o Cliente e o Consultor. Nos termos deste Contrato, o Consultor dispõe de total controle sobre os Especialistas e os Subconsultores, se houver, que estiverem executando os Serviços e assumirá plena responsabilidade pelos trabalhos desempenhados por eles ou em seu nome.

3. Legislação Aplicável

3.1. Este Contrato, seu significado e interpretação, e a relação entre as Partes devem ser regidos pela Legislação Aplicável.

4. Idioma

4.1. Este Contrato foi assinado no idioma especificado nas Condições Especiais, que será obrigatório e regerá todas as questões referentes ao seu significado ou interpretação.

5. Títulos

5.1. Os títulos não deverão limitar, alterar ou afetar o significado deste Contrato.

6. Comunicações

6.1. Qualquer comunicação exigida ou permitida a ser divulgada ou feita nos termos deste Contrato deverá ser por escrito no idioma especificado na Cláusula CG 4. Considera-se válida qualquer comunicação, solicitação ou autorização quando houver sido entregue pessoalmente a um representante autorizado da Parte a quem a comunicação for dirigida, ou mediante o seu envio para o endereço da referida Parte especificado nas **CE.**

6.2. Uma Parte pode alterar o seu endereço para recebimento de notificações, de acordo com este Contrato, mediante comunicação à outra Parte sobre a mudança do endereço indicado nas Condições Especiais.

7. Local

7.1. Os Serviços serão executados nos locais indicados no **Apêndice A** destas CG, e quando o local de uma tarefa específica não for assim estabelecido, esta será realizada em localidade aprovada pelo Cliente, seja no país do Governo ou em outro local.

8. Autoridade do Membro Líder

8.1. Se o Consultor consistir em um Consórcio, os membros autorizam a entidade especificada nas Condições Especiais a atuar em seu nome no exercício de todos os direitos e obrigações do Consultor junto ao Cliente, nos termos deste Contrato, incluindo, sem limitação, o recebimento de instruções e pagamentos do Cliente.

9. Representantes autorizados

9.1. Os funcionários indicados nas **CE** poderão tomar qualquer medida que o Cliente ou o Consultor deva ou possa adotar, bem como poderão assinar qualquer documento que possa ou deva ser assinado pelo Cliente ou pelo Consultor, de acordo com este Contrato.

10. Práticas corruptas e fraudulentas

10.1. O Banco Mundial exige conformidade com a sua política relacionada a práticas corruptas e fraudulentas conforme definido no **Anexo 1** das CG.

a. Comissões e honorários

10.2. O Cliente requer que o Consultor divulgue quaisquer comissões, gratificações ou honorários que possam ter sido pagos ou que devam ser pagos a agentes ou a qualquer outra parte com relação ao processo de seleção ou execução do Contrato. As informações divulgadas devem incluir pelo menos o nome e o endereço do agente ou da outra parte, o montante e a moeda, e a finalidade da comissão, gratificações ou honorários. Qualquer problema na divulgação de tais comissões, **gratificações** ou honorários pode resultar na rescisão do Contrato e/ou em sanções por parte do Banco..

B. Início, Conclusão, Modificação e Rescisão do Contrato

11. Vigência do Contrato

11.1. Este Contrato entrará em vigor e efeito na data ("Data de vigência") em que o Cliente notificar o Consultor, instruindo-o a dar início à execução dos Serviços. Essa notificação deverá confirmar que foram atendidas as condições para entrada em vigor, se houver, relacionadas nas **CE.**

12. Rescisão do Contrato por Falta de Entrada em Vigor

12.1. Após a assinatura pelas Partes, se este Contrato não entrar em vigor dentro do prazo especificado nas **CE**, qualquer uma das Partes pode declarar este Contrato anulado e sem efeito, mediante comunicação por escrito à outra Parte, com antecedência mínima de 22 (vinte e dois) dias. No caso de tal afirmação por uma das Partes, nenhuma delas poderá fazer qualquer reivindicação à outra Parte relacionada ao Contrato.

13. Início dos serviços

13.1. O Consultor confirmará a disponibilidade dos Especialistas Principais e dará início aos Serviços em no máximo o número de dias após a Data de Entrada em Vigor especificada nas **CG**.

14. Encerramento do Contrato

14.1. Exceto quando rescindido em data anterior, de acordo com a Cláusula CG 19, este Contrato estará encerrado no final do prazo após a Data de Vigência, conforme especificado nas **CE.**

15. Totalidade do Acordo

15.1. Este Contrato contém todos os acordos, condições e disposições ajustadas pelas Partes. Nenhum agente ou representante de qualquer das Partes dispõe de autoridade para fazer, nem as Partes estarão sujeitas ou serão responsáveis por qualquer declaração, representação, promessa ou acordo que não tenha sido estabelecido neste Contrato.

16. Modificações ou Variações

16.1. Qualquer modificação ou variação nos termos e condições deste Contrato, incluindo qualquer alteração ou mudança no escopo dos Serviços, poderá ser feita somente por meio de acordo por escrito entre as Partes.

16.2. Quando as modificações ou variações forem substanciais, será necessário obter o prévio consentimento do Banco.

17. Força Maior

a. Definição

17.1. Para a finalidade deste Contrato, "Força Maior" significa um evento que está fora do controle razoável de uma Parte, não é previsível nem pode ser evitado e que, nas circunstâncias, torna impossível ou é tão impraticável que pode ser considerado razoavelmente impossível o cumprimento, nessas circunstâncias, de suas obrigações estabelecidas neste Contrato. Essas situações abrangem, mas não se limitam a guerras, rebeliões, distúrbios civis, terremotos, incêndios, explosões, tempestades, enchentes ou outras condições climáticas adversas, greves de trabalhadores e patronais, ou outras ações sindicais, confisco ou qualquer outra medida tomada por órgãos governamentais.

17.2. Força Maior não inclui (i) qualquer evento provocado por negligência ou ação intencional de uma Parte ou de seus Especialistas, Subconsultores, agentes ou empregados nem (ii) qualquer acontecimento que uma Parte diligente pudesse ter previsto no momento da assinatura deste Contrato e ter evitado ou solucionado durante o cumprimento de suas obrigações estabelecidas neste instrumento contratual.

17.3. Não constitui motivo de Força Maior a insuficiência de fundos ou falta de qualquer pagamento previsto neste Contrato.

b. Não constitui violação do contrato

17.4. O descumprimento de qualquer das obrigações de uma Parte estabelecidas neste Contrato não será considerado violação ou negligência, se esse descumprimento resultar de um evento de Força Maior, desde que a Parte afetada por esse evento tenha tomado todas as precauções razoáveis, o devido cuidado ou medidas alternativas legítimas com o objetivo de cumprir os termos e condições deste Contrato.

c. Medidas a serem adotadas

17.5. A Parte afetada por um evento de Força Maior deverá continuar a executar suas obrigações determinadas pelo Contrato, na medida do possível, e tomar todas as providências razoáveis para minimizar as conseqüências de qualquer evento de Força Maior.

17.6. A Parte afetada por um evento de Força Maior deverá notificar prontamente a outra Parte sobre tal acontecimento e, em qualquer caso, no prazo máximo de 14 (quatorze) dias seguintes à ocorrência de tais acontecimentos, apresentando evidências de sua natureza e causa e, da mesma forma, deverá notificar por escrito a volta às condições normais tão logo seja possível.

17.7. Qualquer prazo em que uma Parte deva concluir qualquer ação ou tarefa, de acordo com este Contrato, será estendido por um período igual àquele durante o qual a referida Parte não pôde executá-la devido a um evento de Força Maior.

17.8. Durante o período de sua incapacidade para executar os Serviços devido a um evento de Força Maior, o Consultor, instruído pelo Cliente, deverá:

(a) interromper os trabalhos e, nesse caso, o Consultor será reembolsado pelos custos adicionais e necessários que tenha assumido de forma razoável e, se for exigido pelo Cliente, ao reativar os Serviços; ou

(b) continuar com os Serviços até o ponto que for possível, e neste caso o Consultor deverá continuar a ser pago conforme os termos deste Contrato e será reembolsado pelos custos adicionais incorridos de forma razoável e necessária.

17.9. No caso de desacordo entre as Partes quanto à existência ou à extensão do evento de Força Maior, o fato deverá ser solucionado de acordo com as Cláusulas das CG 44 e 45.

18. Suspensão

18.1. O Cliente pode interromper todos os pagamentos ao Consultor previstos neste Contrato, mediante aviso de suspensão por escrito ao

Consultor, se este deixar de cumprir qualquer de suas obrigações estabelecidas neste instrumento contratual, inclusive a execução dos Serviços, desde que o aviso de suspensão (i) especifique a natureza do descumprimento, e (ii) solicite ao Consultor a correção das falhas detectadas no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento pelo Consultor da notificação.

19. Rescisão

19.1. Este Contrato pode ser rescindido por qualquer das Partes de acordo com as disposições definidas a seguir:

a. Pelo Cliente

19.1.1. O Cliente pode rescindir este Contrato no caso de ocorrência de qualquer dos eventos especificados nos parágrafos (a) a (f) desta Cláusula. Em tal ocorrência, o Cliente deverá dar um aviso de rescisão por escrito de ao menos trinta (30) dias corridos ao Consultor no caso dos eventos referenciados nos itens (a) a (d); um aviso por escrito de ao menos sessenta (60) dias corridos no caso do evento referido no parágrafo (e); e um aviso por escrito de pelo menos cinco (5) dias corridos no caso do evento referido no item (f):

(a) Se o Consultor deixar de corrigir uma falha no desempenho das suas obrigações aqui previstas, conforme especificado em um aviso de suspensão de acordo com a Cláusula CG 18;

(b) Se o Consultor (ou se ele consistir mais de uma entidade, se qualquer de seus membros) entrar em processo de insolvência ou de falência ou estabelecer qualquer acordo com seus credores para reduzir a sua dívida ou lançar mão de alguma lei que beneficie os devedores ou ainda entrar em processo de liquidação ou em concordata compulsória ou voluntária;

(c) Se o Consultor deixar de cumprir qualquer decisão final resultante de um procedimento de arbitragem conforme a Cláusula CG 45.1:

(d) Se, por motivo de Força Maior, o Consultor não puder executar uma parte essencial dos Serviços durante um período não inferior a 60 (sessenta) dias;

(e) Se o Cliente, sob seu exclusivo critério e por qualquer razão, decidir rescindir este Contrato;

(f) Se o Consultor deixar de confirmar a disponibilidade dos Especialistas principais conforme exigência da Cláusula CG 13.

19.1.2 Ademais, se o Cliente determinar que o Consultor envolveu-se em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao competir por um Contrato ou executá-lo, o Cliente

poderá, 14 (quatorze) dias após enviar notificação por escrito ao Consultor, rescindir o Contrato com o Consultor.

b. Pelo Consultor

19.1.3. O Consultor pode rescindir este Contrato, por meio de um aviso por escrito ao Cliente de pelo menos trinta (30) dias corridos, no caso de ocorrência de qualquer evento especificado nos parágrafos (a) a (d) desta Cláusula.

(a) Se o Cliente deixar de pagar qualquer montante devido ao Consultor de acordo com este contrato e não sujeito a disputa de acordo com a Cláusula CG 45.1 dentro de quarenta e cinco (45) dias corridos após o recebimento de aviso por escrito do Consultor de que esse pagamento está em mora.

(b) Se, por motivo de Força Maior, o Consultor não puder executar uma parte essencial dos Serviços durante um período não inferior a 60 (sessenta) dias.

(c) Se o Cliente deixar de cumprir qualquer decisão final resultante de um procedimento de arbitragem conforme a Cláusula CG 45.1.

(d) Se o Cliente descumprir de modo substancial as suas obrigações previstas neste Contrato e não corrigir a sua conduta no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias (ou um período maior que o Consultor pode ter subsequentemente aprovado por escrito) a partir do recebimento pelo Cliente da notificação do Consultor especificando o descumprimento.

c. Cessação dos Direitos e Obrigações

19.1.4. Após a rescisão deste Contrato de acordo com as Cláusulas CGC 12 ou CGC 19 deste documento, ou após a expiração deste Contrato de acordo com a Cláusula CG 14, todos os direitos e obrigações das Partes aqui especificadas cessarão, exceto (i) os direitos e obrigações que possam ter se acumulado na data da rescisão ou expiração, (ii) a obrigação de confidencialidade determinada na Cláusula CG 22, (iii) a obrigação do Consultor de permitir a inspeção, cópia e auditoria de suas contas e seus registros definida na Cláusula CG 25, e (iv) qualquer direito que uma das Partes possa ter de acordo com a Legislação Aplicável.

d. Cessação dos Serviços

19.1.5. Após a rescisão deste Contrato por aviso de qualquer das Partes para a outra conforme as Cláusulas CG 19a ou CG 19b, o Consultor deverá, imediatamente após o envio ou recebimento desse aviso, seguir todas as etapas necessárias para encerrar os Serviços de forma oportuna e ordenada, e deverá fazer todo o esforço possível para manter as despesas para este fim em um mínimo. Com relação

aos documentos preparados pelo Consultor e aos equipamentos e materiais fornecidos pelo Cliente, o Consultor deverá proceder conforme determinado, respectivamente, pelas Cláusulas CG 27 ou CG 28.

e. Pagamento na Rescisão do Contrato

19.1.6. Após a rescisão deste Contrato, o Cliente deverá fazer os seguintes pagamentos ao Consultor:

(a) pagamento dos Serviços realizados satisfatoriamente antes da data de entrada em vigor da rescisão; e

(b) no caso de rescisão em conformidade com os parágrafos (d) e (e) da Cláusula CG 19.1.1, o reembolso de qualquer custo razoável incidental para a rescisão imediata e organizada deste Contrato, incluindo o custo da viagem de volta dos Especialistas.

C. Obrigações do Consultor

20. Disposições Gerais

a. Padrão de Desempenho

20.1 O Consultor deverá desempenhar e executar os Serviços com toda a devida diligência, eficiência e economia, de acordo com os padrões e as práticas profissionais aceitas de modo geral, observar sólidas práticas de gestão, empregar a tecnologia apropriada e equipamentos, maquinário, materiais e métodos seguros e eficazes. O Consultor deverá sempre agir, com respeito a qualquer assunto relativo a este Contrato ou aos Serviços, como um consultor fiel ao Cliente, e deverá sempre apoiar e proteger os interesses legítimos do Cliente em todas as negociações com terceiros.

20.2. O Consultor deverá contratar e fornecer Especialistas e Subconsultores qualificados conforme exigido para executar os Serviços.

20.3. O Consultor pode subcontratar parte dos Serviços até certo ponto e com os Especialistas Principais e Subconsultores aprovados previamente pelo Cliente. Não obstante essa aprovação, o Consultor deverá manter total responsabilidade pelos Serviços.

b. Legislação Aplicável aos Serviços

20.4. O Consultor deverá realizar os Serviços de acordo com o Contrato e a Legislação Aplicável e seguir todas as etapas possíveis para garantir que todos os seus Especialistas e Subconsultores cumpram a Legislação Aplicável.

20.5. Durante a execução do Contrato, o Consultor deverá cumprir as proibições relativas à importação de bens e serviços no país do Cliente quando

(a) por uma questão legal ou normas oficiais, o país do Mutuário proibir o estabelecimento de relações comerciais com aquele país; ou

(b) em conformidade com uma decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas tomada de acordo com o Capítulo VII da Carta das Nações Unidas, o País do Mutuário proibir qualquer importação de bens daquele país ou quaisquer pagamentos a qualquer país, pessoa ou entidade daquele país.

20.6. O Cliente deverá notificar o Consultor por escrito dos costumes locais relevantes e o Consultor deverá, após essa notificação, respeitar tais costumes.

21. Conflito de Interesses

21.1. O Consultor deverá priorizar os interesses do Cliente sem considerar a possibilidade de qualquer trabalho futuro e evitar estritamente conflitos com outros contratos ou com os seus próprios interesses corporativos.

a. O Consultor não deve se beneficiar de comissões,descontos, etc.

21.1.1 O pagamento do Consultor de acordo com a CG F (Cláusulas CG 38 a 42) deverá constituir o único pagamento do Consultor em relação a este Contrato e, conforme a Cláusula CG 21.1.3, o Consultor não deverá aceitar em seu próprio benefício nenhuma comissão comercial, desconto ou pagamento similar em conexão com as atividades relativas a este Contrato ou no desempenho das suas obrigações aqui previstas, e o Consultor deverá usar seus maiores esforços para garantir que todos os Subconsultores, bem como os Especialistas e respectivos agentes, também não recebam qualquer pagamento adicional.

21.1.2 Outrossim, se o Consultor for responsável, como parte dos Serviços, por assessorar o Cliente na aquisição de bens, obras ou serviços, o Consultor deverá cumprir as diretrizes de aquisição aplicáveis do Banco e sempre exercer tal responsabilidade visando os melhores interesses do Cliente. Quaisquer descontos ou comissões obtidos pelo Consultor durante essas atividades de aquisição reverterão em favor do Cliente.

b. O Consultor e seus Associados não poderão participar de certas atividades

21.1.3 O Consultor concorda que, durante a execução deste Contrato e após o seu encerramento, ele e qualquer de suas entidades associadas, bem como quaisquer Subconsultores e as entidades afiliadas a esses subconsultores, estarão desqualificados para o fornecimento de bens, obras e serviços resultantes ou diretamente relacionados aos Serviços de Consultoria prestados na preparação ou implementação do projeto, salvo disposição em contrário.

c.	**Proibição de Atividades Conflitantes**	21.1.4 O Consultor não deverá se envolver e não levará os seus Especialistas, bem como os seus Subconsultores a participar direta ou indiretamente de atividade comercial ou profissional que possa conflitar com as tarefas que lhes foram atribuídas de acordo com o Contrato.
d.	**Dever restrito de divulgar atividades conflitantes**	21.1.5 O Consultor tem a obrigação e deverá garantir que Especialistas e Subconsultores também tenham a obrigação de divulgar qualquer situação de conflito real ou potencial que impacte sua capacidade de servir aos melhores interesses do seu Cliente ou que possa ser interpretada como tal. A não divulgação dessas situações pode levar à desqualificação do Consultor ou à rescisão do seu Contrato.

22. Confidencialidade

22.1 Exceto mediante consentimento prévio por escrito do Cliente, o Consultor e os seus Especialistas nunca poderão revelar a qualquer pessoa ou entidade qualquer informação confidencial obtida durante a execução dos Serviços nem tornar públicas as recomendações formuladas ao longo ou resultantes dos Serviços.

23. Responsabilidade do Consultor

23.1 Sujeita a disposições adicionais, se houver, definidas nas **CE**, a responsabilidade do Consultor prevista neste Contrato será determinada pela Legislação Aplicável.

24. Seguro a ser obtido pelo Consultor

24.1 O Consultor (i) contratará e manterá, e fará com que os Subconsultores contratem e mantenham, às suas próprias expensas (ou dos Subconsultores, conforme o caso), nos termos e condições aprovados pelo Cliente, um seguro contra riscos e com as coberturas especificadas nas **CE**, e (ii) a pedido do Cliente, fornecerá as comprovações necessárias da obtenção e manutenção do seguro, assim como do pagamento dos prêmios vigentes. O Consultor deverá garantir que esse seguro está em vigor antes do início dos Serviços, conforme definido na Cláusula CG 13.

25. Contas, Inspeção e Auditoria

25.1 O Consultor deverá manter e envidar todos os esforços possíveis para assegurar que seus Subconsultores mantenham contas e registros precisos e sistemáticos em relação aos Serviços e em tal forma e detalhes que identifiquem claramente as mudanças de data e de custos pertinentes.

25.2 O Consultor deverá permitir e incentivar que seus Subconsultores permitam, que o Banco e/ou pessoas indicadas pelo Banco inspecione o local e/ou todas as suas contas e registros referentes à execução do Contrato e ao envio da Proposta para o fornecimento dos Serviços e submeta tais contas e registros à auditoria por auditores indicados pelo Banco se este assim o exigir. O Consultor deve dar a devida atenção à Cláusula CG 10 que dispõe, *inter alia*, que atos que objetivem impedir concretamente o exercício dos direitos de inspeção e auditoria do Banco, nos termos da Cláusula CG 25.2 constituem uma prática proibida sujeita à rescisão contratual (bem como à

determinação de inelegibilidade de acordo com os procedimentos de sanções do Banco).

26. Obrigações de apresentar relatórios

26.1 O Consultor deverá apresentar ao Cliente os relatórios e documentos indicados no **Apêndice A** deste Contrato na forma, quantidade e prazos fixados no referido Apêndice.

27. Direitos de propriedade do Cliente nos relatórios e registros

27.1 A menos que seja indicado de outro modo nas **CE**, todos os relatórios e dados relevantes, bem como informações como mapas, diagramas, planos, bancos de dados, outros documentos e *software*, registros de apoio ou materiais compilados ou preparados pelo Consultor para o Cliente durante o Serviço deverão ser confidenciais e tornar-se propriedade absoluta do Cliente. O Consultor deverá, no máximo na rescisão ou expiração deste Contrato, entregar todos esses documentos ao Cliente, juntamente com um inventário detalhado desses documentos. O Consultor poderá reter uma cópia desses documentos, dados e/ou software, mas não deverá usá-la para fins que não estejam relacionados a este Contrato sem aprovação prévia por escrito do Cliente.

27.2 Se forem necessários ou apropriados acordos de licença entre o Consultor e terceiros para fins de desenvolvimento dos planos, desenhos, especificações, projetos, bancos de dados, outros documentos e *software*, o Consultor deverá obter a aprovação prévia por escrito do Cliente para esses acordos e o Cliente terá o direito, a seu critério, de exigir a recuperação das despesas relativas ao desenvolvimento do(s) programa(s) em questão. Outras restrições sobre o uso futuro desses documentos e software, se houver, serão especificados nas **CE**.

28. Equipamentos, Veículos e Materiais

28.1 Equipamentos, veículos e materiais colocados à disposição do Consultor pelo Cliente, ou adquiridos pelo Consultor com recursos integrais ou parciais fornecidos pelo Cliente serão de propriedade do Cliente e deverão ser identificados de modo adequado. Quando da rescisão ou encerramento deste Contrato, o Consultor apresentará ao Cliente o inventário dos referidos equipamentos, veículos e materiais, e os entregará de acordo com as suas instruções. Enquanto estiver de posse dos equipamentos, veículos e materiais, o Consultor deverá providenciar o seguro desses itens, às expensas do Cliente, no valor equivalente à sua total substituição, salvo determinação em contrário e por escrito do Cliente.

28.2 Qualquer equipamento ou material trazido para o País do Cliente pelo Consultor ou seus Especialistas tanto para uso pessoal ou no projeto, permanecerá de propriedade do Consultor ou dos Especialistas, conforme aplicável.

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47817859) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 107

D. Especialistas do Consultor e Subconsultores

29. Descrição de Especialistas principais

29.1 Os cargos, as funções, as qualificações mínimas e a carga de trabalho de cada um dos Especialistas Principais do Consultor, estimados para execução dos serviços, estão descritos no Apêndice B.

30. Substituição Especialistas Principais

30.1 Exceto quando o Cliente estabelecer de outro modo, não serão admitidas alterações nos Especialistas Principais.

30.2 Se, por qualquer motivo fora do controle razoável do Consultor, como morte ou doença, entre outras, for necessário substituir qualquer Especialista Principal, o Consultor deverá apresentar solicitação por escrito. Nesse caso, o Consultor deverá apresentar imediatamente como substituto outro profissional com qualificação equivalente ou superior e com a mesma faixa de remuneração.

31. Remoção de Especialistas ou Subconsultores

31.1 Se o Cliente descobrir que algum dos Especialistas ou Subconsultores incorreu em conduta indevida ou foi acusado de ter cometido um ato criminoso, ou se o Cliente determinar que o Especialista ou Subconsultor do Consultor se envolveu em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas durante a execução dos Serviços, o Consultor deverá, por solicitação por escrito do Cliente, providenciar um substituto.

31.2 Caso algum Especialista Principal, Especialista de Apoio ou Subconsultor seja considerado pelo Cliente como incompetente ou incapaz no cumprimento das tarefas atribuídas, o Cliente, especificando os motivos correspondentes, pode solicitar que o Consultor providencie um substituto.

31.3 Os substitutos dos Especialistas ou Subconsultores removidos deverão ter melhores qualificações e experiência e serem aceitáveis para o Cliente.

31.4 O Consultor deverá arcar com todos os custos oriundos ou relativos a qualquer remoção e/ou substituição de tais Especialistas.

E. Obrigações do Cliente

32. Assistência e Isenções

32.1 A menos que especificado de outra forma nas **CE**, o Cliente deverá envidar todos os seus esforços para:

a. Auxiliar o Consultor na obtenção dos vistos de trabalho e outros documentos necessários para permitir que o Consultor preste os Serviços.
b. Auxiliar o Consultor na pronta obtenção, para que os Especialistas e, se for apropriado, os seus dependentes elegíveis recebam prontamente todos os vistos de entrada e

saída, de residência e licença para efetuar câmbio, bem como quaisquer outros documentos necessários à sua estadia no país do Cliente enquanto executam os Serviços previstos neste Contrato.

c. Facilitar a pronta liberação pela alfândega de qualquer bem necessário aos Serviços e dos objetos pessoais dos Especialistas e de seus dependentes elegíveis.
d. Fornecer aos funcionários, agentes e representantes do Governo todas as instruções e informações necessárias ou pertinentes à imediata e eficiente execução dos Serviços.
e. Isente o Consultor, a Equipe e quaisquer Subconsultores contratados pelo Consultor para executar os Serviços de qualquer exigência de registro ou licença referente ao exercício da profissão ou ao estabelecimento individual ou como entidade corporativa no país do Cliente de acordo com a Legislação Aplicável daquele país.
f. Conceder ao Consultor, a qualquer Subconsultor ou às Equipes de ambos, o privilégio, de acordo com a Legislação Aplicável no país do Cliente, de trazer para o país do Cliente valores razoáveis em moeda estrangeira para a finalidade dos Serviços ou para seu uso pessoal, bem como de retirar quaisquer montantes ganhos pela Equipe na execução dos Serviços.
g. Fornecer ao Consultor qualquer outra assistência prevista nas **CE**.

33. Acesso ao Local do Projeto

33.1 O Cliente garante que o Consultor terá acesso livre e gratuito ao local do projeto, necessário à execução dos Serviços. O Cliente será responsável por quaisquer danos a esses lugares ou aos bens neles contidos, que sejam resultantes do referido acesso, e indenizará o Consultor e cada Especialista no que diz respeito à responsabilidade por tais danos, a menos que tenham sido causados por falta ou negligência do Consultor, de quaisquer Subconsultores ou dos Especialistas de ambos.

34. Mudança na Legislaçao Aplicável Relativa a Impostos e Taxas

34.1 Se, após a data deste Contrato, houver alguma alteração na legislação aplicável no país do Cliente com relação a impostos e direitos que aumente ou diminua o custo incorrido pelo Consultor na realização dos Serviços, a remuneração e as despesas reembolsáveis pagáveis de outro modo ao Consultor neste Contrato devem ser aumentadas ou diminuídas de modo adequado pelo acordo entre as Partes neste instrumento, e os ajustes correspondentes deverão ser feitos para o valor do preço do Contrato especificado na Cláusula CG 38.1.

35. Serviços, instalações e bens do Cliente

35.1 O Cliente colocará à disposição do Consultor e da Equipe, para a finalidade dos Serviços a serem realizados e livres de qualquer encargo, os serviços, as instalações e os bens descritos nos Termos de Referência (**Apêndice A**), durante os períodos e no modo especificados no **Apêndice A.**

36. Equipe de Contrapartida

36.1 Se for especificado no **Apêndice A** deste Contrato, o Cliente deverá colocar à disposição do Consultor, gratuitamente, os profissionais e a equipe de apoio de contrapartida, que será designada pelo Cliente com a assessoria do Consultor.

36.2 As equipes de profissionais e de apoio de contrapartida, excluídos os funcionários de ligação do Cliente, deverão trabalhar sob a orientação exclusiva do Consultor. Se qualquer membro da equipe de contrapartida não executar de modo adequado qualquer tarefa compatível com o seu cargo, que lhe seja atribuída pelo Consultor, este poderá solicitar a sua substituição e o Cliente não deverá se negar sem razão a tomar as providências necessárias para atender a esse pedido.

37. Obrigação de pagamento

37.1 Em consideração aos Serviços realizados pelo Consultor neste Contrato, o Cliente deve efetuar tais pagamentos ao Consultor pelos produtos especificados no **Apêndice A** e da forma descrita pela cláusula CGC F a seguir.

F. Pagamentos ao Consultor

38. Preço do Contrato

38.1 O preço do Contrato é fixo e está determinado na **CE.** A discriminação do preço do Contrato é fornecida no **Apêndice C**.

38.2 Qualquer mudança no preço do Contrato especificado na Cláusula 38.1 só pode ser feita se as Partes tiverem concordado com o escopo revisado dos Serviços de acordo com a Cláusula CG 16 e modificado por escrito os Termos de Referência no **Apêndice A**.

39. Impostos e Direitos

39.1 O Consultor, os Subconsultores e os Especialistas são responsáveis por cumprir todas as obrigações fiscais decorrentes do Contrato, exceto quando definido de outro modo na **CE.**

39.2 Como exceção para o estabelecido acima e o definido na **CE,** todos os impostos indiretos locais identificáveis (detalhados e finalizados nas negociações do Contrato) são reembolsados ao Consultor ou pagos pelo Cliente em nome do Consultor.

40. Moeda de Pagamento

40.1 Todos os pagamentos previstos neste Contrato deverão ser feitos nas moedas do Contrato.

41. Forma de Cobrança e de Pagamento

41.1 O total de pagamentos no âmbito deste Contrato não deverá exceder o preço do Contrato especificado na Cláusula CEC 38.1.

41.2 Os pagamentos previstos neste Contrato deverão ser feitos em prestações de preço global relativas aos produtos especificados no **Apêndice**

A. Os pagamentos serão feitos de acordo com o cronograma de pagamentos estabelecido nas **CE**.

41.2.1 *Adiantamento:* A menos que seja indicado de outro modo nas **CE**, será efetuado um pagamento antecipado mediante uma garantia bancária para pagamento antecipado aceitável para o Cliente com valor (ou valores) e na moeda (ou moedas) especificados nas **CE**. Essa garantia (i) deverá permanecer válida até que o adiantamento tenha sido totalmente compensado e (ii) deverá ocorrer na forma definida no **Apêndice D**, ou em qualquer outra forma aprovado por escrito pelo Cliente. Os adiantamentos serão pagos pelo Cliente em parcelas iguais contra as prestações de preço global especificadas nas **CE** até que tais adiantamentos tenham sido totalmente pagos.

41.2.2 *Os Pagamentos das Parcelas de Preço Global.* O Cliente deverá pagar ao Consultor no prazo de sessenta (60) dias após o recebimento, por parte do Cliente, dos produtos e da fatura para o respectivo pagamento da parcela de preço global. O pagamento pode ser retido se o Cliente não aprovar os produtos enviados como satisfatórios e, nesse caso, o Cliente deverá fornecer comentários para o Consultor dentro do mesmo período de sessenta (60) dias. O Consultor deverá imediatamente fazer as correções necessárias e, em seguida, o processo deverá ser repetido.

41.2.3 *O Pagamento Final*. O pagamento final previsto nesta Cláusula deverá ser feito somente depois que o relatório final l tiver sido enviado pelo Consultor e aprovado como satisfatório pelo Cliente. Os Serviços deverão então ser considerados concluídos e finalmente aceitos pelo Cliente. A última parcela do preço global será considerada aprovada para pagamento pelo Cliente no prazo de noventa (90) dias corridos após o recebimento do relatório final pelo Cliente, a menos que ele, nesse período de noventa (90) dias corridos, envie um aviso por escrito ao Consultor especificando em detalhes as deficiências nos Serviços, o relatório final. O Consultor deverá imediatamente fazer as correções necessárias e, em seguida, o processo deverá ser repetido.

41.2.4 Todos os pagamentos neste Contrato devem ser efetuados nas contas do Consultor especificadas nas **CE**.

41.2.5 Com exceção do pagamento final descrito em 41.2.3 acima, os pagamentos não representam a aceitação de todos os Serviços nem eximem o Consultor de quaisquer obrigações aqui descritas.

42. Juros sobre Pagamentos Atrasados

42.1 Se o Cliente tiver pagamentos atrasados com mais de quinze (15) dias após a data de vencimento definida na Cláusula CG 41.2.2, deverão ser

pagos juros ao Consultor sobre qualquer montante devido, e não pago, em tal data de vencimento para cada dia de atraso na taxa anual definida nas **CE.**

G. Equidade e Boa-Fé

43. Boa-Fé

43.1 As Partes comprometem-se a agir de boa-fé com relação aos direitos das duas Partes neste Contrato e a adotar todas as medidas razoáveis para garantir a realização dos objetivos deste Contrato.

H. Resolução de Conflitos

44. Solução Amigável

44.1 As Partes devem procurar resolver qualquer controvérsia de forma amigável por meio de consulta mútua.

44.2 Se uma Parte não concordar com qualquer ação ou inação da outra Parte, aquela que tenha discordado poderá apresentar por escrito à outra Parte uma Notificação de Controvérsia, detalhando as razões do conflito. A Parte que receber a Notificação da Controvérsia a levará em consideração e responderá por escrito até 14 (quatorze) dias após o recebimento. Se essa Parte não responder até quatorze (14) dias, ou se a controvérsia não puder ser resolvida de forma amigável até quatorze (14) dias após a resposta da Parte, a Cláusula CG 49.1 deverá ser aplicada.

45. Solução de controvérsias

45.1 Qualquer conflito resultante deste Contrato, que não possa ser solucionado de forma amigável pelas Partes, será submetido a processo judicial/arbitral de acordo com as disposições especificadas nas **CE.**

II. Condições Gerais

Anexo 1: Política do Banco Mundial - Práticas Corruptas e Fraudulentas

(o texto neste Anexo 1 não deve ser modificado)

"Fraude e Corrupção

1.23 É a política do Banco exigir de todos os Mutuários (inclusive dos beneficiários de empréstimos do Banco), consultores e seus agentes (sejam eles declarados ou não), subcontratados, subconsultores, prestadores de serviço e fornecedores, além de todo funcionário a eles vinculado, que mantenham os mais elevados padrões de ética durante a seleção e execução de contratos financiados pelo Banco[1]. De acordo com essa política, o Banco:

(a) define, para fins dessa disposição, as expressões abaixo da seguinte forma:

(i) "prática corrupta" significa oferecer, entregar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor com a intenção de influenciar indevidamente as ações de terceiros[2];

(ii) "prática fraudulenta" significa qualquer ato, falsificação ou omissão de fatos que, de forma intencional ou irresponsável, induza ou tente induzir uma parte a erro, para obter benefício financeiro ou de qualquer outra ordem, ou com a intenção de evitar o cumprimento de uma obrigação;[3];

(iii) "prática colusiva" significa uma combinação entre duas ou mais partes visando alcançar um objetivo indevido, inclusive influenciar indevidamente as ações de outra parte;[4];

(iv) "prática coercitiva" significa prejudicar ou causar dano ou ameaçar prejudicar ou causar dano, direta ou indiretamente, qualquer parte ou a sua propriedade para influenciar indevidamente as ações de uma Parte[5];

---

[1]Nesse contexto, será imprópria qualquer ação realizada por um consultor ou por qualquer dos seus funcionários, seus agentes ou seus subconsultores, subempreiteiros, prestadores de serviço, fornecedores e/ou seus empregados, no intuito de influenciar o processo de seleção ou a execução do contrato para obter uma vantagem indevida é imprópria.

[2] Para a finalidade deste subparágrafo, "terceiros" refere-se a um funcionário público que atue no processo de seleção ou na execução do contrato. Neste contexto, "funcionário público" inclui a equipe do Banco Mundial e os funcionários de outras organizações que examinam ou tomam decisões sobre a seleção.

[3] Para a finalidade deste subparágrafo, "Parte" refere-se a um funcionário público; os termos "benefício" e "obrigação" são relativos ao processo de seleção ou à execução do contrato; e "ato ou omissão" tem como objetivo influenciar o processo de seleção ou a execução do contrato.

[4] Para os fins deste parágrafo, "parte" refere-se aos participantes do processo de aquisição ou seleção (inclusive funcionários públicos) que tentam por si mesmos ou por intermédio de outra pessoa ou entidade que não participe do processo de aquisição ou seleção simular a concorrência ou estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos ou ter acesso as propostas financeiras e outras condições.

[5] Para a finalidade deste subparágrafo, "parte" refere-se a um participante do processo de seleção ou da execução do contrato.

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47817859) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 113

(v) "prática obstrutiva" significa

(aa) deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigações ou fazer declarações falsas a investigadores, com o objetivo de impedir materialmente uma investigação do Banco de alegações de prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameaçar, perseguir ou intimidar qualquer parte interessada, para impedi-la de mostrar seu conhecimento sobre assuntos relevantes à investigação ou ao seu prosseguimento, ou

(bb) atos que tenham como objetivo impedir materialmente o exercício dos direitos do Banco de promover inspeção e auditoria;

(b) rejeitará a recomendação de outorga se determinar que o consultor recomendado para a outorga do contrato, ou algum membro da sua equipe, seus agentes ou seus subconsultores, subempreiteiros, prestadores de serviço, fornecedores e/ou algum empregado destes se envolveu, de forma direta ou indireta, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao concorrer para o contrato em questão;

(c) declarará viciado o processo de seleção e cancelará a parte do Empréstimo alocado para um contrato se, a qualquer momento, concluir que os representantes do Mutuário ou de um beneficiário do Empréstimo se envolveram em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas, durante o processo de seleção ou de execução do contrato em questão, sem que o Mutuário tenha adotado medidas oportunas e adequadas, satisfatórias ao Banco, para resolver essas práticas quando ela ocorrer, inclusive ao não informar ao Banco de modo oportuno no momento que tomou conhecimentos dessas práticas;

(d) sancionará uma firma ou pessoa física a qualquer tempo, de acordo com procedimentos vigentes de sanções do Banco[6], inclusive declarando-a inelegível indefinidamente ou por prazo determinado para: (i) a outorga de um contrato financiado pelo Banco, e (ii) ser designado[7] como subconsultor, consultor, fabricante, fornecedor ou prestador de serviços de uma outra firma elegível a quem tenha sido outorgado um contrato financiado pelo Banco.

---

[6] Uma firma ou uma pessoa física pode ser declarada inelegível para outorga de um contrato financiado pelo Banco após (i) a conclusão do processo de sanções do Banco, conforme seus procedimentos de sanções, incluindo nomeadamente: impedimento cruzado, conforme acordado com outras Instituições Financeiras Internacionais, incluindo Bancos Multilaterais de Desenvolvimento e procedimentos de sanções por fraude e corrupção e (ii) em conseqüência de suspensão temporária ou suspensão temporária preventiva relacionada a procedimento de sanções em andamento. Ver nota de rodapé 12 e parágrafo 8 do Apêndice 1 das Diretrizes de Consultores, datadas de janeiro de 2011.

[7] Um subconsultor, fornecedor, ou prestador de serviços designado é qualquer que (i) foi incluído pelo consultor na sua proposta porque traz experiência específica e conhecimentos específicos ou cruciais que são considerados na avaliação técnica da proposta do consultor para os serviços em questão; ou (ii) designado pelo Mutuário.

III. Condições Especiais do Contrato

[As notas em colchetes são para fins de orientação apenas e devem ser excluídas no texto final do contrato assinado.]

Número da Cláusula CG	Emendas, Suplementos e Cláusulas nas Condições Gerais de Contrato
1.1(b) e 3.1	**O Contrato deve ser interpretado de acordo com a lei do(a)** Brasil
4.1	**O idioma é: português**.
6.1 e 6.2	**Os endereços são:** Cliente: *Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa – ADETUC* A/C de: Lorena Christie Ribeiro de Santana Fax: +55 63 3218-5802 E-mail (onde permitido: pesquisa@adtur.to.gov.br Consultor:_ ***Consórcio Iber-Geo Consulting/Mcrit, S.L/Meridiano Zero, S.L*** A/C de: Judith Muntal Fax::+55 34 609230142 E-mail (onde permitido): jmuntal@ibergeo.com
8.1	**O Membro Lider** em nome do ***Consórcio Iber-Geo Consulting*** com sede na Rua Guardia, 12, Irla B 08001, Barcelona, Espanha CIF N° B-61463188 e CNPJ como empresa domiciliada no exterior sob n° 26.485.154/0001-04, neste ato representado

	pelo seu procurador Sr. Marcelo Marcos da Silva Fonseca, brasileiro, casado, contador, RG 18.606.068-3 SSP/SP e CPF/MF 28.072.088-35
9.1	**Os Representantes Autorizados são:** **Para o Cliente:** Lorena Christie Ribeiro de Santana – Gerente de Pesquisa e Informações Turísticas **Para o Consultor:** Judith Muntal - Representante legal do Consórcio.
11.1	**As condições de vigência são as seguintes**: A partir da emissão da ordem de início dos serviços.
12.1	**Rescisão do Contrato por Não Entrar em Vigor:** **O período deve ser de 90 (noventa) dias.**
13.1	**Início dos Serviços:** **A partir da emissão da ordem de início de serviços.** Confirmação da disponibilidade dos Especialistas Principais para iniciar o Serviço deve ser enviada ao Cliente por escrito, na forma de Declaração assinada por cada Especialista Principal.
14.1	**Término do Contrato:** **O período deve ser 180 (cento e oitenta) dias**
21 b.	**O Cliente se reserva o direito de determinar caso a caso se o Consultor deve ser desqualificado do fornecimento de bens, obras ou serviços de não consultoria devido a um conflito de uma natureza descrita na Cláusula CG 21.1.3.** Sim_____ Não _____
23.1	**Nenhuma disposição adicional.** *[OU:* A seguinte limitação da Responsabilidade do Consultor em relação ao Cliente pode estar sujeita às negociações do Contrato:

"Limitação da Responsabilidade do Consultor em relação ao Cliente:

(a) **Exceto no caso de falta grave ou dolo por parte do consultor ou de qualquer pessoa ou empresa em nome do Consultor na realização dos Serviços, o Consultor, em relação ao dano causado por ele ao bem do Cliente, não será responsabilizado em relação ao Cliente:**

(i) **por quaisquer danos indiretos ou emergentes ou prejuízos especulativos; e**

(ii) por quaisquer perdas ou danos diretos que excedam [inserir um multiplicador, por exemplo, uma, duas, três] vezes o valor total do Contrato;

(b) Esta limitação de responsabilidade não deverá:

(i) afetar a responsabilidade do Consultor, se houver, por danos a terceiros causados pelo Consultor ou por qualquer pessoa ou empresa em nome do Consultor na execução dos Serviços;

(ii) ser interpretada como uma disposição que proporcione ao Consultor qualquer limitação ou exclusão de responsabilidade, o que é proibido pelas diretrizes do Banco Mundial, Lei 8666/93 e Lei 4.320/64.

[Notas para o Cliente e o Consultor: Quaisquer sugestões feitas pelo Consultor na Proposta para apresentar exclusões/limitações de responsabilidade do Consultor nos termos do Contrato deverão ser cuidadosamente analisadas pelo Cliente e discutidas com o Banco antes de aceitar quaisquer alterações no que foi incluído na SDP enviada. Nesse contexto, as Partes devem ficar cientes de que a política do Banco Mundial sobre esse assunto é a seguinte:

Para ser aceitável para o Banco Mundial, qualquer limitação da responsabilidade do Consultor deve pelo menos estar consideravelmente associada (a) ao dano que o Consultor pode potencialmente causar ao Cliente, e (b) à capacidade do Consultor de pagar uma indenização usando seus próprios ativos e uma cobertura de seguro que possa ser obtida de forma razoável. A responsabilidade do Consultor não deve ser limitada a menos do que um multiplicador do total de pagamentos ao Consultor no Contrato para fins de remuneração e despesas de reembolso. Uma declaração no sentido de que o Consultor é responsável apenas pela nova execução dos Serviços com problemas não é aceitável para o Banco Mundial. Além disso, a responsabilidade do Consultor nunca deve ser limitada pelas perdas ou danos causados por falta grave ou dolo por parte do Consultor.

O Banco Mundial não aceita uma disposição no sentido de que o Cliente deverá indenizar e isentar de responsabilidade o Consultor contra reclamações de Terceiros, exceto, logicamente, quando uma reclamação for decorrente de perdas ou danos causados por um ato de inadimplemento ou ato indevido por parte do Cliente até onde possível pela legislação aplicável no país do Cliente.]

24.1	**A cobertura de seguro contra os riscos deve ser feita como a seguir:** **(a) Seguro de responsabilidade profissional, com cobertura mínima de** 268.812,50 EUR (duzentos e sessenta e oito mil, oitocentos e doze euros e cinquenta cêntimos).
27.1	Nenhuma disposição adicional
27.2	**O Consultor não deve usar esses documentos e software para finalidades não relacionadas a este contrato sem a prévia autorização por escrito do cliente.** **O Cliente não deve usar esses documentos e software para finalidades não relacionadas a este Contrato sem a prévia aprovação por escrito do Consultor.** **Nenhuma das Partes deve usar esses documentos e software para finalidades não relacionadas a este Contrato sem a prévia aprovação por escrito da outra Parte.**
32.1 **(a) até (e)**	Nenhuma disposição adicional
32.1(f)	Não se aplica
38.1	**O preço do Contrato é:** 268.812,50 EUR (duzentos e sessenta e oito mil, oitocentos e doze euros e cinquenta cêntimos). **Quaisquer impostos locais indiretos passíveis de cobrança em relação a este Contrato para os Serviços fornecidos pelo Consultor devem reembolsados pelo Cliente o Consultor.** **O montante de tais impostos é** 53.762,50 EUR (cinquenta e três mil, setecentos e sessenta e dois euros e cinquenta cêntimos).
39.1 e 39.2	**O Cliente reembolsará o Consultor, os Subconsultores e os Especialistas, quaisquer impostos indiretos, encargos, taxas, tributos e outras imposições aplicadas ao Consultor, aos Subconsultores e Especialistas nos termos da legislação aplicável na legislação do país do Cliente em relação a:** **(a) quaisquer pagamentos efetuados ao Consultor, Subconsultores e Especialistas (exceto nacionais ou residentes permanentes do país do Cliente), juntamente com a realização dos Serviços;**

(b) **quaisquer equipamentos, materiais e suprimentos trazidos para o país do Cliente pelo Consultor ou Subconsultores com o objetivo de realizar os Serviços e que, após terem sido trazidos para tais territórios, serão mais tarde retirados por eles;**

(c) **quaisquer equipamentos importados, com o objetivo de realizar os Serviços e pagos com os recursos financeiros fornecidos pelo Cliente e que são tratados como bens do Cliente;**

(d) **quaisquer bens trazidos para o país do Cliente pelo Consultor, quaisquer Subconsultores ou Especialistas (exceto nacionais ou residentes permanentes do país do Cliente), ou pelos dependentes legais daqueles Especialistas para seu uso pessoal e que serão posteriormente retirados por eles ao partirem do país do Cliente, desde que:**

(i) o Consultor, Subconsultores e Especialistas cumpram os procedimentos normais de alfândega do país do Cliente na importação de bens para o país do Cliente; e

(ii) se o Consultor, Subconsultores ou Especialistas não retirarem, mas descartarem quaisquer bens no país do Cliente que tenham sido beneficiados com isenção de impostos e direitos aduaneiros, o Consultor, Subconsultores ou Especialistas, conforme o caso, (a) assumirão os impostos e direitos aduaneiros de acordo com as regulamentações do país do Cliente, ou (b) reembolsarão o Cliente caso este os tenha pagado no momento em que os bens em questão foram trazidos para o país do Cliente.

41.2 **O cronograma de pagamento:**

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E DESEMBOLSO			
Produtos	Descrição	Prazo (acumulativo)	Desembolso
	➢ Revisão e Ajustes do Plano de Trabalho	02 dias	---
PRODUTO 01 - MODELO DE GOVERNANÇA	➢ Definição do modelo de governança e elaboração do planejamento estratégico e operacional do observatório de turismo do estado do	29 dias	30%

	PRODUTO 02 – ESTUDOS E PESQUISAS	➢ Realização de estudos e pesquisas e elaboração do Boletim de Desempenho Econômico do Turismo no Estado do Tocantins	59 dias	30%
	PRODUTO 03 – CAPACITAÇÃO EM ESTATÍSTICA, PLANEJAMENTO E METODOLOGIAS PARA OPERAÇÃO DE PESQUISAS E INDICADORES DE TURISMO	➢ Capacitação em planejamento e metodologias de operação e análise em estudos, pesquisas e indicadores de turismo.	112 dias	30%
	RELATÓRIOS PRELIMINARES E FINAL	➢ Versão final - Elaboração de Relatórios e Apresentação dos produtos anteriores 01, 02, 03.	120 dias	10%
41.2.1	Não será efetuado nenhum pagamento antecipado.			
41.2.4	**As contas são:** **1) IBER-GEO CONSULTING, S.LU. (54%)** CIF nº B-61463188 CNPJ: 26.485.154/0001-04 Dados bancários: Banco: BANC DE SABADELL (SWIFT: BSABESBB) IBAN: ES46 0081 0205 5400 0138 2343 **2) MERIDIANO ZERO MARKETING, S.L. (29%)** CIF sob nº B31917149 Dados bancários: Banco: BANKINTER IBAN: ES63 0128 3431 8101 0000 1203 **3) MULTICRITERIA-MCRIT, A.I.E (17%)** CIF nº B58677428 Dados bancários: Banco: CAIXABANK IBAN: ES59 2100 4434 8602 0000 4881			

42.1	**A taxa de juros é**: 6%a.m
45.1	*[Em contratos com consultores estrangeiros, o Banco Mundial requer que seja usada a arbitragem comercial internacional em um local neutro.]* **As controvérsias serão resolvidas por arbitragem de acordo com as seguintes disposições:** 1. Seleção de Árbitros. Cada controvérsia enviada por uma Parte à arbitragem deve ser ouvida por um único árbitro ou por um painel de arbitragem composto de três (3) árbitros, de acordo com as seguintes disposições: (a) Quando as Partes concordarem que o objeto da disputa refere-se a um assunto técnico, poderão ajustar a indicação de um só árbitro ou, caso não haja consenso sobre a identidade deste até 30 (trinta) dias depois que a outra Parte tiver recebido a proposta de um nome pela Parte que iniciou o processo, qualquer das Partes poderá solicitar *à(ao) Federação Internacional de Engenheiros Consultores (FIDIC) de Lousanne, Suiça uma relação com cinco candidatos no mínimo* e, uma vez recebida essa lista, as Partes eliminarão alternadamente os nomes nela contidos até restar apenas um, que será o do único árbitro responsável pela solução do conflito. Caso o último candidato não tenha sido selecionado dessa maneira no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de recebimento da lista, à*Federação Internacional de Engenheiros Consultores (FIDIC) de Lousanne, Suiça* apontará, por solicitação de qualquer uma das Partes, um único árbitro para resolver tal disputa, com base na lista apresentada ou de outro modo (b) Quando as Partes não concordarem que a disputa refere-se a uma questão técnica, o Cliente e o Consultor indicarão separadamente um árbitro, e esses dois árbitros designarão um terceiro árbitro que presidirá o tribunal de arbitragem. Se os árbitros indicados pelas Partes não obtiverem sucesso na escolha de um terceiro árbitro no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data da designação do último dos dois árbitros, a pedido de qualquer das Partes, o terceiro árbitro será indicado pelo *Secretário da Corte Permanente de Arbitragem de Haia.*(c) Se, em uma disputa sujeita à Cláusula CE 8.2.1 (b), uma Parte não indicar um árbitro no prazo de 30 (trinta) dias após a outra Parte ter designado o outro árbitro, a Parte que fez a designação poderá solicitar [ao] [à] *Secretário da Corte Permanente de Arbitragem de Haia*. que aponte um único árbitro, a quem caberá solucionar a disputa.

	2. Normas de procedimento. Exceto conforme estabelecido neste Contrato, o processo de arbitragem será conduzido de acordo com as normas para essa finalidade estabelecidas pela Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional (UNCITRAL), que estejam em vigor na data deste Contrato. 3. Substituição de árbitros. Se, por qualquer razão, um árbitro não puder desempenhar suas funções, será apontado um substituto da mesma forma adotada para indicação do árbitro original. 4. Nacionalidade e Qualificações de Árbitros. O árbitro único ou o terceiro árbitro indicado de acordo com os parágrafos 1(a) até 1(c) acima, deverá ser um especialista em questões jurídicas ou técnicas internacionalmente reconhecido e com vasta experiência na matéria em disputa, não podendo ser natural do país de origem do Consultor *[Se o Consultor consistir em mais de uma entidade, acrescente:* nem do país de origem de nenhum de seus Membros ou Partes*]* nem do país do Governo. Para a finalidade desta Cláusula, "país de origem" significa: (a) o país de incorporação do Consultor *[Se o Consultor consistir em mais de uma entidade, acrescente:* ou de qualquer de seus Membros ou Partes*]*; ou (b) o país onde está situado o local de negócios principal do Consultor [ou de qualquer dos seus Membros ou Partes]; ou (c) o país de nacionalidade da maioria dos acionistas do Consultor [ou de qualquer dos seus Membros ou Partes]; ou (d) o país de nacionalidade dos Subconsultores envolvidos, quando a disputa se referir a um subcontrato.
	5. Disposições gerais. Em qualquer processo de arbitragem nos termos deste Contrato: (a) exceto quando as Partes acordarem de outra forma, esses procedimentos serão realizados em *Lousanne, Suíça.* (b) o idioma*português* será o idioma oficial para todos os fins; e (c) a decisão do único árbitro ou da maioria dos árbitros (ou do terceiro árbitro não havendo essa maioria) será final e obrigatória, aplicável por qualquer tribunal da jurisdição competente, renunciando as Partes, por meio deste instrumento, a qualquer objeção ou reivindicação de imunidade em relação ao cumprimento de tal decisão.

IV. Apêndices

APÊNDICE A - TERMOS DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO OBSERVATÓRIO DE TURISMO DO ESTADO DO TOCANTINS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO OBSERVATÓRIO DO TURISMO DO ESTADO DO TOCANTINS

1. INTRODUÇÃO

O Turismo vem se consolidando como atividade socioeconômica de significativa importância na economia mundial. Os dados referentes a 2014 confirmaram as expectativas otimistas da agência especializada de turismo das Nações Unidas a World Tourism Organization – UNWTO (Organização Mundial de Turismo – OMT), estimando-se que tenham sido alcançadas 1,138 bilhão de chegadas, ou seja, cerca de 51 milhões a mais do que em 2013 – o aumento de 4,7% é bem mais elevado do que o projetado pela UNWTO para o período 2010/2020 (+3,8%), valendo destacar que 2014 bateu um novo recorde em termos de chegadas internacionais de turistas, superando a marca de 1,1 bilhão.

Segundo a Braztoa (Associação Brasileira de Operadoras de Turismo) embarcaram 5,12 milhões de passageiros durante todo o ano, apontando um aumento, mesmo que tímido, em relação ao ano interior, impulsionado pelo crescimento da procura pelos destinos domésticos. No setor de distribuição de viagens de lazer, o turismo conseguiu passar por 2016 registrando aumento em faturamento, atingindo R$ 11,33 bilhões de movimentação financeira por parte das operadoras de turismo. A intensa movimentação do fluxo turístico doméstico e a valorização do dólar frente ao real, incentivando a atração de turistas internacionais, vêm possibilitando a estruturação e manutenção da oferta de produtos e serviços turísticos e gradativamente fortalecendo a atividade turística no País, o que evidencia a importância do mercado interno para a consolidação do turismo de forma sustentável.

A atração de demandas turísticas induzidas ou espontâneas, assim como investidores, empresas e serviços do setor turístico dependem cada vez mais da produção de informações relevantes, confiáveis, em tempo hábil e a custo condizente, atendendo aos requisitos operacionais, gerenciais e possibilitando a tomada de decisão.

Com vistas a avaliação e ao acompanhamento do fluxo turístico doméstico nacional e internacional no Estado do Tocantins, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura busca por meio desta consultoria implantar o Observatório de Turismo do Estado do Tocantins, com sede em Palmas – TO.

O Observatório do Turismo será de grande importância para produção de informações específicas sobre o fenômeno turístico no Estado do Tocantins, contribuindo com a coleta, tratamento, análise, geração e monitoramento de dados e informações turísticas, transformando-se num instrumento de suporte para o planejamento, a gestão e o monitoramento do turismo, subsidiando as decisões empresariais de investimentos e a formatação de políticas públicas sustentáveis voltadas para os destinos turísticos do Estado do Tocantins.

2. CONTEXTO DOS SERVIÇOS E ANTECEDENTES

O Governo do Estado do Tocantins negociou umcontrato de empréstimo (Nº 8185-0/BR) com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), para financiamento da execução do Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável do Tocantins (PDRIS).

A presente contratação de consultoria para Implantação do Observatório do Turismo do Estado do Tocantins tem como fonte financiadora o PDRIS que tem como executores a Secretaria do Planejamento e Orçamento (SEPLAN)a Agência Tocantinense de Transportes e Obras (AGETO), a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH), a Secretaria da Educação, Juventude e Esportes (SEDUC), a Secretaria da Agricultura, da Pecuária e do Desenvolvimento Agrário (SEAGRO) e o Instituto Natureza do Tocantins (NATURATINS). Em novembro de 2015, na Missão do BIRD a Revisão de Meio Termo do PDRIS a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura - SEDEN passou a integrar ao conjunto de entidades executoras do Acordo de Empréstimo Nº 8185-0/BR.

A coordenação geral do PDRIS está sob responsabilidade da Unidade de Gerenciamento do Projeto - UGP-PDRIS, por meio da Diretoria Geral de Assuntos Estratégicos da SEPLAN.

O Projeto tem por objetivo fomentar o melhoramento da eficácia do transporte rodoviário e a eficiência na seleção dos serviços públicos em apoio ao desenvolvimento integrado e territorialmente equilibrado do Estado, os objetivos serão atingidos com o apoio ao melhoramento da acessibilidade das populações, territórios e regiões produtivas aos trabalhos, serviços, recursos e mercados e o reforço institucional para contribuir na modernização da gestão do serviço público, reforço das atividades econômicas locais nos territórios, melhoria da gestão ambiental e nos serviços educacionais. O Projeto é constituído pelos seguintes componentes e seus respectivos subcomponentes:

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47817859) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 125

(1) O melhoramento da eficácia do transporte rural:

(i) *Melhoramento das condições de transporte nas redes municipais;*

(ii) *Rejuvenescimento e melhoramento da eficiência do gerenciamento da malha rodoviária estadual pavimentada através da implementação de contratos CREMA (Conservação, Restauração e Manutenção);*

(iii) *Melhoramento das condições de transporte na rede estadual e da segurança rodoviária nas estradas estaduais não pavimentadas;*

(iv) *Melhoramento da capacidade de planejamento e gerenciamento do transporte e da logística, incluindo nos seus aspectos de segurança, no Estado através de apoio institucional.*

(2) O melhoramento da eficiência e seleção dos serviços públicos:

(i) *Modernização da administração via a introdução de uma cultura de Gestão para Resultados, onde o Planejamento Estratégico é o pilar principal. Cada órgão deverá ter seu planejamento estratégico e o Mapa Estratégico alinhado às estratégias do governo;*

(ii) *Apoio ao desenvolvimento da produção local, principalmente por meio do desenvolvimento de projetos pilotos de capacitação, infraestrutura e cadeia de produção;*

(iii) *Melhoramento do gerenciamento ambiental e desenvolvimento rural em articulação com os outros componentes e o GEF, nas áreas do melhoramento do licenciamento, da proteção da biodiversidade e da gestão dos recursos hídricos;*

(iv) *Melhoramento da qualidade na educação via a implementação de sistemas de informação e gerenciamento, capacitação e apoio a populações frágeis.*

No Melhoramento da Eficiência dos Serviços Públicos Selecionados objetiva-se fomentar o desenvolvimento local com crescimento sustentável e melhorar os serviços públicos: (i) modernização da administração via a introdução de uma cultura de Gestão para Resultados, a descentralização e a otimização do uso da terra; (ii) apoio ao desenvolvimento da produção local, principalmente, através do desenvolvimento de projetos pilotos de capacitação, infraestrutura e cadeia de produção; (iii) melhoramento do gerenciamento ambiental e desenvolvimento rural em articulação com os outros componentes e o GEF nas áreas do melhoramento do licenciamento, da proteção da biodiversidade e da gestão dos recursos hídricos; e (iv) melhoramento da qualidade na educação via a implementação de sistemas de informação e gerenciamento, capacitação e apoio a populações frágeis.

3. ÁREA DE ABRANGÊNCIA

Para implantação do Observatório de Turismo do Estado do Tocantins Governo do Estado foi escolhida a capial Palmas, com sede na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura do Estado do Tocantins – SEDEN.

PALMAS:

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47817859) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 126

A cidade de Palmas está situada na região central do Estado e é a mais nova capital planejada do País, entre o Lago da UHE – Lajeado, com 680 km², e a Serra do Lajeado. Foi eleita como destino indutor de desenvolvimento do turismo pelo Ministério do Turismo. Conta com o Aeroporto Brigadeiro Lysias Rodrigues com capacidade de 370 mil pax/ano e atualmente tem uma média de embarque/desembarque 221 mil pax/ano. O principal potencial é o turismo de negócios e eventos além de receber os turistas com destino aos todos os polos turísticos do Estado.

4. DELIMITAÇÕES GERAIS DO OBJETO

O objeto de contratação deste Termo de Referência visa a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria visando à Implantação do Observatório do Turismo do Estado do Tocantins. A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura – SEDEN sediará o observatório em referência. Os serviços incluem a elaboração do modelo de governança e de estrutura organizacional do observatório do Observatório de Turismo do Estado do Tocantins, assim como o seu plano estratégico, operacional e de sustentabilidade orçamentária; a realização de estudos e pesquisas primárias e o levantamento e análise de informações e dados econômicos para elaboração do Boletim de Desempenho Econômico do Turismo no Estado do Tocantins, além de realização de capacitações para a equipe do observatório de turismo (permanente/colaboradores) em metodologias de planejamento, operações e análises de estudos e pesquisas sobre o setor turístico tocantinense.

O projeto do Observatório do Turismo do Tocantins foi concebido a partir do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável - PDITS, com a perspectiva de apoiar na implementação da Política Estadual de Turismo do Estado, por meio da elaboração e consolidação das estratégias de gestão pública do turismo estadual.

5. OBJETIVO GERAL

Conceber um arcabouço e metodologias de gestão e de governança, realizar capacitações, elaborar estudos, pesquisas e indicadores de turismo, assim como o planejamento estratégico e operacional para subsidiar a construção e implantação do Observatório do Turismo do Estado do Tocantins, com vistas a conformação de uma ferramenta de referência para o apoio às estratégias e aos processos de tomada de decisão, que possam reforçar as capacidades institucionais na gestão, nas estratégias e açoes de marketing e de comunicação das informações turísticas, assim como na formulação e monitoramento de políticas públicas e mobilização da iniciativa privada.

5.1 Objetivos Específicos

- Criaro modelo metodológico e o arcabouço de gestão e governança, assim como elaborar

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47817859) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 127

o planejamento estratégico e operacional do Observatório de Turismo do Estado do Tocantins;

- Elaborar o Boletim de Desempenho Econômico do Turismo no Estado do Tocantins por meio de estudos, pesquisas e levantamento e análises de dados e informações disponíveis;
- Realizar capacitações para transferência de conhecimento emmetodologias de planejamento, operações e análises de estudos e pesquisas do setor de turismo tocantinense.
- Definir indicadores qualitativos e quantitativos para gestão das atividades turísticas.

6. JUSTIFICATIVA

Com o panorama social marcado pela valorização do conhecimento, pela facilidade de acesso a informação e pelo aumento da competitividade, a tomada de decisões no direcionamento de esforços e no dimensionamento do investimento públicoou privado vem dependendo cada vez mais da disponibilidade de informações estratégicas e confiáveis.

Neste sentido o monitoramento de informações estratégicas e indicadores do segmento turístico de forma constante e consistente são imprescindíveis para promoção turística e para o aumento da qualidade e competitividade dos destinos, produtos e serviços turísticos ofertados no Estado do Tocantins.Os estudos e pesquisassão de grande utilidade para o desenvolvimento de políticas públicas para atração de fluxos turísticos nacionais e internacionais, assim como para a criação, atração e fixação de empreendimentos privados.

Dianteda escassez de informações a respeito do setor de turismo no Estado do Tocantins e a falta de dados confiáveis para avaliar a dimensão do impacto do turismo na economia estadual, e nas localidades receptoras de turistas, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura do Tocantins (SEDEN) objetiva implantar o Observatório de Turismo do Estado do Tocantins e iniciar a formação de uma base de dados socioeconômicos e setoriais capaz de fornecer informações sobre a situação histórica e atual do mercado turístico estadual.

7. ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DO OBSERVATÓRIO DE TURISMO DO ESTADO DO TOCANTINS

Deverão ser considerados, os seguintes aspectos quanto aos serviços, estrutura organizacional/operacional pelo Observatório de Turismo do Estado do Tocantins a partir da sua implantação, a saber:

7.1 Principais Serviços do Observatório de Turismo

- Geração de estudos e pesquisas primárias e secundárias sobre o mercado turístico local e regional;
- Monitoramento da matriz de indicadores qualitativos e quantitativos quanto ao desenvolvimento da atividade turística (avanço do setor) em nível local e regional, incluindo indicadores de impacto sociocultural, ambiental e econômico e de qualidade dos serviços turísticos;
- Subsidiar dados e informações para a tomada de decisão nos processos de elaboração, execução e monitoramento de políticas públicas e projetos estratégicos voltados para o desenvolvimento turístico estadual;
- Realização de capacitações, congressos, feiras e eventos afins;
- Gestão e divulgação de dados e Informações de apoio ao turista e ao empreendedor.

7.2 Estrutura Organizacional e Operacional

O Observatório de turismo terá como sede a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura – SEDEN, município de Palmas, onde serão alocados o Centro Operacional e o Banco de Dados do Observatório de Turismo. A proposta de estrutura organizacional do observatório de turismo deverá considerar a análise da estrutura organizacional /operacional existente pela SEDEN, incluindo a disponibilidade atual e futura de técnicos permanentes, temporários e colaboradores eventuais.

Sob responsabilidade da Diretoria de Planejamento e Projetos Estratégicos / Gerência de Pesquisa e Informação Turística, o Observatório de Turismo irá dispor para sua operacionalização de técnicos e gestores, eventuais colaboradores, lotados na Superintendência de Turismo da SEDEN e demais instituições. Na equipe permanente do Observatório de Turismo incialmente serão alocados profissionais com as seguintes formações: 04 bacharéis em Turismo, 01 bacharel em economia; 01 bacharel em comunicação social, 03 assistentes administrativos / pesquisadores.

7.3 Governança, Gestão e Manutenção

A sede da SEDEN (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura) foi selecionada para implantação do Observatório. Desta forma a manutenção das instalações físicas, equipamentos, recursos humanos e atividades operacionais do Observatório de Turismo serão de responsabilidade da SEDEN, por meio da **ação orçamentária nº 2084 - Implantação, Manutenção e Operacionalização do Observatório de Turismo do Estado do Tocantins,**prevista no PPA do Governo do Estado do Tocantins (2006-2019), aprovado pela Lei Estadual nº 3.051, de 21 de dezembro de 2015. A referida ação orçamentária está relacionada ao objetivo estratégico "Ampliar a Gestão e a Disponiblilização de Informações Turísticas" previsto na Agenda Estratégica do Governo do Tocantins - 2030, vinculada e priorizada no Mapa Estratégico do Estado. Este objetivo estratégico prevê metas para

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47817859) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 129

serem alcançadas até o ano de 2019, no âmbito da ação orçamentária nº 2084, tendo como indicador de monitoramento do PPA: "Índice de Estrtuturação do Observatório de Turismo do Estado do Tocantins".

O modelo de governança, gestão, operação do observatório deverá considerar e apresentar os aspectos legais, a sustentabilidade orçamentária e a estrutura necessária para criação e manutenção do observatório.

A criação, definição e implementação do modelo de gestão e governança do Observatório de Turismo do Estado do Tocantins será de responsabilidade da empresa contratada, assim como a elaboração do plano estrátégico e operacional do Observatório de Turismo do Estado do Tocantins.

8. PLANO DE TRABALHO

Antes de iniciar a execução dos serviços previstos nos produtos deste Termo de Referência a empresa contratada deverá realizar o planejamento da consultoria e apresentar plano de trabalho revisado.

Após aprovado o plano de trabalho revisado, pela equipe técnica responsável da SEDEN, a empresa deverá imediatamente executar os serviços planejados para entrega dos produtos previstos neste Termo de Referência.

9. PRODUTOS E SERVIÇOS ESPERADOS

A seguir são apresentadas os serviços previstos neste Termo de Referência, que incluem: a elaboração do modelo de governança e de estrutura organizacional do observatório do Observatório de Turismo do Estado do Tocantins, assim como o seu plano estratégico e operacional;o levantamento e análise de informações e dados econômicos para elaboração do Boletim de Desempenho Econômico do Turismo no Estado do Tocantins, além de realização de capacitações para a equipe do observatório de turismo (permanente/colaboradores) em metodologias de planejamento, operações e análises de estudos e pesquisas sobre o setor turístico tocantinense.

9.1 PRODUTO 01 –DEFINIÇÃO DO MODELO DE GOVERNANÇA E ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E OPERACIONAL DO OBSERVATÓRIO DE TURISMO DO ESTADO DO TOCANTINS

Neste produto a consultoria contratada deverá elaborar e apresentar o modelo de governança e de estrutura organizacional do observatório do Observatório de Turismo do Estado do Tocantins, assim como o seu plano estratégico e operacional.

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47817859) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 130

O observatório de turismo terá sede em Palmas, sendo um departamento alocado juntoao órgão oficial de turismo do Tocantins, atualmente integrado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Turismo e Cultura do Tocantins – SEDEN. Para concepção do modelo de governança, de gestão operação, e da estrutura organizacionaldo Observatório de Turismo do Estado do Tocantins a contratada deverá observar outros Observatórios de Turismo já implantados assim como organizações similares existentes nos no Brasil ou em outros países. Deverão ser pesquisados, avaliados e apresentados modelos de no mínimo 03 Observatórios de Turismo como referências.

Atividade 01 – Elaboração do Modelo de Governança e Estrutura Organizacional do Observatório do Observatório de Turismo do Estado do Tocantins

A empresa contratada deverá elaborar e apresentar modelos metodológicos de gestão, incluindo a estrutura organizacional e de governança do observatório de turismo, que deverão ser definidas, juntamente com a SEDEN, assim como as atribuições do observatório, a capacidade operacional e a equipe necessária para execução das ações e alcance dos seus objetivos planejados.

Atividade 02 - Planejamento Estratégico/Operacional do Observatório de Turismo

Nesta atividade a contratada deverá elaborar o plano estratégico e operacional do observatório de turismo, incluindo o plano de sustentabilidade orçamentária. Serão definidas juntamente com a SEDEN, a missão, visão, valores e as estratégias de atuação e de interação/gestão do observatório com os demais departamentos do órgão oficial de turismo do Estado do Tocantins, além de indicar seus objetivos estratégicos, programas, ações, estudos, pesquisas e painel de indicadores, com seus respectivos atributos. Quanto a seleção de procedimentos, ações e projetos de pesquisa:o Plano de Ação deve apresentar uma visão geral do conjunto de ações, atividades e projetos de pesquisa a serem realizados para o alcance dos objetivos do Observatório de Turismo do Tocantins em um horizonte temporal, no mínimo, 10 anos, e devendo ser estabelecida a relação de cada ação com as estratégias, vinculando-as aos objetivos e às correspondentes metas físicas e orçamentárias. Neste sentido o referido planejamento operacional do observatório de turismo deverá prever um plano de sustentabilidade orçamentária para assegurar a sua manutenção e o alcance dos seus objetivos.

As açõespropostas devem ser agrupadas por componente, preparando-se uma descrição do seu conjunto, com as seguintesindicações: Objetivo; Justificativa; Descrição da ação; Custo Estimado; Produtos e Resultados, Indicador de turismo e fontes de verificação destes indicadores;

Deverão ser acrescentadas às descrições contidas no Plano de Ação, os seguintes itens: entidades parceiras para implantação/ operação/ manutenção do serviço (com estimação de custos de contrapartidas) e cronograma temporal das ações e atividades a serem realizadas. Deverão ser apresentadas as memórias de cálculo ou documentos de referência para dimensionamento das contrapartidas.

O dimensionamento do Investimento Total deverá ocorrer de forma a indicar as açõespor componente. Deverá ainda ser estruturado umquadroque apresente os investimentostotais a serem realizados, identificando-se a cotação de câmbio utilizada. Deverão ser apresentadas as memórias de cálculo ou documentos de referência para dimensionamento dos investimentos.

As ações deverão serobjeto de priorização, seja em decorrência da lógica da relaçãoentre as mesmas, ou por necessidade de préviacapacitação institucional do seu executor. Deverão ser concebidas ações de curto, médio, longo prazo e contínuas, de forma a serem integradas nos Planos Plurianuais, Leis Orçamentárias Anuais e Leis de Diretrizes Orçamentárias do órgão oficial de turismo do governo do Estado do Tocantins.

9.2 PRODUTO 02 – ELABORAÇÃO DO BOLETIM DE DESEMPENHO ECONÔMICO DO TURISMO NO ESTADO DO TOCANTINS

Boletim de Desempenho Econômico do Turismo

Neste produto deverá ser elaborado a1ª versão do Boletim de Desempenho Econômico do Turismo Tocantinense. Para elaboração do Boletim a consultoria contratada deverá levantar e apresentar informações sobre análises qualitativas e quantitativas da conjuntura econômica do turismo no Tocantins, incluindo estimativas de participação do setor de turismo no Produto Interno Bruto - PIB Estadual e de arrecadação de impostos sobre serviços, análises sobre o impacto do turismo na economia estadual, assim como dados econômicos sobre os setores empresariais (hospedagem, entretenimento, alimentação, transporte, operadoras / agência de viagens), no que tange a variação do faturamento, investimentos, e postos de trabalhos no Estado do Tocantins.

Todos os subsídios a serem utilizados nas análises e relatório do Boletim de Desempenho Econômico do Turismo serão oriundos de fonte primária e secundária, ou seja, a consultoria contratada deverá realizar pesquisas e entrevistas em campo, por telefone ou email, além de levantamentos de dados e informações a partir de bases de dados já existentes, como IBGE, Secretaria Estadual da Fazenda, Secretarias Municipais de Finanças, etc. Para a estimativa do valor adicionado do setor de turismo ao Produto Interno Bruto estadual e para análises sobre o impacto do turismo na economia estadual a consultoria contratada deverá indicar, e aprovar em conjunto com a SEDEN os melhores modelos metodológicos, conforme as bases de dados e informações disponíveis ou passíveis de produção.

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47817859) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 132

A consultoria contratada deverá propor, e definir em conjunto com a SEDEN, os tipos de análises e relatórios, layout, assim como todo conteúdo, estatísticas e métricas econômicas, aspectos metodológicos, dados e indicadores a serem apresentados no Boletim de Desempenho Econômico do Turismo, a partir das informações disponíveis em bases de dados existentes, considerando ainda o tempo, e recusos disponíveis para execução dos serviços.

A contratada deverá entregar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura - SEDEN o arquivo digital para ser publicado em site institucional e 10 cópias impressas (em formato A4, coloridas com capa dura) do Boletim de Desempenho Econômico do Turismo Tocantinense, com a utilização de logomarca do Observatório de Turismo do Estado do Tocantins a ser apresentado pela Secretaria de Comunicação do Estado do Tocantins – SECOM.

9.3 -PRODUTO 03 – CAPACITAÇÃO EM PLANEJAMENTO E METODOLOGIAS DE OPERAÇÃO E ANÁLISE EM ESTUDOS, PESQUISAS E INDICADORES DE TURISMO

- A empresa contratada deverá prevê a realização de no mínimo 04 (três) oficinas (na sede da SEDEN, Palmas–TO) paracapacitaçãoda equipe do observatório de turismo e colaboradores eventuais indicados pela SEDEN, quanto aos conceitos básicos de planejamentoe metodologias utilizadas na operação, análise e tratamento de dados e informações setoriais do turismo, tendo como foco nos seguintes temas:
    - Tema de Capacitação 01 - o perfil da demanda turística (real e potencial); sondagens sobre a imagem turística dos destinos do Tocantins;estimativa do fluxo turístico (terrestre / aéreo, de abrangência estadual / regional eem atrativos / eventos);
    - Tema de Capacitação 02 - geração primária e secundária de dados e indicadores de arrecadação de impostos, desempenho econômico e geração de empregos diretos e indiretos no setorturístico considerando as principais Atividades Características de Turismo (ACT);
    - Tema de Capacitação 03 - Análise desempenho setorial do Produto Interno Bruto (PIB) de Turismo do Estado Tocantins, de forma compatibilizada com as Contas Nacionais e comparáveis aos demais estados da Federação, além de observância a orientação metodológica do Ministério de Turismo e do IBGE.
    - Tema de Capacitação 04 –Teoria e Prática em Análise estatística do Turismo; Sistemas de Informações Geográficas com ArcGIS for Desktop 10.3 - Módulo I e II; Sistemas de Posicionamento Global; Estatística Espacial /

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47817859) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 133

Geoestatística; Geomarketing.

Para o tema 04 a capacitação poderá ocorrer de forma individualizada, ou com pequenos grupos de alunos.Para este tema será aceita a modalidade de capacitação mediante a inscrição do(s) aluno(s) em cursos regulares presenciais ou à distância.Desta forma ficará facultada a modalidade de capacitação do tipo oficina presencial.

Para realização das oficinas a empresa contratada deverá observar as seguintes considerações:

Para os temas 01, 02 e 03 as capacitações deverão se presenciais e as turmas devem ser constituídas por grupos de no mínimo 05 participantes, ou conforme número de interessados inscritos, indicados pela SEDEN, chegando ao limite máximo de 15 alunos por turma. A carga horária das oficinas irá variar conforme o tema (serviço / produto) a ser abordado, não podendo ser inferior a 40 h de capacitação por tema.

Para o tema 04 as capacitações poderão ser à distância ou presenciais, com no mínimo 01 participante, ou conforme número de interessados inscritos, indicados pela SEDEN, chegando ao limite máximo de 03 alunos. A carga horária total das capacitações do tema 04, não poderá ser inferior a 180h de capacitação. Deverão ser realizadas no mínimo 01 oficina para cada tipo de tema indicado acima. As oficinas deverão necessariamente envolver métodos de transferência de conhecimento teórico e exercícios para assimilação de metodologias. A formação do aluno deverá permitir que o mesmo esteja apto para atuar como um profissional do observatório de turismo do estado do Tocantins, assim como para atuar como um multiplicador de conhecimento. As atividades a serem desenvolvidas deverão proporcionar a apropriação dos conteúdos didáticos, sendo essencial a capacidade de uso prático de todo conteúdo ofertado por parte dos alunos. Para cada oficina realizada, caberá à consultoria contratada fornecer certificação impressa para todos os alunos capacitados e aptos para realização das respectivas atividades.

A consultoria contratada deverá ser responsável por todo planejamento e elaboração de conteúdo, logística e execução das oficinas, cabendo a SEDE dar o apoio quando possível. As despesas relativas aos deslocamentos, alimentação e hospedagens dos consultores, impressões e oferta de lanches para as oficinas ficarão a cargo da empresa contratada.

Como apoio a realização das oficinas serão cedidos equipamentos de apresentação audiovisual pela SEDEN, como Datashow, conforme disponibilidade dos equipamentos. Serão ofertados apoios quanto a realização de inscrições para a participação das oficinas pela SEDEN, conforme disponibilidade de servidores públicos aptos para função. O local de realização das oficinas será disponibilizado na própria sede da SEDEN ou em local indicado pela mesma.

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47817859) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 134

A partir do conteúdo das capacitações realizadas a empresa deverá elaborar um manual metodológico dos estudos e pesquisas definidos para serem realizados anualmente no âmbito do Observatório de Turismo do Estado do Tocantins.O material didático (manual metodológico) deverá ser entregue de forma digital e impresso com no mínimo 05 exemplares.

RELATÓRIO PRELIMINAR E FINAL

Por fim deverá ser entregue ao contratante um relatório preliminar e um relatório final contendo todos os produtos anteriores, incluindo mapas, registros fotográficos, e anexos com formulários de pesquisa, atas e listas de reuniões, e demais documentos técnicos ou que se fizerem pertinentes.

Além disso, a contratada deverá realizar uma apresentação dos resultados alcançados de todos os produtos previstos neste Termo de Referência. A apresentação será realizada em Palmas – TO, em local a ser indicado pela SEDEN, e terá como público alvo o Trade Turístico Estadual, assim como instituições públicas afins e instituições de ensino técnico e superior. As inscrições, mobilizações e equipamentos audiovisuais para referida apresentação, também ficarão a cargo da SEDEN.

10. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E DESEMBOLSO

Os documentos deverão ser apresentados em português e seguir a ordem constante no Termo de Referência, de forma a facilitar a análise posterior.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E DESEMBOLSO			
Produtos	**Descrição**	**Prazo** (acumulativo)	**Desembolso**
	➢ Revisão e Ajustes do Plano de Trabalho	02 dias	---
PRODUTO 01 - MODELO DE GOVERNANÇA	➢ Definição do modelo de governança e elaboração do planejamento estratégico e operacional do observatório de turismo do estado do Tocantins.	29 dias	30%
PRODUTO 02 – ESTUDOS E PESQUISAS	➢ Realização de estudos e pesquisas e elaboração do Boletim de Desempenho Econômico do Turismo no Estado do Tocantins	59 dias	30%

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47817859) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 135

PRODUTO 03 – CAPACITAÇÃO EM ESTATÍSTICA, PLANEJAMENTO E METODOLOGIAS PARA OPERAÇÃO DE PESQUISAS E INDICADORES DE TURISMO	➢ Capacitação em planejamento e metodologiasde operação e análise em estudos, pesquisas e indicadores de turismo.	112 dias	30%
RELATÓRIOS PRELIMINARES E FINAL	➢ Versão final - Elaboração de Relatóriose Apresentação dos produtos anteriores 01, 02, 03.	120 dias	10%

11 APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS

Aempresacontratadadeveráelaborarrelatóriosintermediários e finais quanto aos resultados obtidos na execução dos serviços previstos neste Termo de Referência.

a. Forma deapresentação dos produtos

Todososrelatóriosdosprodutosdeverãoserentreguesemquatroviasoriginais, impressasemqualidadeLaserprintousimilar,empapelformatoA4,deacordocomas NormasBrasileiras(NB).

Cadaversãofinaldeveráserfornecidatambémemformato digital em PDF eeditor detextoWordforWindowsda Microsoft.

Aformataçãodosdocumentos,nasversõespreliminaresefinal,deveráobservaras seguintescaracterísticas:

- Programa:PDF, Word;
- Fonte: Arial;
- Título principal:Arial11,caixa alta,negrito.;
- Subtítulo:Arial11,caixa alta ebaixa,negrito;
- Texto: Arial11,justificado;
- Páginasnumeradase impressasfrentee verso;

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47817859) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 136

- Espaçamentosimplesentre linhas eumespaçoentreparágrafos;
- Numeraçãodos itens:algarismosarábicos,negrito,separadosporponto(ex.: 1.,1.1.,13.2 etc.);
- Margensdapágina:superioreinferiorcom2cm,esquerdacom3cm,direita com2cmecabeçalhoerodapécom1,6cmesemrecuoparaindicar parágrafo,começando no início da margemesquerda;
- Tamanho do papel A4;

12. PRAZO

O prazo para a apresentação dos produtos será de 120 (cento e vinte) dias, sendo que a duração do contrato será de 180 (Cento e Oitenta) dias, contados a partir da emissão da ordem de serviço, correspondente as atividades previstas no Plano deTrabalhoe prestação de contas aserapresentadopelacontratadaeaprovadopela contratante.

13. EQUIPE CHAVE

A Equipe Chave da Consultoria deverá ser composta por no mínimo, 06 (seis) profissionais, contando com o coordenador, sob pena de desclassificação da licitante, sendo:

- **01 (um) coordenador de projeto**, com formação em Turismo, ou Economia, ou Estatística, ou Administração, ou áreas afins, com no mínimo 05 anos de experiência na coordenação de projetos de consultoria, voltadas ao turismo, economia ou pesquisas / projetos desenvolvimento local /regional com competência profissional para exercer as funções de planejamento, coordenação, acompanhamento e avaliação de ações e resultados.
- **01 (um) profissional**com formação Economia, ou áreas afins com no mínimo 03 anos deexperiência comprovada em trabalhos de diagnóstico turístico e/ou econômico, análise de PIB Turístico estadual e /ou municipal, análise de receitas e tributos estaduais / municipais advindos do setor de turismo.
- **01(um) profissional** com formação em Estatística, ou áreas afins com no mínimo 03 anos de experiência comprovada no planejamento e operação de pesquisas sobre o mercado turístico, análises estatísticas, elaboração de tabelas, gráficos e geração de relatórios técnicos com metodologia científica no setor de turismo ou áreas afins.
- **01(um) profissional**com formação em Turismo, ou áreas afins, com no mínimo 03 anos de experiência comprovada na Criação e Implantação de Observatório de

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47817859) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 137

Turismo ou similar; e/ou criação, gestão, manutenção de base de dados ou Sistemas de Informações Turísticas;

14. VALIDAÇÃO DOS PRODUTOS

A avaliação, com critérios de aceitação, e a validação dos produtos previstos neste Termo de Referência serão realizadas por meio da Diretoria de Planejamento e Projetos Estratégicos - DPPE, da Superintendência de Desenvolvimento Turístico, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura – SEDEN, assim como pelo respectivo fiscal de contrato.

15. INSUMOSDISPONÍVEIS

Estarãodisponíveisparaconsultae/ouutilizaçãoporpartedasempresasosseguintesdocumentoseinformações:

TOCANTINS. Secretaria do Planejamento e Orçamento. Documento de Avaliação do Projeto- PAD.

TOCANTINS. Secretaria do Planejamento e Orçamento. Manual Operacional do Projeto – MOP.

TOCANTINS. Secretaria do Planejamento e Orçamento. Acordo de Empréstimo – Loan Agreement.

TOCANTINS. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura do Estado do Tocantins. Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável do Polo Palmas - PDITS. Palmas – TO. 2016.

TOCANTINS. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura do Estado do Tocantins. Plano de Marketing Turístico Polo Palmas. Palmas – TO. 2016.

TOCANTINS. Agência de Desenvolvimento Turístico. Projeto Revelando o Tocantins. ADTUR, 2011.

TOCANTINS. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura do Estado do Tocantins. Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável do Polo Jalapão - PDITS. Palmas – TO. 2016.

TOCANTINS. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura do Estado do Tocantins. Plano de Marketing Turístico Polo Jalapão. Palmas – TO. 2016.

TOCANTINS.InstitutoNaturezadoTocantins.Basecartográficadigitalcontínuadoestadodotocantins.Palmas,Naturatins.s/d.

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47817859) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 138

TOCANTINS.SecretariadoPlanejamento.DiretoriadePesquisaseInformações(Seplan/DPI).AnuárioEstatísticodoEstadodoTocantins.Palmas,Seplan,2010.

TOCANTINS.SecretariadoPlanejamento.BasedeDadosGeográficos.Arquivoscommapastemáticosreferentesacadafolha MIRnaescala1:250.000,estruturadosemSIG(formatosPCARC/INFOeSGI/SPRING-Inpe),arquivosdeimpressão(hpgl)earquivosemformatodxf.Estesarquivossãoreferentesaostemasbaciashidrográficas,declividade,erodibilidadepotencialdossolos,geologia,formasderelevo,pedologia,coberturaeusodaterra,vegetaçãopotencial,compartimentaçãogeoambientalepotencialidadedeusodasterras.2010.

TOCANTINS.SecretariadoPlanejamentoeMeioAmbientedoEstadodoTocantins.Arquivoscommapastemáticosintegradosapartirdaescala1:250.000esintetizadosnaescala1:1.000.000,estruturadosemSIG(formatos PCARC/INFOeSGI/SPRING-Inpe),arquivosdeimpressão(hpgl)earquivosemformatodxf.Taisarquivosreferem-seaosmesmostemasdescritosanteriormente.

TOCANTINS.SecretariadoPlanejamentoedaModernizaçãodaGestãoPúblicadoEstadodoTocantins.Atlasdo Tocantins:subsídiosaoplanejamentodagestãoterritorial.Arquivodigitalemformatopdfcontendooatlasdo Tocantins.2012.

TOCANTINS.SecretariadoPlanejamentoeMeioAmbientedoEstadodoTocantins.ProgramadeGestãoTerritorialdoNortedoTocantins.ArquivosdigitaiscommapastemáticosestruturadosemsIG(formatoPCArcView)e/ourelatóriosemformatopdfelaboradosparaaregiãoNortedoEstadodoTocantins.Estasinformaçõesenglobamestudosnaescala1:250.000,referentesa:geologia,geomorfologia,solos,aptidãoagrícoladasterras,inventárioflorestalelevantamentoflorístico,coberturaeusodaterra,estudodefloraefauna,análiseambientalesocioeconômica,inventáriosocioeconômico,contextoestadualeregional,planodeZoneamentoEcológico-Econômico,zoneamentoagrícolaecaracterizaçãodasorganizaçõessociaisformais.2005.

TOCANTINS.SecretariadoPlanejamentoeMeioAmbientedoEstadodoTocantins.EstudosambientaisemUnidadesdeConservaçãoeáreasprioritárias.Arquivosdigitaiseempapel,referentes aplanosdemanejoedegestãoparaUnidadesdeConservação(proteçãointegraleusosustentável)eavaliações ecológicasrápidasemáreasprioritáriasparaproteçãodabiodiversidade.

TOCANTINS.SecretariadoPlanejamentodoEstadodoTocantins.AnuárioEstatísticodoEstadodoTocantins.Arquivodigitalemformato*pdf*contendoinformaçõessocioeconômicasparatodoterritóriotocantinense.2009.

TOCANTINS.SecretariadoMeioAmbienteeDesenvolvimentoSustentáveldoEstadodoTocantins.PlanoEstadualdeRecursosHídricosdoTocantins.Arquivosdigitaisemformatopdfcontendorelatóriostécnicosemapastemáticosemescala1:1.000.000,referentesaoPlanodeRecursosHídricosdoEstadodoTocantins.2011.

TOCANTINS.SecretariadeRecursosHídricoseMeioAmbientedoEstadodoTocantinseSecretariadoPlanejamentoeMeioAmbientedoEstadodoTocantins.PlanosdeBaciasHidrográficas.Arquivosdigitaiscommapastem

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47817859) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 139

áticosestruturadosemSIG(formatoPCArcView)e/ourelatóriosemformatopdfcontendoosplanosdebaciashidrográficasdosrioseLontraeCorda;Formoso,ManuelAlves,Palma,EntornodoLagodaUHELuizEduardoMagalhães,eBalsaseSãoValério.

TOCANTINS.SecretariadoPlanejamentoeMeioAmbientedoEstadodoTocantins.EstudodaDinâmicadaCoberturaeUsodaTerradoEstadodoTocantins1990/2000/2005/2007.Arquivoscommapastemáticosemescala1:100.000estruturadosemSIG(formatoPCArcGIS),referentesaomapeamentodacoberturaeusodaterraparaosanosde1990,2000,2005e2007ededinâmicadacoberturaeusodaterra(1990-2000,2000-2005,2005-2007,1990-2005e1990-2007),bemcomorelatóriotécnicodigitalemformato*pdf*.

TOCANTINS.SecretariadoPlanejamentoedaModernizaçãodaGestãoPúblicadoEstadodoTocantins.MapeamentodasRegiõesFitoecológicaseInventárioFlorestaldoEstadodoTocantins.Arquivoscommapastemáticosemescala1:100.000estruturadosemSIG(formatoPCArcGIS),referentesaomapeamentodasregiõesfitoecológicasnoterritóriotocantinense,bemcomorelatóriotécnicodigitalemformato*pdf*.

ProjetodeDesenvolvimentoIntegradodaBaciadoAraguaia-Tocantins(PRODIAT),coordenadopeloMinistériodoInterior/OEA.

ProjetoRADAMBRASIL–IBGE.TOCANTINS.SecretariadoPlanejamentoeMeioAmbiente.IndicadoresRegionaisdoTocantins.

TOCANTINS.SecretariadoPlanejamentoeMeioAmbiente.EstudossobreosPólosEcoturísticosdoEstadodoTocantins.

TOCANTINS.SecretariadoPlanejamentoeMeioAmbiente.Diagnósticodaspotencialidadesemapeamentohidrogeológicodas FontestermaisdeJaúeParanádoTocantins.2003.

TOCANTINS.SecretariadoPlanejamentoeMeioAmbiente–EstudosHidrossedimentológicosdoRiachodaAreianoParqueEstadualdoJalapão,municípiodeMateiros.2004.

TOCANTINS.SecretariadeRecursosHídricoseMeioAmbientedoEstadodoTocantins.ProgramaEstadualdeBiodiversidadedoEstadodoTocantins.

TOCANTINS.SecretariadoPlanejamentoedamodernizaçãodaGestãoPúblicadoEstadodoTocantins.AvaliaçãodoImpactoSócioambiental(AISA)doProjetodeDesenvolvimentoRegionalIntegradoeSustentáveldoEstadodoTocantins(PDRIS).Palmas–TO.2011.

TOCANTINS.Secretariado PlanejamentoeMeioAmbiente.261./1991.PolíticaEstadualdeMeioAmbiente.1991.

Tocantins.SecretariadoPlanejamentoeMeioAmbiente.Lei1.307/2002.Políticade RecursosHídricosdoEstadodoTocantins.2002.

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47817859) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 140

TocantinsSecretariadoPlanejamentoeMeioAmbiente.Lei1.374/2003.PolíticadeEducaçãoAmbientaldoEstadodoTocantins.2003.

TocantinsSecretariadoPlanejamentoeMeioAmbiente.Lei1.560/2005.SistemaEstadualdeUnidadedeConservaçãodoEstadodoTocantins.2005.

TocantinsSecretariadoPlanejamentoeMeioAmbiente.Lei771/1995.PolíticaFlorestaldoEstadodoTocantins.1995.

16. GESTÃO DA CONSULTORIA

Semprequenecessárioaempresaconsultoramanterácontatocomaa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Culturaatravésdosemailsgabinete@adtur.to.gov.br / pesquisa@adtur.to.gov.brendereçadoaosecretário da pastacomcópiaparadppe@adtur.to.gov.br.

Osprodutoserelatóriosserãoencaminhadosao:

Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura

EsplanadadasSecretarias-PraçadosGirassóis–
s/n77.001-002–Palmas

Fone:(63)3218-2335

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47817859) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 141

ANEXO I

SEDE DO OBSERVATÓRIO DE TURISMO DO ESTADO DO TOCANTINS

Figura nº 01 - Alocação da Sede do Observatório de Turismo do Estado do Tocantins

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47817859) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 142

APÊNDICE B - EQUIPE PRINCIPAL

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47817859) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 143

Apêndice B - Equipe Principal

TOCANTINS THE WORLD BANK

TEC 6 - CV COORDENADOR

1. Cargo proposto: Coordenadora Geral

2. Nome da empresa: IBER-GEO CONSULTING

3. Nome do profissional: Tereza Pires

4. Data de nascimento: 15/02/1966 Nacionalidade: Brasil

5. Educação:

Instituição (Data) de- (Data) até	Título(s) e Diploma(s) obtidos:
Universidade Federal de Santa Catarina 1988/1993	Graduação em Economia
Universidade Federal de Alagoas 1998	Especialização em Ciências Sociais
Universidade de Brasília 2006	Especialização em Economia do Turismo
Universidade Autónoma de Navarra, Espanha 2014	Mestrado em Turismo

6. Associações profissionais às quais pertence: Presidente do Conselho Consultivo da WTN Latin America

7. Outras especializações: Credenciada pela Ordem de Instrutor Rio Branco

8. Países onde tem experiência de trabalho: Argentina, Uruguai, Peru, Venezuela, Portugal, Espanha, França, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Chile, Dinamarca, Áreas do Sul e muitos outros

9. Idiomas (indicar bom, regular ou fraco)

Idioma	Ler	Falar	Escrever
Português	B	B	B
Inglês	B	B	B
Francês	B	B	R
Espanhol	B	B	B

10. Histórico dos Serviços

Ano: 2013 Até: Atualmente

Empresa: PIRES & ASSOCIADOS

Cargo desempenhado: Diretora

iber-geo meridiano zero Mcrit

18

21

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47817859) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 144

THE WORLD BANK

Dez 2015 Até Março 2016

Empresa: Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Alagoas

Cargo Desempenhado: Secretário

De: Setembro 2012 Até: Maio 2013

Empresa: Ministério da Cultura

Cargo desempenhado: Secretário Executivo

De: Setembro 2012 Até: Maio 2011

Empresa: Ministério do Esporte

Cargo Desempenhado: Assessoria Especial do Ministro para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016

De: Agosto 2008 Até: Setembro 2010

Empresa: Ministério do Turismo - EMBRATUR – Instituto Brasileiro de Turismo

Cargo desempenhado: Presidente

De: Fevereiro 2003 Até: Agosto 2008

Empresa: Ministério do Turismo – EMBRATUR – Instituto Brasileiro de Turismo

Cargo desempenhado: Diretor de Turismo de Negócios e Eventos

De: Julho 2001 Até: Fevereiro 2003

Página 58 de 80

ibeR-Gero meridiano zero Merit

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47817859) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 145

TOCANTINS THE WORLD BANK

Empresa: Recife Convention & Visitors Bureau

Cargo desempenhado: Diretora Executiva

De: Outubro 1997 Até: Fevereiro 2003

Empresa: Maceió Convention & Visitors Bureau

Cargo desempenhado: Diretora Executiva

De: 1991 Até: 2011

Empresa: Universidade Federal de Alagoas

Cargo desempenhado: Professora Titular

11. Funções atribuídas: Coordenação geral do projeto, acompanhamento da execução dos componentes, organização das atividades de capacitação e treinamento. Elaboração e implementação das metodologias de trabalho para cada etapa prevista, interlocução direta com os gestores institucionais do projeto.

12. Serviços executados que melhor demonstrem a capacidade para executar as tarefas atribuídas:

EMBRATUR

De: Agosto 2006 Até: Setembro 2010

Empresa: Instituto de Turismo - EMBRATUR – Empresa Brasileira de Turismo

Cargo desempenhado: Presidente

De: Fevereiro 2003 Até: Agosto 2006

Cargo desempenhado: Diretora de Turismo de Negócios e Eventos

Atividades desempenhadas: Como Diretora e Presidente, coordenação da promoção do Brasil no exterior, realização de seminários, palestras, cursos sobre turismo, elaboração de Planos de Marketing, administração e relacionamento com operadoras nacionais e internacionais de turismo para os programas da EMBRATUR.

Implantação do Maceió Convention & Visitors Bureau

ibergeo meridiano zero Mcrit

20

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47817859) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 146

TOCANTINS THE WORLD BANK

Empresa: Recife Convention & Visitors Bureau

Cargo desempenhado: Diretora Executiva

De: Outubro 1997 Até: Fevereiro 2003

Empresa: Maceió Convention & Visitors Bureau

Cargo desempenhado: Diretora Executiva

De: 1991 Até: 2011

Empresa: Universidade Federal de Alagoas

Cargo desempenhado: Professora Titular

11. Tarefas atribuídas: Coordenação geral do projeto, acompanhamento do trabalho das especialistas, coordenação das atividades de capacitação e treinamento. Elaboração e implementação das metodologias de trabalho para cada área temática, interlocução direta com os gestores institucionais do projeto

12.Serviços realizados que melhor demonstrem a capacidade para executar as tarefas atribuídas

EMBRATUR

De: Agosto 2006 Até: Setembro 2010

Empresa: Instituto de Turismo - EMBRATUR – Instituto Brasileiro de Turismo

Cargo desempenhado: Presidente

De: Fevereiro 2003 Até: Agosto 2006

Cargo desempenhado: Diretora de Turismo de Negócios e Eventos

Atividades desempenhadas: Como Diretora e Presidente, coordenação da promoção do Brasil no exterior, realização de seminários, palestras, cursos sobre turismo, elaboração de Planos de Marketing, sensibilização e alinhamento com interlocutores nacionais e internacionais do turismo para os programas da EMBRATUR

- Implantação do Maceió Convention & Visitors Bureau

Página 55 de 80

ibet-Gen meridiano zero Mcrit

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47817859) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 147

TOCANTINS THE WORLD BANK

Ano: 1997/2001

Local: Brasil

Contratante: Maceió Convention & Visitors Bureau

Principais características do projeto: Sensibilização e organização do empresariado privado do turismo de Alagoas em torno da criação do Maceió CVB. Implantação da entidade com atração de associados e fortalecimento institucional da nova entidade junto à sociedade e atores públicos e privados do turismo. Elaboração e implantação dos Planos Comerciais de Marketing da entidade para os anos de 1998, 1999 e 2000.

Cargo: Diretora Executiva

Atividades desempenhadas: Sensibilização e organização do empresariado privado do turismo de Alagoas em torno da criação do Maceió CVB; implantação da entidade com atração de associados e fortalecimento institucional da nova entidade junto à sociedade e atores públicos e privados do turismo; Elaboração e implantação dos Planos Comerciais de Marketing da entidade para os anos de 1999, 1999 e 2000.

- Professora Concursada da Universidade Federal de Alagoas

Ano: 1984 a 2002

Cargo desempenhado: Professora Doutor

Atividades desempenhadas: Aulas nos cursos de História, Economia, Relações Públicas, Ciências Sociais e Cursos sobre Formação Econômica e Cultural do Brasil.

- Plano de Marketing do Recife Convention & Visitors Bureau

Ano: 2001
Local: Brasil

Contratante: Recife Convention & Visitors Bureau

Principais características do projeto: Elaboração do Plano de Marketing do Recife para a entidade nacional e internacional, para horizonte de cinco anos de duração.

Cargo: Diretora Executiva

Atividades desempenhadas: Sensibilização e organização do empresariado privado do turismo do Pernambuco em torno da criação do Recife CVB; implantação da entidade com atração de associados e fortalecimento institucional da nova entidade junto à sociedade e atores públicos e privados do turismo; Elaboração e implantação dos Planos Comerciais da entidade em 2002.

- Plano de Marketing do PRODETUR Nacional Pernambuco

Ano: 2014 - 2018

pg. 14 de 80

Idef-gen meridiano zero Mcrit

21

25

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47817859) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 148

TOCANTINS THE WORLD BANK

Local: Brasil

Contratante: PRODETUR Nacional Pernambuco

Principais características do projeto: Elaboração dos Planos de Marketing dos Polos do PRODETUR Nacional Pernambuco. Diagnóstico do turismo do estado, pesquisas de oferta e demanda (interna e externa), oficinas de mobilização e sensibilização dos 6 Polos do estado; elaboração da estratégia e posicionamento do destino; grade de produtos e de mercados, estratégias de comunicação nos mercados prioritários

Cargo: Coordenadora

Atividades desenvolvidas: Coordenação geral do projeto, elaboração de relatórios e Produtos, atendimento ao contratante, entrega do Produto, coordenação dos consultores

Elaboração do Plano Comercial das entidades de turismo de negócios de Belo Horizonte

Ano: 2013/2014

Local: Brasil

Contratante: BELOTUR

Principais características do projeto: Elaboração e implantação do projeto de reposicionamento da BELOTUR Empresa de Turismo de Belo Horizonte para o turismo de Negócios. Realizado diagnóstico das entidades de turismo de Minas Gerais, orientação quanto à transição do escritório de negócio da REMTE, sensibilização de equipe, elaboração das ações de fortalecimento das entidades, criação do grupo de governança e revisão do Plano 2015 para captação de eventos

Cargo: Consultora Senior

Atividades desempenhadas: Elaboração e implantação do projeto de reposicionamento da BELOTUR, Empresa de Turismo de Belo Horizonte para o turismo de Negócios. Realizado diagnóstico das entidades de turismo de Minas Gerais, orientação quanto à transição do escritório de negócio da REMTE, sensibilização de equipe, elaboração das ações de fortalecimento das entidades, criação do grupo de governança e revisão do Plano 2015 para captação de eventos

- Elaboração do Plano Comercial das Entidades do Turismo de Negócios de Minas Gerais – ABIH Minas Gerais

Ano: 2013/2014

Local: Brasil

Contratante: ABIH MINAS

Página 57 de 80

iberger meridiano zero Mcrit

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47817859) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 149

TOCANTINS THE WORLD BANK

Principais características do projeto: Elaboração e implantação de projeto de reposicionamento das entidades de turismo de Negócios de Minas gerais. Realizado diagnóstico das entidades de turismo de Minas Gerais, orientação quanto à transição do escritório de negócio da FIEMG, sensibilização de lideranças públicas e privadas, e elaboração das ações de fortalecimento das entidades, criação de grupo de governança e revisão do Plano 2015 para captação de eventos.

Cargo: Consultora Senior

Atividades desenvolvidas: Elaboração e implantação de projeto de reposicionamento das entidades de turismo de Negócios de Minas gerais. Realizado diagnóstico das entidades de turismo de Minas Gerais, orientação quanto à transição do escritório de negócio da FIEMG, sensibilização de lideranças públicas e privadas, elaboração das ações de fortalecimento das entidades, criação de grupo de governança e revisão do Plano 2015 para captação de eventos.

- Elaboração do Plano Comercial da ABAV Minas Gerais

Ano: 1997/2011

Local: Brasil

Contratante: IEL – FIEMG

Principais características do projeto: Elaboração e implantação de projeto de reposicionamento da ABAV Minas Gerais. Realizado diagnóstico da entidade; sensibilização de lideranças públicas e empresários do setor; elaboração das ações de fortalecimento da entidade; realização de oficinas participativas e sensibilização dos associados; implantação e monitoramento das ações de curto prazo e as prioritárias da ABAV MG

Cargo: Consultora Senior

Atividades desenvolvidas: Elaboração e implantação de projeto de reposicionamento da ABAV Minas Gerais. Realizado diagnóstico da entidade; sensibilização de lideranças públicas e empresários do setor; elaboração das ações de fortalecimento da entidade; realização de oficinas participativas e sensibilização dos associados; implantação e monitoramento das ações de curto prazo e as prioritárias da ABAV MG

Ministério da Cultura

Ano: 2012/2013

Local: Brasil

Contratante: Ministério da Cultura

Principais características do projeto: Consolidação dos projetos de Natal relacionados aos pólos culturais, pontos de cultura, Ie Ponto, reestruturação da gerência do Natal

Cargo: Secretaria Executiva

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47817859) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 150

TOCANTINS THE WORLD BANK

Atividades desempenhadas: Secretária Executiva, que coordenava todas as atividades regionais e internacionais da MHC

Plano de Marketing Turístico do Estado do Ceara

Ano: 2012/2013

Local: Brasil

Contratante: Chias Marketing Ltda. (BR)

Principais características do projeto: Estratégia e posicionamento do Ceara nos mercados prioritários, Plano Operacional: Plano de ações, parcerias e sensibilização de lideranças nos Polos turísticos do projeto.

- Consultoria para Plano de Ações das entidades do turismo da Paraíba

Ano: 2013

Local: Brasil

Contratante: SEBRAE Paraíba

Principais características do projeto: Plano de Ação conjunto das entidades da Paraíba, reunião de lideranças para estratégia, estabelecimento de metas conjuntas, palestra

Cargo: Consultora Senior

13 Certificado

Certifico, segundo meu conhecimento e entendimento, que este currículo descreve corretamente minha pessoa, minhas qualificações e minha experiência. Estou ciente que qualquer declaração falsa ou omissão pode resultar na minha desqualificação ou, no caso de ser contratado, de ser demitido.

Data: 5 de junho de 2015

Jeanine Pires

Página 58 de 80

ibero-gero meridiano zero Mcrit

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47817859) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 151

TOCANTINS THE WORLD BANK

TECH 6 - CV ESPECIALISTA EM ECONOMIA

1. Cargo proposto : Especialista em economia

2. Nome da empresa: MERIDIANO ZERO

3. Nome do profissional: Pedro Aramburu Calafel

4. Data de nascimento: 14/01/1971 **Nacionalidade:** Espanhola

5. Educação:

- Licenciado em Ciências Econômicas e Empresariais na Universidade de Deusto (ESTE) 1994.
- Curso: Tourism Statistics and TSA: Technical Fundamentals and Practical Implementation "Training the trainers" 2013 UNWTO

6. Associações profissionais às quais pertence: -

7. Outras especialidades: Consultor sênior para diferentes empresas consultoras e administrações públicas desde 1997, especialista em pesquisas, estatísticas turísticas, conta satélite do turismo e na gestão de destinos e projetos turísticos em cidades, regiões e países. Sua carreira profissional se desenvolve no âmbito das pesquisas turísticas, análise do impacto econômico do turismo e a planificação estratégica.

8. Países onde teve experiência de trabalho:

- Brasil – 2010 - 2012; 2014 – 2016
- Uruguai – 2010 – 2012, 2017
- Argentina – 2010 -2012
- Paraguai – 2010 – 2012
- Chile – 2010 - 2012
- El Salvador - 2007 – atualidade
- Guatemala – 2005; 2009-2010; 2014 - atualidade
- Panamá – 2015
- Honduras - 2009-2010; 2012, 2016
- Nicarágua – 2009-2010
- Aruba – 2013 – atualidade
- Dominica 2014
- SICA (Sistema de Integracion Centroamérica) – 2010 – 2012; 2016 - atualidade
- Espanha 1996 - atualidade

9. Idiomas:

- Português: Falar - Regular; Ler - Regular; Escrever - Regular
- Inglês: Falar, Ler e Escrever - Bom
- Francês: Falar - Regular; Ler - Bom; Escrever - Regular
- Espanhol: Fluente

10. Histórico dos Serviços:
De 2013 Até: atual
Empresa: INSTITUTO MOVATUR S.L

ibec-geo meridiano zero Mcrit

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47817859) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 152

TOCANTINS THE WORLD BANK

Cargo ocupado: Consultor experto em Sistemas de Estatísticas de Turismo e projetos e pesquisas de mercados relacionados com o turismo.
Tarefas realizadas: Miembro de Consejo directivo, Dirección comercial proyectos internacionales, Dirección técnica de proyectos.

De 2013 Até: atual
Empresa: Organização Mundial de Turismo UNWTO
Cargo ocupado: Consultor e instrutor externo
Tarefas realizadas: Desenvolvimento de assuntos dentro do Programa de construção das capacidades estatísticas e fortalecimento institucional.

De 1995 até 2012:
Empresa: ARALDI S.L.
Cargo ocupado: Diretor de projetos e Diretor de Internacionalização.
Tarefas realizadas: Tarefas de direção e técnincas em projetos de capacitação, desenvolvimento e fortalecimento institucional na área estatística.

11. Serviços Prestados que Melhor Demonstram a Capacidade para Executar as Tarefas Atribuídas

Nome da tarefa ou projeto: FUNDAÇAO GETULIO VARGAS (FGV) – SETESP SERGIPE: Consultoria para Elaboração da Avaliação de Impacto do Prodetur Nacional – Sergipe na economia local (SDP Nº 007/2016). (En realización)

Ano: 2017

Local: Sergipe

Contratante: BID BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

Principais características do projeto: Avaliação econômica dos investimentos em turismo no âmbito do PRODETUR-SERGIPE. O estudo envolveu a construção de uma Matriz de Contabilidade Social (SAM) dos polos turísticos de Sergipe, bem como uma análise detalhada de impactos através de multiplicadores da SAM

Cargo: Coordenador de Campo

Atividades desempenhadas: Desenho de questionários e tratamento da informação.

Nome da tarefa ou projeto: PRODETUR Nacional R-L1195 Especialista em Sistemas de Informação e Estatísticas Turísticas (SIET)

Ano: 2014

Local: Brasília

Contratante: BID BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

Principais características do projeto: Esta consultoria tem como objetivo apoiar as unidades de Coordenação de Projeto (UCPs) do PRODETUR nos 8 Estados mencionados no parágrafo 1.1 deste Termo

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47817859) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 153

de Referência (TORs), no que se refere aos aspectos relacionados com o terceiro componente do Programa (Fortalecimento Institucional) e, de forma mais específica, a melhora do Sistema de Informação e Estatísticas Turísticas (SIET) dos Estados. Os objetivos específicos são: i) identificação do mínimo de informação que debe integrar o diagnóstico do sistema de estatísticas turísticas previsto nas matrizes de investimentos dos 8 estados, ii) identificação das prioridades em curto/médio prazo em termos de execução, consistencia, credibilidade e oportunidade na difusão dos dados estatísticos turísticos que devem cumprir as recomendações e atuações que de derivem do diagnóstico a realizar em cada um dos 8 estados.

Cargo: Consultor único da execução do projeto.

Atividades desempenhadas:

- Dinamizar a articulação federal-estadual e inter-estadual com os estados participantes.
- Apresentar por primeira vez aos estados o projeto do plano federal de estatísticas turísticas.
- Propor um marco mínimo de informação comparável para o SIET (que tivera incluídos os indicadores objetivos do BID) que fora a base para construir sistemas de informação sustentáveis.
- Desenvolver o analise comparativo inicial, em primeiro lugar por parte das próprias secretarias e depois em parceria com o BID, da situação atual de cada SIET com respeito ao marco proposto.
- Propor e acordar roteiros e/ou prioridades relacionadas com os próximos passos que serão dados no desenvolvimento dos SIET em relação com os fundos PRODETUR e a sua sustentabilidade futura sem esse marco financeiro.

Nome da tarefa ou projeto: TSA – Consultoria para avaliação da situação atual e as ações de desenvolvimento e documentação necessárias para estabelecer o marco básico e os processos de construção da Conta Satélite de Turismo, TSA

Ano: 2015

Local: Panamá
Contratante: Ministerio de Economia e Finanças – Direção de Gestão Administrativa de Projetos.
Principais características do projeto: Ampliar o marco central do Sistema de Contas Nacionais do Panamá através da criação da Conta Satélite de Turismo.

Cargo: Consultor único na execução do projeto.

Atividades desempenhadas:

- Para avaliar o estado atual de levantamento, processamento e utilização das estatísticas básicas necessárias para a construção da CST. Especificamente, a consultoria visa desenvolver e documentar o enquadramento necessário e processos para estabelecer e construir uma CST. Portanto: i) a revisão da situação atual das contas nacionais e estatísticas de turismo, ii) obter todas as informações incluídas nos questionários metodológicos da OMT e iii) com base em resultados de i) e ii), realizar uma análise do possível curso de ações corretivas e as deficiências de recursos que formarão a base para o resto do programa.
- 1. Diagnóstico e recomendações, juntamente com a equipe local, para a melhoria do sistema de estatística do turismo (SET) em Panamá; 2. Plano operacional para a implementação do marco necessário na preparação de uma conta satélite de turismo.

Nome da tarefa ou projeto: Missão de formulação de projetos para a Tourism Satellite Account na Guatemala. UNWTO – Department of Statistics and Economic Measurement of Tourism

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47817859) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 154

TOCANTINS THE WORLD BANK

Ano: 2015
Contratante: UNWTO
Principais características do projeto: Obter serviços profissionais para uma missão de verificação da parte da Organização Mundial de Turismo – OMT – para ajudar no proceso de validação da metodologia e informação que consolidará na Conta Satélite do Turismo da Guatemala.

Local: Guatemala

Cargo: Consultor externo UNWTO

Atividades desempenhadas: a). Validar os indicadores desenvolvidos para realizar medições. b). Revisar as metodologias existentes para levantamento da informação necessária para a consolidação da Conta Satélite de Turismo. C). Revisar e validar as bases de dados obtidas. D) Validação das ações e trabalho revisado no Escritóriode Coordenação Setorial de Turismo (OCSET) em função da criação da Conta Satélite de Turismo. E) Verificar a existência de informação completa que se encontre apta para consolidar uma determinada tabela da Conta de Satélite de Turismo.

Nome da tarefa ou projeto: Missão de formulação de projetos para a Tourism Satellite Account na Guatemala. UNWTO – Department of Statistics and Economic Measurement of Tourism
Ano: 2013- 2015
Local: Aruba
Contratante: UNWTO
Principais características do projeto: Desenvolvimento de Conta Satelite de Turismo

Cargo: Consultor externo UNWTO

Atividades desempenhadas:

- Diagnóstico e recomendações, juntamente com a equipe local, para a melhoria do sistema de estatística do turismo (SET) em Aruba.
- Plano operacional para a implementação do marco necessário na preparação de uma conta satélite de turismo.

Nome da tarefa ou projeto: Assistencia técnica para construção do marco metodológico para a elaboração da conta satélite de turismo (TSA) da Dominica

Ano: 2014
Local: Dominica
Contratante: Discover Dominica Authority
Principais características do Projeto: Consultoria para a documentação, analise da situação atual e futura melhoria do marco necessário e processos para desenvolver uma conta satélite de turismo

Cargo: Consultor único encarregado da ejecución

Atividades desempenhadas:

- Para avaliar o estado atual de levantamento, processamento e utilização de estatísticas básicas necessárias para a construção da CST. Especificamente, a consultoria visa desenvolver e documentar o enquadramento necessario e processos para estabelecer e construir uma CST. Portanto, i) a revisão da situação atual das contas nacionais e estatísticas de turismo, ii) obter todas as informações incluídas nos questionários metodológicos da OMT e iii) com base em resultados de i) e ii), realizar uma análise do possível curso de ações corretivas e as deficiências de recursos que formarão a base para o resto do

ibef-geo meridiano zero Mcrit

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47817859) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 155

programa.
– 1 Diagnóstico e recomendações, juntamente com a equipe local, para a melhoria do sistema de estatística do turismo (SET) em Dominica; 2. Plano operacional para a implementação do marco necessário na preparação de uma conta satélite de turismo

Nome da tarefa ou projeto: Avaliação e Proposição de Melhorias ao Sistema de Informações e Estatísticas Turísticas do Estado de Sergipe – SIET, dentro do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo – Prodetur Nacional Sergipe

Ano: 2015-2016
Local: Sergipe - Brasil
Contratante: Secretaria de Estado do Turismo e do Esporte
Principais características do projeto: avaliar e propor melhorias ao Sistema de Informações e Estatísticas Turísticas do Estado de Sergipe – SIET

Cargo: Serviços de consultoria individual especializada em Sistema de Informações e Estatísticas do Turismo no Estado do Sergipe – SIET.

Atividades desempenhadas:

– Diagnóstico do SIET do Estado do Sergipe. Recomendações estratégicas para o fortalecimento do SIET do Estado do Sergipe. Elaboração do relatório final, apresentação e discussão do mesmo.
– Recompilação e documentação das fontes administrativas e estatísticas de interesse. Análise das metodologias empregadas e sua adequação às recomendações internacionais. A avaliação do desenvolvimento atual da governança estatística do Estado. Recomendações sobre a melhora das metodologias utilizadas nas operações basicas do SIET, principalmente as que estão sob a responsabilidade da SETESP. Recomendações que permitam abordar a manutenção do Sistema através de um planejamento integral do desenvolvimento e fortalecimento do SIET. Recomendações para a melhora da governança estatística no Estado. Elaboração do relatório final, apresentação e discussão do mesmo

Nome da tarefa ou projeto: Diagnóstico e Plano Estratégico de Estatísticas Turísticas Nacionais. Ministério de Turismo - BID
Ano: 2014-2015
Local: Brasil
Contratante: Fundação Getulio Vargas - FGV
Principais características do projeto: Elaborar Diagnóstico e Plano Estratégico de Estatísticas Turísticas, com vigência de 5 (cinco) anos, definindo as diretrizes estratégicas a serem seguidas em nível nacional para a produção, armazenamento e disseminação de estatísticas, padronizadas e comparáveis, sobre a atividade turística no Brasil

Cargo: Especialista em trabalho de campo

Atividades desempenhadas: Coordenação das atividades relacionadas à desenho de questionários, organização e operação de trabalhos de campo

Nome da tarefa ou projeto: SERVIÇOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES E ESTATÍSTICAS DO TURISMO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SIET

Ano:2014 -2016

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47817859) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 156

TOCANTINS THE WORLD BANK

Local: Rio de Janeiro - Brasil

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO ÓRGÃO EXECUTOR DO PRODETUR/RJ

Principais características do projeto: assessorar e contribuir com a Equipe do PRODETUR do Rio de Janeiro no que diz respeito às questões relacionadas com o terceiro componente do programa (Fortalecimento Institucional) e, mais especificamente, a melhoria do Sistema de Informação e Estatísticas do Turismo (SIET) do Estado do Rio de Janeiro.

Cargo: Serviços de consultoria individual especializada em Sistema de informações e Estatísticas do Turismo no Estado do Rio de Janeiro – SIET.

Atividades desempenhadas:

- Diagnóstico do SIET do Estado do Rio de Janeiro. Recomendações estratégicas para o fortalecimento do SIET do Estado do Rio de Janeiro. Elaboração do relatório final, apresentação e discussão do mesmo.
- Recompilação e documentação das fontes administrativas e estatísticas de interesse. Análise das metodologias empregadas e sua adequação às recomendações internacionais. A avaliação do desenvolvimento atual da governança estatística do Estado. Recomendações sobre a melhora das metodologias utilizadas nas operações básicas do SIET, principalmente as que estão sob a responsabilidade da SETUR. Recomendações que permitam abordar a manutenção do Sistema através de um planejamento integral do desenvolvimento e fortalecimento do SIET. Recomendações para a melhora da governança estatística no Estado. Elaboração do relatório final, apresentação e discussão do mesmo.

Nome da tarefa ou projeto: INTER – AMERICAN DEVELOPMENT BANK: Preparação de uma nota técnica sobre a importância das Estatísticas do Turismo para a governança do turismo. Inter – American Development Bank. Banco Interamericano de Desenvolvimento.

Ano: 2013

Local: Washington

Contratante: Banco Interamericano de Desenvolvimento

Principais características do projeto: apoiar o Banco na redação de uma nota técnica que sensibilize sobre: i) Relação existente entre a governança turística e sistemas de informação e estatísticas turísticas (SIETs); ii) a necessidade de reforçar a articulação no âmbito da informação e estatística turística entre os diferentes países da região de comparação; iii) a importância de contar com SIETs confiáveis e de qualidade para demostrar o impacto que turismo tem sobre as economia de ALC e as posibilidades que oferece ara o desenvolvimento.

Cargo: Consultor único encarregado da execução.

Atividades desempenhadas:

- Apoio ao Banco na elaboração de uma nota técnica que sensibilize sobre: i) a relação entre turismo governança e os sistemas de informações estatísticas do turismo (SIETs); ii) a necessidade de reforçar a articulação no domínio das informações estatísticas de turismo entre os países da região, por uma questão de comparabilidade, (iii) a importância da qualidade e confiança dos SIETs para demonstrar o impacto do turismo nas economias de ALC e as possibilidades que oferece para o desenvolvimento.

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47817859) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 157

TOCANTINS THE WORLD BANK

- Diagnóstico dos projetos do BID em America Latina y o Caribe. Diagnóstico da situação atual das estatísticas. Recomendações para a melhora das operações do SET. Adaptação do marco conceptual e operacional no nível subnacional

Nome da tarefa ou projeto: EL SALVADOR: Serviços profissionais para a concepção e implementação de um sistema de controlo automático dos movimentos dos turistas em fronteiras terrestres de El Salvador e do Aeroporto Internacional de El Salvador - pesquisa do perfil dos visitantes internacionais

Ano: 2017-atualidade

Local: El Salvador

Contratante: Corporacion Salvadoreña de Turismo

Principais características do projeto: Quantificar os fluxos de viajantes que entram em El Salvador identificando e caracterizando tanto o turismo receptico (Visitantes são residentes em El Salvador) como o turismo emisor (Visitantes residentes em El Salvador). Obter um perfil básico dos visitantes não residentes que ingressam em El Salvador (turismo receptivo) e dos residentes em El Salvador que viajam para outros países e destinos (turismo emisor) mediante uma série de levantamentos mostruais, que permitam conhecer as características básicas dos mesmos, determinar seu gasto turístico, a quantidade paga, por eles mesmos ou reembolsados por outros, para a aquisição e consumo de bens e serviços, para e durante suas viagens turismo.

Cargo: Diretor de Projeto

Atividades desempenhadas:

- Medição de turismo (turismo receptor e emissor) nas fronteiras terrestres e aéreas de El Salvador
- Desenvolvimento de uma consultoria para a adaptação para as recomendações internacionais para o turismo de uma serie de dados estatísticos sobre o turismo 2004-2008. Desenho metodológico da Pesquisa de turismo internacional (2008)
- Desenvolvimento de processos. Organização e operação de trabalhos de campo. (2008-2015).

Nome da tarefa ou projeto: EL SALVADOR: Desenho estatístico, desenvolvimento de software e treinamento para a pesquisa sobre turismo interno de El Salvador.

Ano: 2010

Local: El Salvador

Contratante: Corporación Salvadoreña del Turismo

Principais características do projeto: Diseño de amostra e questionario de pesquisa de turismo interno

Cargo: Diseño de Questionario

Atividades desempenhadas:

- Consultoria estatística, desenho e implementação do modulo de turismo interno no inquérito do agregado familiar.
- Desenho do questionário e da amostra, implementação de software estatístico, treinamento

Nome da tarefa ou projeto: HONDURAS: Sistema automatizado de coleta de informações sobre os

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47817859) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 158

movimentos de turistas nas fronteiras de Honduras

Ano: 2011-2012

Local: Honduras

Contratante: Instituto Hondurenho de Turismo

Principais características do projeto: Desenhar um sistema de informação para quantificar o turismo receptor e emissor em Honduras.

Cargo: Diretor de projeto

Atividades desempenhadas:

- Medição de turismo (turismo receptor e emissor) nas fronteiras de Honduras.
- Desenho metodológico da Pesquisa de turismo internacional (2011)
- Desarrolho e execução de processos. Pesquisa de Turismo Internacional (2012). Capacitação para os técnicos do IHT em desarrolho e execução de processos.

Nome da tarefa ou projeto: MERCOSUR + CHILE (ARGENTINA, BRASIL, CHILE, PARAGUAY, URUGUAY): PROJETO CONESUL - Projeto de Harmonização dos Sistemas de Estatísticas de Turismo para os Países do Cone Sul

Ano: 2010-2012

Local: ARGENTINA, BRASIL, CHILE, PARAGUAI, URUGUAI, CHILE

Contratante: Banco Interamericano de Desenvolvimento

Principais características do projeto: uniformização dos Sistemas de Estatísticas de Turismo na região

Cargo: Diretor de Projeto

Atividades desempenhadas:

- Teve como objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade das estatísticas turística dos países do Cone Sul e impulsionar a harmonização dos principais instrumentos de observação e mensuração da atividade turística nos países e na região do Cone Sul. o PROJETO CONESUL abordou a dimensão da governança centrada na oportunidade da criação da plataforma interinstitucional que, de um lado, permitirá a cooperação entre as principais instituições e agentes do setor de turismo em nível nacional e, de outro lado, contribuirá para garantir a sustentabilidade dos projetos nacionais de renovação estatística.
- 1 Coordenação; 2 Diagnóstico das principais operações estatísticas existentes em nível nacional; 3. Desenho de questionários das operações (demanda); 4. Recomendações aprovadas pelas delegações nacionais (demanda, oferta, emprego, contas nacionais, plataforma institucional)

Nome da tarefa ou projeto: GUATEMALA: Implementação de um sistema de contagem dos movimentos turísticos nas fronteiras da Guatemala. INGUAT.

Ano: 2009-2011

Local: Guatemala

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47817859) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 159

TOCANTINS THE WORLD BANK

Contratante: Instituto Guatemalteco de Turismo / Multivex

Principais características do projeto: Desenhar e implementar um sistema de informação para a medição do turismo receptor e emissor na Guatemala

Cargo: Especialista em sistemas de informação turísticas

Atividades desempenhadas:

- Medição de turismo (turismo receptor e emissor) nas fronteiras da Guatemala.
- Desenho metodológico da Pesquisa de turismo internacional Desenvolvimento de processos. Organização e operação de trabalhos de campo.

Nome da tarefa ou projeto: ESPAÑA The Spanish Inbound Tourism Study (FRONTUR) and the Expenditure Survey (EGATUR) 2001 - 2003, 2003 - 2005, 2005 – 2007, 2007 - 2008 and 2008 - 2009. Institute of Tourism Studies.

Ano: 1996-2009

Local: Espanha

Contratante: Instituto Estadístico de Turismo (IET)

Principais características do projeto: Quantificação e caracterização do turismo de entrada na Espanha

Cargo: Técnico encarregado da execução e analise de dados no projeto

Atividades desempenhadas: Análise do Projeto, tratamento de informação, elaboração de relatórios

Nome da tarefa ou projeto: SITCA – SECRETARIA DE INTEGRACIÓN TURISTICA CENTROAMERICANA (GUATEMALA, BELICE, HONDURAS, EL SALVADOR, NICARAGUA, COSTA RICA, PANAMÁ): Harmonização no recolhimento de informações sobre movimentos dos turistas em fronteiras terrestres dos países da América Central. SG-SICA. Sistema de Integración Centroamericana. October, 2007.

Ano: 2007-2008

Local: SICA

Contratante: SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN TURISTICA CENTROAMERICANA

Principais características do projeto: Harmonização no recolhimento de informações sobre movimentos dos turistas em fronteiras terrestres dos países da América Central

Cargo: Técnico especialista em sistema de informação turístico

Atividades desempenhadas:

- Harmonização regional dos sistemas de medição de fluxos turísticos nas fronteiras terrestres.
- Desenho metodológico da Pesquisa de turismo internacional: amostra, questionários, sistema de tratamento estatístico. Capacitação presencial e integrada, coordenação, desenho de comunidades temáticas.

Nome da tarefa ou projeto: GUATEMALA TSA: Fase preparatória para o desenvolvimento da conta satélite de turismo de Guatemala (CSTG). Inter – American Development Bank. Banco interamericano de

ibef-geo meridiano zero Mcrit

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47817859) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 160

TOCANTINS THE WORLD BANK

Desenvolvimento.

Ano: 2004-2006

Local: Guatemala

Contratante: Banco Interamericano de Desenvolvimento

Principais características do projeto: Análise e implementação das estatísticas turísticas necessárias para a realização de uma CST em Guatemala

Cargo: Especialista de campo

Atividades desempenhadas:

- Plano operacional para a implementação da base para o desenvolvimento de uma conta satélite de turismo piloto
- Desenho metodológico e questionários operação pesquisa turismo internacional, pesquisa turismo interno, inquéritos econômicos estruturais das indústrias Turísticas. Desarrolho e execução de processos. Treinamento. Organização e operação de trabalhos de campo.

e) **13. Certificado:**

Certifico, segundo meu conhecimento e entendimento, que este currículo descreve corretamente minha pessoa, minhas qualificações e minha experiência. Entendo que qualquer declaração voluntariamente falsa aqui incluída pode resultar na minha desqualificação ou no cancelamento de meu trabalho, se for contratado.

Pedro Aramburu Calafel 20/07/2017

Nome do Profissional Assinatura

ibef-geo meridiano zero Mcrit

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47817859) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 161

APÊNDICE C - DISCRIMINAÇÃO DO PREÇO DO CONTRATO

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47817859) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 162

TUCANTINS THE WORLD BANK

TECH 6 - CV ESPECIALISTA EM ESTATÍSTICA

1. Cargo proposto: Especialista em Estatística

2. Nome da empresa: iber-geo

3.Nome do profissional: Grazia Burman

4.Data de nascimento: 09 de maio de 1952 **Nacionalidade:** Italiana/Brasileira (dupla cidadania)

5. Educação:

- GRADUAÇÃO: MATEMÁTICA, pela Faculdade de Filosofia Ciências e Letras Santo André em 1973

- MESTRE EM PLANEJAMENTO TERRITORIAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL na UCSal – Universidade Catolica do Salvador em 2007. Título da dissertação: Análise Comparada de Programas de Formação Profissional Rural no Baixo Sul da Bahia.

- **PÓS GRADUAÇÃO: Cursou o Mestrado em ESTATÍSTICA APLICADA** pela Universidade de São Paulo (USP) como aluna regular nos cursos de Modelos Lineares e Técnicas de Amostragem em 1974-1975..

-EXTENSÃO - Fundação Santo André

Pesquisa Operacional I - Estatística II

-EXTENSÃO- CEPOM

Metodologia do Ensino Superior em 1999

-PÓS GRADUAÇÃO: Curso de Projetos – CPE – Centro de Projetos e Estudos 1988, 360 horas

-PÓS GRADUAÇÃO: Consultoria do ILPES – Contabilidade Social e Regional 1983-1986

-PÓS GRADUAÇÃO – do Mestrado da Ciência da Informação – UFBA. Como aluna especial nas disciplinas de: Economia da Informação e da Comunicação, Informação para Negócios e Prospectiva Tecnológica e Inteligência Competitiva, em 2003.

-PÓS- GRADUAÇÃO - AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL – Ministério de Relações Exteriores da República Italiana, OIT e SENAR em 2005.

-PÓS-GRADUAÇÃO – Curso de Desenvolvimento Profissional sobre Mercados Informais de Solo e Regularização de Assentamentos na América Latina em 2012.

6. Associações profissionais às quais pertence: SINOPEC

7. Outras especialidades:

-Curso de Análise de Sistemas e Programação G.P.D. Rodhia

-IV Seminário de Metodologia de Índice de Preços ao Consumidor

-Curso de Projetos -CPE 360 horas

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47817859) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 163

-Autora e debatedora no XVII Encontro Nacional de Economia- ANPEC.

-I Simpósio Latino- Americano de Docentes e Pesquisadores Científicos de Turismo.

-Apresentação na Associação Nacional de Centros de Pós-Graduação em Economia- ANPEC como debatedora e autora da Pesquisa Emprego na Agricultura Irrigada. 1989. Fortaleza.

-Apresentação no I Simpósio Latino Americano de Docentes e Pesquisadores de Turismo, como autora do trabalho: Turismo- Fonte de Receitas para a Bahia.

-Trabalho para publicação e apresentação aceito no INTERCOM, 1999. Impactos da Cultura no PIB da Bahia.

7. Países onde teve experiência de trabalho: Brasil

8.Idiomas

Idioma	Ler	Falar	Escrever
Italiano	Bom	Bom	Bom
Francês	Bom	Bom	Bom
Espanhol	Bom	Bom	Bom
Inglês	Bom	Bom	Bom

9. Histórico dos Serviços:

De: 2012 Até: 2014
Empresa: CETIND - SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.
Cargo ocupado: Professora de Matemática e Física nos Departamentos de Produção, Meio Ambiente, Petróleo e Gas e EAD.
Tarefas realizadas:: Professora Matemática

De: 2010 Até: 2010
Empresa: FEA – Faculdade de Administração da Bahia
Cargo ocupado: Consultora do Plano de Turismo Náutico da Bahia de Todos os Santos
Tarefas realizadas: Pesquisa de mercado, análise SWOT e Estudo de Demanda Turística na BTS

De: 2010 Até: 2011
Empresa: FUNDAÇÃO ODEBRECHT
Cargo ocupado: Consultora da UNDESA – ONU
Tarefas realizadas: Elaboração de Método de Alfabetização de Adultos em áreas Rurais

De: 1997 Até: 2010
Empresa: UCSAL- UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SALVADOR
Cargo ocupado: Professora de Econometria na Faculdade de Ciências Econômicas da UCSal
Tarefas realizadas: Professora de econometria e orientatora de monografias.

De: 2005 Até: 2006
Empresa: SENAR –Brasília – Pesquisa SADES – Sistema de Avaliação de Desempenho do SENAR

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47817859) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 164

TOCANTINS THE WORLD BANK

Cargo ocupado: Consultora estatística para pesquisa de egressos.
Tarefas realizadas: Representar na OIT as Pesquisas do SENAR no Brasil e na Bahia para Pesquisa de Egressos.

De: 2004 Até: 2004
Empresa: SENAR-Ba – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
Cargo ocupado: Consultora da pesquisa de egressos dos cursos do SENAR
Tarefas realizadas:Pesquisa de Demanda e Imagem do SENAR nos Municípios da Bahia.

De: 1996 Até: 1998
Empresa: UNIFACS- FACULDADES SALVADOR
Cargo ocupado: Professora de Estatística para o Turismo e Teoria e Técnica do Turismo e Supervisora do Convênio entre a SETRAS e a FACS, na capacitação de mão-de--obra em turismo.
Tarefas realizadas. Orientar a elaboração de conteúdos e indicar necessidades de qualificação e requalificação de mão-de-obra no setor turismo na Bahia. Ministrar palestras aos alunos e supervisionar a qualidade técnica dos trabalhos.

De: 1995 Até: 1995
Empresa: Secretaria da Indústria Comércio e Mineração da Bahia
Cargo ocupado: Gerente de Indústria
Tarefas realizadas:Atração de Investimentos Industriais na Bahia.

De: 1994 Até: 1994
Empresa: UNIBAHIA - Unidade Baiana de Ensino, Pesquisa e Extensão
Cargo ocupado: Coordenadora de Pesquisa
Tarefas realizadas. Demanda por Cursos no SENAI e projeções .

De: 1994 Até: 1994
Empresa. FACS-FACULDADES SALVADOR
Cargo ocupado: Professora do Curso de Turismo
Tarefas realizadas: Professora na disciplina de "Teoria e Técnica do Turismo" e "Estatística Aplicada"

De: 1994 Até: 1994
Empresa: SEI - SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DA BAHIA - SEPLANTEC
Cargo ocupado: Assessora Técnica
Tarefas realizadas: Elaboração dos artigos publicados na Revista Bahia Análise e Dados, entre eles: Turismo Interno Fonte de Receitas Seguras para a Bahia, Porto Seguro na Dianteira do Turismo da Bahia, e autora permanente da Revista Retrospectiva Anual no setor de turismo, e análise econômica da revista Conjuntura e Planejamento.
-Coordenadora da Pesquisa em convênio com o BNB "Consumo de Produtos Industrializados em Salvador".
-Responsável pelo release mensal Desempenho da Hotelaria Classificada em Salvador, convênio entre o CEI e a Bahiatursa.
- Responsável pela pesquisa mensal e "release" do Comércio Varejista de Salvador.

De: 1994 Até: 1994
Empresa: Faculdade de Turismo da Bahia- CEPOM.
Cargo ocupado. Professora do Curso de Pós- Graduação em Turismo
Tarefas realizadas: Professora na Disciplina " Tendências do Turismo ".

De: 1994 Até: 1994
Empresa: COPAGRI- Coordenação de Economia Agrícola - SECRETARIA DA AGRICULTURA

ibet-geo meridiano zero Mcrit

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47817859) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 165

TOCANTINS THE WORLD BANK

Cargo ocupado: Gerente de indicadores
Tarefas realizadas: Elaboração das revistas " Agricultura em Destaque e Boletim da Copagri"

De: 1994 Até: 1994
Empresa: CPE - Centro de Projetos e Estudos - SEPLANTEC
Cargo ocupado:
Tarefas realizadas: Elaboração e publicação das revistas: Projeção da Demanda de Fertilizantes no Nordeste e Uso da Programação Linear na Agricultura Irrigada.

De: 1994 Até: 1994
Empresa: CEI - Centro de Estatística e Informações - SEPLANTEC - Secretaria do Planejamento
Cargo ocupado: Coordenadora
Tarefas realizadas: Montagem do Sistema de Contabilidade Social do Estado da Bahia

De: 1994 Até: 1994
Empresa: CPE - Centro de Planejamento e Estudos- SEPLANTEC - Secretaria do Planejamento, Ciência e Tecnologia
Cargo ocupado: Coordenadora
Tarefas realizadas: Acompanhar mensalmente a conjuntura econômica e aprofundamento global da economia baiana e suas interrelações com o Nordeste e Brasil, publicando o boletim Informe Conjuntural da Bahia.

De: 1977 Até: 1994
Empresa: CEPLAB - Fundação Centro de Planejamento e Estudos- SEPLANTEC
Cargo ocupado: Técnica Estatística / Superintendente
Tarefas realizadas: Responsável pela emissão do Índice de Preços ao Consumidor de Salvador " e sua publicação mensal.
- Responsável pela coleta, cálculos e análise da "Sondagem Industrial da Bahia", bem como a publicação da revista trimestral "Sondagem da Indústria de Transformação ".

ARTIGOS E TRABALHOS PUBLICADOS

BURMAN, Grazia e GUIMARÃES, José Ribeiro Soares. *A Geração de Empregos na Bahia*, Bahia Investimentos, Salvador Ano IV N 2 abr/1997.

BAHIA ANÁLISE & DADOS. *Turismo na Bahia Crescimento e Perspectivas* , CEI, v.4 n2/3 p113 Salvador 1994.

_____, *As Novas Tendências do Turismo*, SEI v.5 n 3 p 119-124 dezembro Salvador dezembro 1995.

_____, *O Produto Turístico Salvador*.SEI v.6 n 4 p 93-100 Salvador março 1997.

CONJUNTURA & PLANEJAMENTO, *Concentração Fundiária na Bahia*, SEI, n 32 Salvador janeiro 1997.

_____, *Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista de Salvador: Aspectos Metodológicos*, SEI n37 Salvador jun.1997.

_____, *Municipalização Turística. Os Exemplos de Porto Seguro e Belmonte* SEI n30 Nov. Salvador, 1996.

BURMAN, Grazia, *Metodologia para a Estimativa da Formação Bruta de Capital Fixo*, Bahia Investimentos- Salvador janeiro 1996.

ibef-geo meridiano zero Mcrit

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47817859) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 166

BURMAN, Grazia, FREITAS, Agnaldo Paiva. *O Índice de Preços ao Consumidor e as Fases do Processamento de Dados*- Séries Especiais CEI- 15 anos de IPC /Salvador.

BNB-BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. *Consumo de Produtos Industriais na Cidade de Salvador*-CEI Salvador 1994.

BURMAN, Grazia e MOREIRA, Vania Maria. *15 Anos de Custo de Vida e as Principais Modificações do Novo IPC*. Séries Especiais CEI- 15 anos de IPC Salvador.

GÓIS, Zélia Maria Abreu e GRAZIA, Burman. *Relações de Emprego na Irrigação- Um Estudo de Caso: Região de Juazeiro (BA)*. SÉRIE ESTUDOS E PESQUISAS –N 8 Salvador junho 1989.

BURMAN, Grazia. *Impactos da Cultura na Economia da Bahia: Participação no Gasto Turístico e Consumo de Residentes e Governo*. Turismo & Análise, São Paulo 9(2) 70-87 nov. 1998.

CONSULTORIAS REALIZADAS

Nome da tarefa ou projeto: PLANO DIRETOR 2000 - ESTUDO DE ATUALIZAÇÃO DO QUADRO CULTURAL DE SALVADOR- Prefeitura Municipal de Salvador PLANO DIRETOR 2000

Ano: 2000-2000

Local: Salvador

Contratante: Prefeitura de Salvador

Principais características do projeto: Elaborar e Georeferenciar o quadro da Cultura em Salvador identificando os investimentos culturais na cidade

Cargo: Coordenadora

Atividades desempenhadas: Pesquisa de mercado de productos culturais em Salvador e georeferenciamento do patrimonio cultural e proposta de projetos de Leis culturais

Nome da tarefa ou projeto: Estimativas da população de todos os municipios baianos até 2020, população urbana e rural

Ano: 2002-2002

Local: Salvador

Contratante: HYDROS Engenharia

Principais caracteristicas do projeto: Eatudos demográficos e projeções.

Cargo: Consultora.

Atividades desempenhadas: Calculos demográficos

Nome da tarefa ou projeto: Estimativas da população de Salvador para a EMBASA

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47817859) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 167

TOCANTINS THE WORLD BANK

Ano: 1996-1996

Local:

Contratante: HYDROS Engenharia

Principais características do projeto: Estudos demográficos e projeções.

Cargo: Consultora.

Atividades desempenhadas: Cálculos demográficos

Nome da tarefa ou projeto: Banco do Nordeste S.A. Consumo de Produtos Industriais na Cidade de Salvador-CEI
Ano: 1994-1994
Local: Salvador
Contratante: Banco do Nordeste do Brasil
Principais características do projeto: Pesquisa de Consumo de Produtos Industriais em Salvador

Cargo: Coordenadora

Atividades desempenhadas: Cálculos econométricos e demográficos

---

Nome da tarefa ou projeto: Estudo da demanda de água consumida pela população de Salvador E
Ano: 2000-2000
Local: Salvador
Contratante: GEOHYDRO ENGENHARIA
Principais características do projeto: Cálculos econométricos e projeções de demanda da agua em Salvador.

Cargo: Consultora

Atividades desempenhadas: Cálculos econométricos e demográficos

---

Nome da tarefa ou projeto: Análise de Viabilidade Econômico-Financeira do Projeto de Coleta de Resíduos Sólidos do Município de Porto Seguro

Ano: 1998-1998
Local: Porto Seguro
Contratante: CONDER UFC/Engenharia
Principais características do projeto: Estudos de demanda

Cargo: Consultora

Atividades desempenhadas: Análise de Viabilidade Econômico-Financeira

---

Nome da tarefa ou projeto: Análise de Viabilidade Econômico-Financeira do Projeto de Coleta de Resíduos Sólidos do Município de Santa Cruz Cabrália

Ano: 1998-1998
Local: Santa Cruz Cabrália
Contratante: CONDER UFC/Engenharia

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47817859) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 168

TOCANTINS THE WORLD BANK

Principais características do projeto: Estudos de demanda

Cargo: Consultora

Atividades desempenhadas: Análise de Viabilidade Econômico-Financeira

Nome da tarefa ou projeto: Análise de Viabilidade Econômico-Financeira do Projeto de Coleta de Resíduos Sólidos do Município de Belmonte

Ano: 1998-1998

Local: Belmonte

Contratante: CONDER UFC/Engenharia

Principais características do projeto:Estudos de demanda

Cargo: Consultora

Atividades desempenhadas: Análise de Viabilidade Econômico-Financeira

Nome da tarefa ou projeto: Elaboração do Plano de Turismo Náutico da Baía de Todos os Santos – Coordenado pela FEA- UFBA para a Secretaria de Turismo da Bahia e Ministério do Turismo

Ano: 2009-2009

Local: Salvador

Contratante: Secretaria de Turismo da Bahia

Principais características do projeto: Estudos do Perfial da Denanda do turismo náutico na BTS e investimentos .

Cargo: Técnica

Atividades desempenhadas: Análise da demanda e caracterização do perfil.

13. Certificado:

Certifico, segundo meu conhecimento e entendimento, que este currículo descreve corretamente minha pessoa, minhas qualificações e minha experiência. Entendo que qualquer declaração voluntariamente falsa aqui incluída pode resultar na minha desqualificação ou no cancelamento de meu trabalho, se for contratado.

GRAZIA BURMAN Data: 5 de maio de 2017

ibef-geo meridiano zero Mcrit

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47817859) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 169

TOCANTINS THE WORLD BANK

TECH 6 - CV ESPECIALISTA EM TURISMO

1. Cargo proposto Especialista em Turismo

2. Nome da empresa : IBERGEO CONSULTING

3.Nome do profissional : Fabio Montanheiro Alves do Nascimento

4.Data de nascimento: 08/12/1980 Nacionalidade: Brasil

5.Educação:

Instituição (Data) de- (Data) até	Titulo(s) o Diploma(s) obtidos:
Universidade Anhembi-Morumbi (2001/2005)	Graduação em Turismo
Universidade de São Paulo (2005/2006)	Especialização em Marketing Turistico
Fundação Getúlio Vargas (2010)	Especialização em Pesquisas em Turismo
Fundação Instituto de Administração/ Universidade de São Paulo (2010)	Especialização em Gerenciamento de Projetos

11. Associações profissionais às quais pertence Membro do Conselho de Turismo da Federação do Comércio de São Paulo (FecomercioSP)

12. Outras especialidades.

Membro fundador do Observatório de Turismo e Eventos, premiado departamento de estudos e pesquisa e unico da categoria na America do Sul membro da Organização Mundial do Turismo

Especialista em metodologias de impacto econômico, com conhecimentos avançados em geointeligência, analise espacial e design infográfico.

Mais de 16 anos de experiência no setor de viagens em turismo

13. Paises onde teve experiência de trabalho: Brasil e Estados Unidos

14. Idiomas (Indicar bom, regular ou fraco)

Idioma	Ler	Falar	Escrever
Português	B	B	B
Inglês	B	B	B
Espanhol	B	B	B

ibergeo meridiano zero Mcrit

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47817859) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 170

TOCANTINS THE WORLD BANK

15. Histórico dos Serviços

De: 2015 Até: Atualmente

Empresa: São Paulo Turismo S/A

Cargo desempenhado: Coordenador Geral

Responsável pelo departamento de pesquisa, gerenciando uma equipe de 3 colaboradores e um orçamento de pesquisa de R$ 1,2 milhão/ ano. Mais de 100 pesquisas publicadas, incluindo Eventos importantes, tais como Grande Prêmio do Brasil de F1, Carnaval, Lollapalooza Festival e Virada Cultural, diagnósticos para dois Planos Municipais Turismo (2010-2014 e 2015-2018) e a Sala de Monitoramento do Turismo para a Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014™. Desenvolvimento de metodologias completas para pesquisas, impacto econômico do turismo na cidade, coleta de dados em diversos setores, incluindo hotéis, agências de viagens, atrações, parques, bares e restaurantes, entre outros. O Observatório do Turismo de Eventos é o creditado como primeira iniciativa de investigação de turismo sólida do Brasil e único do gênero na América do Sul a integrar o Núcleo Internacional de Observatórios de Turismo Sustentável das Nações Unidas (UNSTO/UNWTO).

De: 2009 Até: 2014

Empresa: São Paulo Turismo S/A

Cargo Desempenhado: Coordenador Técnico

De: 2006 Até: 2009

Empresa: São Paulo Turismo S/A

Cargo desempenhado: Analista

De: 2002 Até: 2003

Empresa: Walt Disney World Resorts Florida

Cargo desempenhado: Merchandise Host

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47817859) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 171

TOCANTINS THE WORLD BANK

11. Tarefas atribuídas: levantamento de dados, analise de fontes e elaboração do Boletim de Desempenho Economico do Turismo

12.Serviços prestados que melhor demonstram a capacidade para executar as tarefas atribuídas

São Paulo: Cidade do Mundo - Dados e fatos sobre o setor de viagens, turismo, eventos e negocios na capital paulista

jun de 2017 – dez de 2017

Descrição do projeto

Construído em parceria entre a São Paulo Turismo (SPTuris), o São Paulo Convention & Visitors Bureau (SPC&VB) e as mais diversas entidades ligadas ao turismo paulistano, o documento traz os números oficiais do setor de turismo e eventos da cidade no ano de 2017.

Pesquisa de Demanda Turística - Cidade de São Paulo

fev de 2015 – nov de 2015

Descrição do projeto

Perfil de demanda turística realizada nas principais vias de acesso à cidade de São Paulo, tais como terminais de ônibus, três aeroportos e estradas principais que dão acesso a cidade. O estudo inédito teve como objetivo traçar o perfil do turista que visita a capital do estado e seus hábitos de consumo, enquanto na cidade.

Plano de Turismo Municipal

jan de 2014 – jan de 2015

Descrição do projeto

Elaboração dos diagnósticos para o Plano Municipal de Turismo da Cidade de São Paulo, com diretrizes, analyses de Mercado e diagnósticos voltados ao segmento de viagens, eventos e negocios do turismo na capital paulista

Perfil do Torcedor - FIFA Brazil 2014 World Cup

jun de 2014 – ago de 2014

Descrição do projeto

7.683 entrevistas válidas aplicadas com os moradores, visitantes e turistas que estavam na cidade de São Paulo durante a Copa do Mundo. Este é um perfil completo dos torcedores, com hábitos de consumo para o evento, atividades na cidade, avaliação de São Paulo e outros dados importantes

ibef-geo meridiano zero Mcrit

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47817859) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 172

TOCANTINS THE WORLD BANK

Central de Monitoramento do Turismo - FIFA Brazil 2014 World Cup

Jun de 2014 – jul de 2014

Descrição do projeto

O objetivo principal do projeto foi disponibilizar aos interessados por dados diários sobre os impactos da Copa do Mundo da FIFA 2014 na cidade de São Paulo, um banco de dados organizado e facilmente pesquisável sobre os indicadores para o evento, o movimento de torcedores, turistas hábitos de consumo, perfil sócio-demográfico e serviços diretamente relacionados e indiretamente para o evento.

Anuário Estatístico do Turismo Paulistano

Edições 2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016

Julho 2009 – Janeiro 2017

A compilação de dados do turismo na cidade de São Paulo é projeto pioneiro. O documento inclui dados principais do setor, como a cobrança de impostos, ocupação hoteleira, as chegadas de turistas, principais atrações visitadas e turistas gastaram durante a estadia. Este é o primeiro Anuano Estatístico de um destino no Brasil.

13. Certificado:

Certifico, segundo meu conhecimento e entendimento, que este currículo descreve corretamente minha pessoa, minhas qualificações e minha experiência. Entendo que qualquer declaração voluntariamente falsa aqui incluída pode resultar na minha desqualificação ou no cancelamento de meu trabalho, se for contratado.

Data: 6 de junho de 2018

Fabio Montanheiro Alves do Nascimento

ibeGeo meridiano zero Mcrit

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47817859) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 173

TUCANTINS THE WORLD BANK

FORMULÁRIO FIN – 2 – RESUMO DE CUSTOS

Item	Custo Total EUR (€)
Custo da Proposta Financeira	
Incluindo	
(1) Remuneração de Pessoal	170 350,00
(2) Despesas Reembolsáveis	44 800,00
Valor Total da Proposta de Preço	215 050,00
Impostos Locais	
(a) Impostos Municipais	53 762,50
Total	268 812,50

iberogeo meridiano zero Mcrit

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47817859) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 174

TOCANTINS THE WORLD BANK

FORMULÁRIO FIN - 3 - DISCRIMINAÇÃO DE REMUNERAÇÃO

Nº	Nome	Cargo		Tarifa Pessoa-Mês		Insumo de tempo em Pessoa/Mês	Total EUR (€)
EQUIPE CHAVE							
E-1	Jeanine PIRES	Coordenação Geral	Sede	€	6 500,00	4,00	26.000,00
			Campo				
E-2	Pedro ARAMBURU	Especialista em Economia Ambiental	Sede	€	6 500,00	3,50	22.750,00
			Campo				
E-3	Gisela BURKART	Especialista em estatísticas	Sede	€	4 000,00	3,00	12.000,00
			Campo				
E-4	Fabio NASCIMENTO	Especialista em turismo	Sede	€	4 000,00	3,00	12.000,00
			Campo				
EQUIPE DE APOIO							
N-1	Judith MUNIZ	Aconselhamento jurídico do contrato	Sede	€	6 500,00	5,00	32.500,00
			Campo				
N-2	Ana RIVAS	Especialista em Observatórios Turísticos	Sede	€	6 500,00	4,00	26.000,00
			Campo				
N-3	Efraim ZABALA	Especialista em SIG e ferramentas informáticas	Sede	€	6 500,00	4,00	26.000,00
			Campo				
N-4	Marina GALVANA	Especialista em desenho gráfico	Sede	€	3 000,00	1,00	3.000,00
			Campo				
N-5	A DETERMINAR	Pessoal local de apoio	Sede	€	2 500,00	4,00	10.000,00
			Campo				
Total							170.250,00

iberGeo meridiano zero Mcrit

27

Anexo 23_6_Anexo_V_Contrato 19_2019_Observatorio (47817859) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 175

CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Preço Global

Nome do Projeto:
MULTISSETORIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO PARANÁ

Serviço de Consultoria:
ELABORAÇÃO DO PLANO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO LITORAL DO ESTADO DO PARANÁ – PDS_LITORAL

Empréstimo nº 8201-BR

Contrato SEPL nº 004/2017

Entre

ESTADO DO PARANÁ, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

E

CONSÓRCIO LITORAL SUSTENTÁVEL

DATA: 19 de dezembro de 2017

Protocolo n° 14.979.690-8 **SBQC n° 002/2015**

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n° - 4° andar - Ala C - 80.530-140 - Curitiba - Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 - Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 176

I. CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA – Preço Global

Este CONTRATO (doravante denominado o "Contrato") celebrado **no dia 19 de dezembro de 2017,** entre, por um lado, o **ESTADO DO PARANÁ**, por meio **da SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPL**, inscrita sob o CNPJ nº 76.416.916/0001-99, com sede na Rua Jacy Loureiro de Campos s/nº, Palácio das Araucárias, 4º andar - Ala C, Centro Cívico, CEP 80.530-140, Curitiba - Paraná/Brasil, neste ato, representada por seu titular Senhor JURACI BARBOSA SOBRINHO, R.G. nº 1.034.066-7/PR e inscrito no CPF nº 201.576.909-97 doravante denominado o "**CLIENTE**" e, por outro lado, o **CONSÓRCIO LITORAL SUSTENTÁVEL,** inscrito sob o CNPJ **nº 28.705.520/0001-19,** com sede Av. santos Dumont, 2456 - sala 210, bairro Aldeota, CEP 60.150.162, Fortaleza - Ceará/Brasil, formado(a) pelas seguintes empresas, cada uma das quais será responsável conjunta e solidariamente perante o CLIENTE por todas as obrigações assumidas pelo Consultor, em conformidade com este Contrato, ou mais especificamente:

a) **BARCELONA BRASIL GROUP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA**, inscrita sob o CNPJ nº 14.874.952/0001-31, com sede na Rua Alice de Souza Lima, 303 - Jardim do Alto - CEP 04823-470, São Paulo - São Paulo/Brasil;
b) **MCRIT, S.L.**, pessoa jurídica de direito privado devidamente registrada no Registro Comercial de Barcelona, folha 44, tomo 9.496, livro 8.679, e regularmente inscrita no CIF sob o nº B58677428, com sede na Rua Salvador Espriu, local 4 nº 83, Barcelona - Espanha;
c) **QUANTA CONSULTORIA LTDA.**, inscrita sob o CNPJ nº 05.314.789/0001-79, com sede na Avenida Santos Dummont, 2456, salas 204, 205 e 206, bairro Aldeota, CEP 60.150-16, Fortaleza - Ceará/Brasil; e
d) **HIDRIA, CIENCIA, AMBIENTE Y DESARROLLO S.L.**, inscrita no Registro Mercantil de Pontevedra - Espanha, com protocolo nº 2006/1366/N/31/05/2006 e com código de identidade fiscal (CIF) nº B-36974988, com sede na Rua Ortigosa, 14, 3º escritório 23 (08003), Barcelona - Espanha.

A liderança do **CONSÓRCIO LITORAL SUSTENTÁVEL** será exercida pela empresa **BARCELONA BRASIL GROUP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA**, neste ato representada pela Senhora MARINA CABREIRA BASTOS, inscrita no CPF sob o nº 046.736.586-55 e o Senhor MARCELO MARCOS DA SILVA FONSECA, inscrito no CPF sob o nº 128.072.088-35, com poderes para em conjunto ou

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 177

isoladamente assinarem o presente contrato, doravante denominado o "**CONSULTOR**".

CONSIDERANDO QUE

a) o CLIENTE tenha solicitado ao CONSULTOR o fornecimento de determinados serviços de consultoria conforme definidos neste Contrato (doravante denominados "Serviços");

b) o CONSULTOR, tendo declarado ao CLIENTE possuir as habilidades profissionais necessárias, conhecimento especializado e recursos técnicos, concordou em prestar os Serviços nos termos e condições definidos neste Contrato;

c) o CLIENTE recebeu um empréstimo do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) em relação ao custo dos Serviços e pretende aplicar uma parte dos resultados deste empréstimo em pagamentos elegíveis sob este Contrato, sabendo que (i) Os pagamentos por parte do Banco Mundial serão efetuados apenas a pedido do CLIENTE e com a aprovação do Banco Mundial; (ii) Tais pagamentos estarão sujeitos, em todos os aspectos, aos termos e condições do acordo de empréstimo, incluindo as proibições de retirada da conta de empréstimo para efetuar qualquer pagamento a pessoas ou entidades, ou para qualquer importação de mercadorias, se tal pagamento ou importação, quando de conhecimento do Banco Mundial, for proibido por decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas descrito no Capítulo VII da Carta das Nações Unidas; (iii) Nenhuma parte, a não ser o CLIENTE, deverá obter quaisquer direitos do acordo de empréstimo ou fazer alguma solicitação de recursos de empréstimo;

AS PARTES têm por justo e acordado o seguinte:

1. Os seguintes documentos anexos serão considerados como parte integrante deste Contrato:
   a) As Condições Gerais do Contrato (inclusive o Anexo 1 "Política do Banco - Fraude e Corrupção");
   b) As Condições Especiais do Contrato;
   c) Apêndices:
      - Apêndice A: Termos de Referência e Cronograma de Atividades
      - Apêndice B: Especialistas Principais
      - Apêndice C: Discriminação de Preços do Contrato
      - Apêndice D: Formulário de Garantia de Adiantamentos

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - 4º andar - Ala C - 80.530-140 - Curitiba - Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 - Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 178

No caso de qualquer inconsistência entre os documentos, a seguinte ordem de prioridade deve prevalecer: as Condições Especiais do Contrato; as Condições Gerais do Contrato, incluindo Anexo 1; Apêndice A; Apêndice B; Apêndice C; Apêndice D. Qualquer referência a este Contrato deve incluir, onde o contexto permitir, uma referência a seus Apêndices.

2. Os direitos e obrigações do CLIENTE e do CONSULTOR serão aqueles estabelecidos no Contrato, em particular:
   1. o CONSULTOR prestará os Serviços de acordo com as disposições do Contrato; e
   2. o CLIENTE efetuará os pagamentos ao CONSULTOR de acordo com as disposições do Contrato.

3. Pela execução do Contrato pelo Consultor, o Cliente se dispõe a fazer pagamentos que não excedam os valores globais do contrato **de R$ 3.260.177,77 (três milhões, duzentos e sessenta mil, cento e setenta e sete reais e setenta e sete centavos) e € 485.557,89 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e sete euros e oitenta e nove centavos)**, incluindo impostos locais indiretos, de acordo com as Condições Especiais do Contrato, que correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
   Órgão orçamentário: 23 – Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral
   Unidade orçamentária: 02 Diretoria Geral
   Projeto/Atividade: 3039 Projeto Multissetorial – Componente II – Assistência Técnica
   Natureza da despesa: 3390.3500 – Serviços de Consultoria
   Fonte: 142 – Operação de Crédito Externo/BIRD

EM TESTEMUNHO DO QUE, as Partes assinam o presente Contrato em seus respectivos nomes, no dia e ano acima indicados.

Em nome do ESTADO DO PARANÁ

Juraci Barbosa Sobrinho
SECRETÁRIO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 179

Para e em nome do CONSÓRCIO LITORAL SUSTENTÁVEL

Marina Cabreira Bastos

Marina Cabreira Bastos Marcelo Marcos da Silva Fonseca

Representantes Legais do
CONSÓRCIO LITORAL SUSTENTÁVEL

Testemunhas:

Nome
CPF nº

Nome
CPF nº

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - 4º andar - Ala C - 80.530-140 - Curitiba - Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 - Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 180

SUMÁRIO

I. CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA – Preço Global 2

SUMÁRIO 6

II. CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO 8

A. DISPOSIÇÕES GERAIS 8
1. Definições 8
2. Relacionamento entre as Partes 9
3. Legislação Aplicável 9
4. Idioma 9
5. Títulos 9
6. Comunicações 9
7. Local 10
8. Autoridade do Membro Líder 10
9. Representantes autorizados 10
10. Práticas corruptas e fraudulentas 10
a. Comissões e honorários 10
B. INÍCIO, CONCLUSÃO, MODIFICAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO 10
11. Vigência do Contrato 10
12. Rescisão do Contrato por Falta de Entrada em Vigor 11
13. Início dos serviços 11
14. Encerramento do Contrato 11
15. Totalidade do Acordo 11
16. Modificações ou Variações 11
17. Força Maior 11
a. Definição 11
b. Não constitui violação do contrato 12
c. Medidas a serem adotadas 12
18. Suspensão 13
19. Rescisão 13
a. Pelo Cliente 13
b. Pelo Consultor 14
c. Cessação dos Direitos e Obrigações 14
d. Cessação dos Serviços 15
e. Pagamento na Rescisão do Contrato 15
C. OBRIGAÇÕES DO CONSULTOR 15
20. Disposições Gerais 15
a. Padrão de Desempenho 15
b. Legislação Aplicável aos Serviços 15
21. Conflito de Interesses 16
a. O Consultor não deve se beneficiar de comissões, descontos, etc. 16
b. O Consultor e seus Associados não poderão participar de certas atividades 16
c. Proibição de Atividades Conflitantes 17
d. Dever restrito de divulgar atividades conflitantes 17
22. Confidencialidade 17
23. Responsabilidade do Consultor 17
24. Seguro a ser obtido pelo Consultor 17
25. Contas, Inspeção e Auditoria 17

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº – 4º andar – Ala C - 80.530-140 – Curitiba – Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 – Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 181

26. Obrigações de apresentar relatórios 18
27. Direitos de propriedade do Cliente nos relatórios e registros 18
28. Equipamentos, Veículos e Materiais 18
D. Especialistas do Consultor e Subconsultores 19
29. Descrição de Especialistas principais 19
30. Substituição Especialistas Principais 19
31. Remoção de Especialistas ou Subconsultores 19
E. Obrigações do Cliente 19
32. Assistência e Isenções 19
33. Acesso ao Local do Projeto 20
34. Mudança na Legislação Aplicável Relativa a Impostos e Taxas 20
35. Serviços, instalações e bens do Cliente 21
36. Equipe de Contrapartida 21
37. Obrigação de pagamento 21
F. Pagamentos ao Consultor 21
38. Preço do Contrato 21
39. Impostos e Direitos 21
40. Moeda de Pagamento 21
41. Forma de Cobrança e de Pagamento 22
42. Juros sobre Pagamentos Atrasados 23
G. Equidade e Boa-Fé 23
43. Boa Fé 23
H. Resolução de Conflitos 23
44. Solução Amigável 23
45. Solução de controvérsias 23

II. CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO 24

ANEXO 1: POLÍTICA DO BANCO MUNDIAL – PRÁTICAS CORRUPTAS E FRAUDULENTAS 24

III. CONDIÇÕES ESPECIAIS DO CONTRATO 26

IV. APÊNDICES 32

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº – 4º andar – Ala C - 80.530-140 – Curitiba – Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 – Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 182

II. CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO

A. DISPOSIÇÕES GERAIS

1. Definições

1.1. A menos que o contexto exija de outra forma, as expressões e termos abaixo terão, para a finalidade do contrato, os seguintes significados:

a) "Diretrizes Aplicáveis" são as Diretrizes para Seleção e Contratação de Consultores em Empréstimos do BIRD e os Créditos e Subsídios da AID por parte dos Mutuários do Banco Mundial, datados de janeiro de 2011.

b) "Legislação Aplicável" significa as leis e quaisquer outros instrumentos que tenham força de lei no país do Cliente ou em qualquer outro país especificado nas Condições Especiais do Contrato (CE), que possam ser aprovadas e estar em vigor periodicamente.

c) "Banco" significa o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e a Associação Internacional de Desenvolvimento (AID).

d) "Mutuário" significa o Governo, órgão do Governo ou outra entidade que assine o contrato de financiamento com o Banco.

e) "Cliente" significa a agência executora que assina o Contrato para os Serviços com o Consultor Selecionado.

f) "Consultor" significa uma empresa de consultoria ou entidade legalmente constituída selecionada pelo Cliente para fornecer os Serviços nos termos do Contrato assinado.

g) "Contrato" significa o acordo obrigatório por escrito, assinado entre o Cliente e o Consultor e que inclui todos os documentos anexos listados no parágrafo 1 da Minuta do Contrato (as Condições Gerais (CG), as Condições Especiais (CE) e os Apêndices).

h) "Dia" significa um dia útil, salvo disposição em contrário.

i) "Data de vigência" significa a data em que este Contrato passa a vigorar e ter efeito de acordo com a Cláusula CG 11.

j) "Especialistas" significa coletivamente os "Especialistas Principais", "Especialistas de Apoio" ou qualquer funcionário do Consultor, Subconsultor ou membro(s) do consórcio designado pelo Consultor para executar os Serviços ou qualquer parte deles nos termos do Contrato.

k) "Moeda estrangeira" significa qualquer moeda que não seja a moeda do país do Cliente.

l) "CG" significa as Condições Gerais do Contrato.

m) "Governo" significa o governo do país do Cliente.

n) "Consórcio" significa uma associação com ou sem personalidade jurídica diferente daquela dos seus membros, de mais de uma entidade onde um membro tem autoridade para realizar todos

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - 4º andar - Ala C - 80.530-140 - Curitiba - Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 - Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 183

os negócios por e em nome de todo e qualquer membro do consórcio e onde os membros do consórcio são conjunta e solidariamente responsáveis perante o Cliente pela execução do Contrato.

o) "Especialista(s) Principal(is)" significa um profissional individual cujas habilidades, qualificações, conhecimento e experiência são críticos para a execução dos Serviços nos termos do Contrato e cujo Curriculum Vitae (CV) foi levado em consideração na avaliação técnica da proposta do Consultor.

p) "Moeda local" significa a moeda do país do Cliente.

q) "Especialista(s) de Apoio" significa um profissional fornecido pelo Consultor ou seu Subconsultor para executar os Serviços ou alguma parte deles nos termos do Contrato.

r) "Parte" significa o Cliente ou o Consultor, conforme o caso, e "Partes" abrange ambos.

s) "CE" significa as Condições Especiais do Contrato, por meio das quais as Condições Gerais podem ser modificadas ou complementadas, mas não substituídas.

t) "Serviços" significa o trabalho a ser executado pelo Consultor de acordo com este Contrato, conforme a descrição no Apêndice A deste Contrato.

u) "Subconsultores" significa uma entidade para quem/a qual o Consultor subcontrata qualquer parte dos Serviços enquanto permanece o único responsável pela execução do Contrato.

v) "Terceiro" significa qualquer pessoa ou entidade que não seja o Governo, o Cliente, o Consultor ou o Subconsultor

2. Relacionamento entre as Partes

2.1. Nenhuma disposição neste documento deve ser interpretada como determinante de uma relação de patrão e empregado ou de chefe e subordinado entre o Cliente e o Consultor. Nos termos deste Contrato, o Consultor dispõe de total controle sobre os Especialistas e os Subconsultores, se houver, que estiverem executando os Serviços e assumirá plena responsabilidade pelos trabalhos desempenhados por eles ou em seu nome.

3. Legislação Aplicável

3.1. Este Contrato, seu significado e interpretação, e a relação entre as Partes devem ser regidos pela Legislação Aplicável.

4. Idioma

4.1. Este Contrato foi assinado no idioma especificado nas Condições Especiais, que será obrigatório e regerá todas as questões referentes ao seu significado ou interpretação.

5. Títulos

5.1. Os títulos não deverão limitar, alterar ou afetar o significado deste Contrato.

6. Comunicações

6.1. Qualquer comunicação exigida ou permitida a ser divulgada ou feita nos termos deste Contrato deverá ser por escrito no idioma especificado na Cláusula CG 4. Considera-se válida qualquer comunicação, solicitação ou

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - 4º andar - Ala C - 80.530-140 - Curitiba - Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 - Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 184

autorização quando houver sido entregue pessoalmente a um representante autorizado da Parte a quem a comunicação for dirigida, ou mediante o seu envio para o endereço da referida Parte especificado nas CE.

6.2. Uma Parte pode alterar o seu endereço para recebimento de notificações, de acordo com este Contrato, mediante comunicação à outra Parte sobre a mudança do endereço indicado nas Condições Especiais.

7. Local

7.1. Os Serviços serão executados nos locais indicados no Apêndice A destas CG, e quando o local de uma tarefa específica não for assim estabelecido, esta será realizada em localidade aprovada pelo Cliente, seja no país do Governo ou em outro local.

8. Autoridade do Membro Líder

8.1. Se o Consultor consistir em um Consórcio, os membros autorizam a entidade especificada nas Condições Especiais a atuar em seu nome no exercício de todos os direitos e obrigações do Consultor junto ao Cliente, nos termos deste Contrato, incluindo, sem limitação, o recebimento de instruções e pagamentos do Cliente.

9. Representantes autorizados

9.1. Os funcionários indicados nas CE poderão tomar qualquer medida que o Cliente ou o Consultor deva ou possa adotar, bem como poderão assinar qualquer documento que possa ou deva ser assinado pelo Cliente ou pelo Consultor, de acordo com este Contrato.

10. Práticas corruptas e fraudulentas

10.1. O Banco Mundial exige conformidade com a sua política relacionada a práticas corruptas e fraudulentas conforme definido no Anexo 1 das CG.

a. Comissões e honorários

10.2. O Cliente requer que o Consultor divulgue quaisquer comissões, gratificações ou honorários que possam ter sido pagos ou que devam ser pagos a agentes ou a qualquer outra parte com relação ao processo de seleção ou execução do Contrato. As informações divulgadas devem incluir pelo menos o nome e o endereço do agente ou da outra parte, o montante e a moeda, e a finalidade da comissão, gratificações ou honorários. Qualquer problema na divulgação de tais comissões, gratificações ou honorários pode resultar na rescisão do Contrato e/ou em sanções por parte do Banco.

B. INÍCIO, CONCLUSÃO, MODIFICAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO.

11. Vigência do Contrato

11.1. Este Contrato entrará em vigor e efeito na data ("Data de vigência") em que o Cliente notificar o Consultor, instruindo-o a dar início à execução dos Serviços. Essa notificação deverá confirmar que foram atendidas as condições para entrada em vigor, se houver, relacionadas nas CE.

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - 4º andar - Ala C - 80.530-140 - Curitiba - Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 - Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 185

12. Rescisão do Contrato por Falta de Entrada em Vigor

12.1. Após a assinatura pelas Partes, se este Contrato não entrar em vigor dentro do prazo especificado nas CE, qualquer uma das Partes pode declarar este Contrato anulado e sem efeito, mediante comunicação por escrito à outra Parte, com antecedência mínima de 22 (vinte e dois) dias. No caso de tal afirmação por uma das Partes, nenhuma delas poderá fazer qualquer reivindicação à outra Parte relacionada ao Contrato.

13. Início dos serviços

13.1. O Consultor confirmará a disponibilidade dos Especialistas Principais e dará início aos Serviços em no máximo o número de dias após a Data de Entrada em Vigor especificada nas CG.

14. Encerramento do Contrato

14.1. Exceto quando rescindido em data anterior, de acordo com a Cláusula CG 19, este Contrato estará encerrado no final do prazo após a Data de Vigência, conforme especificado nas CE.

15. Totalidade do Acordo

15.1. Este Contrato contém todos os acordos, condições e disposições ajustadas pelas Partes. Nenhum agente ou representante de qualquer das Partes dispõe de autoridade para fazer, nem as Partes estarão sujeitas ou serão responsáveis por qualquer declaração, representação, promessa ou acordo que não tenha sido estabelecido neste Contrato.

16. Modificações ou Variações

16.1. Qualquer modificação ou variação nos termos e condições deste Contrato, incluindo qualquer alteração ou mudança no escopo dos Serviços, poderá ser feita somente por meio de acordo por escrito entre as Partes.

16.2. Quando as modificações ou variações forem substanciais, será necessário obter o prévio consentimento do Banco.

17. Força Maior

a. Definição

17.1. Para a finalidade deste Contrato, "Força Maior" significa um evento que está fora do controle razoável de uma Parte, não é previsível nem pode ser evitado e que, nas circunstâncias, torna impossível ou é tão impraticável que pode ser considerado razoavelmente impossível o cumprimento, nessas circunstâncias, de suas obrigações estabelecidas neste Contrato. Essas situações abrangem, mas não se limitam a guerras, rebeliões, distúrbios civis, terremotos, incêndios, explosões, tempestades, enchentes ou outras condições climáticas adversas, greves de trabalhadores e patronais, ou outras ações sindicais, confisco ou qualquer outra medida tomada por órgãos governamentais.

17.2. Força Maior não inclui (i) qualquer evento provocado por negligência ou ação intencional de uma Parte ou de seus Especialistas, Subconsultores, agentes ou empregados

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - 4º andar - Ala C - 80.530-140 - Curitiba - Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 - Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 186

nem (ii) qualquer acontecimento que uma Parte diligente pudesse ter previsto no momento da assinatura deste Contrato e ter evitado ou solucionado durante o cumprimento de suas obrigações estabelecidas neste instrumento contratual.

17.3. Não constitui motivo de Força Maior a insuficiência de fundos ou falta de qualquer pagamento previsto neste Contrato.

b. Não constitui violação do contrato

17.4. O descumprimento de qualquer das obrigações de uma Parte estabelecidas neste Contrato não será considerado violação ou negligência, se esse descumprimento resultar de um evento de Força Maior, desde que a Parte afetada por esse evento tenha tomado todas as precauções razoáveis, o devido cuidado ou medidas alternativas legítimas com o objetivo de cumprir os termos e condições deste Contrato.

c. Medidas a serem adotadas

17.5. A Parte afetada por um evento de Força Maior deverá continuar a executar suas obrigações determinadas pelo Contrato, na medida do possível, e tomar todas as providências razoáveis para minimizar as consequências de qualquer evento de Força Maior.

17.6. A Parte afetada por um evento de Força Maior deverá notificar prontamente a outra Parte sobre tal acontecimento e, em qualquer caso, no prazo máximo de 14 (quatorze) dias seguintes à ocorrência de tais acontecimentos, apresentando evidências de sua natureza e causa e, da mesma forma, deverá notificar por escrito a volta às condições normais tão logo seja possível.

17.7. Qualquer prazo em que uma Parte deva concluir qualquer ação ou tarefa, de acordo com este Contrato, será estendido por um período igual àquele durante o qual a referida Parte não pôde executá-la devido a um evento de Força Maior.

17.8. Durante o período de sua incapacidade para executar os Serviços devido a um evento de Força Maior, o Consultor, instruído pelo Cliente, deverá:

a) interromper os trabalhos e, nesse caso, o Consultor será reembolsado pelos custos adicionais e necessários que tenha assumido de forma razoável e, se for exigido pelo Cliente, ao reativar os Serviços; ou

b) continuar com os Serviços até o ponto que for possível, e neste caso o Consultor deverá continuar a ser pago conforme os termos deste Contrato e será reembolsado pelos custos adicionais incorridos de forma razoável e necessária.

17.9. No caso de desacordo entre as Partes quanto à existência ou à extensão do evento de Força Maior, o fato

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - 4º andar - Ala C - 80.530-140 - Curitiba - Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 - Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 187

deverá ser solucionado de acordo com as Cláusulas das CG 44 e 45.

18. Suspensão

18.1. O Cliente pode interromper todos os pagamentos ao Consultor previstos neste Contrato, mediante aviso de suspensão por escrito ao Consultor, se este deixar de cumprir qualquer de suas obrigações estabelecidas neste instrumento contratual, inclusive a execução dos Serviços, desde que o aviso de suspensão (i) especifique a natureza do descumprimento, e (ii) solicite ao Consultor a correção das falhas detectadas no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento pelo Consultor da notificação.

19. Rescisão

19.1. Este Contrato pode ser rescindido por qualquer das Partes de acordo com as disposições definidas a seguir:

a. Pelo Cliente

19.1.1. O Cliente pode rescindir este Contrato no caso de ocorrência de qualquer dos eventos especificados nos parágrafos (a) a (f) desta Cláusula. Em tal ocorrência, o Cliente deverá dar um aviso de rescisão por escrito de ao menos trinta (30) dias corridos ao Consultor no caso dos eventos referenciados nos itens (a) a (d); um aviso por escrito de ao menos sessenta (60) dias corridos no caso do evento referido no parágrafo (e); e um aviso por escrito de pelo menos cinco (5) dias corridos no caso do evento referido no item (f):

a) Se o Consultor deixar de corrigir uma falha no desempenho das suas obrigações aqui previstas, conforme especificado em um aviso de suspensão de acordo com a Cláusula CG 18;

b) Se o Consultor (ou se ele consistir mais de uma entidade, se qualquer de seus membros) entrar em processo de insolvência ou de falência ou estabelecer qualquer acordo com seus credores para reduzir a sua dívida ou lançar mão de alguma lei que beneficie os devedores ou ainda entrar em processo de liquidação ou em concordata compulsória ou voluntária;

c) Se o Consultor deixar de cumprir qualquer decisão final resultante de um procedimento de arbitragem conforme a Cláusula CG 45.1:

d) Se, por motivo de Força Maior, o Consultor não puder executar uma parte essencial dos Serviços durante um período não inferior a 60 (sessenta) dias;

e) Se o Cliente, sob seu exclusivo critério e por qualquer razão, decidir rescindir este Contrato;

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - 4º andar - Ala C - 80.530-140 - Curitiba - Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 - Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 188

f) Se o Consultor deixar de confirmar a disponibilidade dos Especialistas principais conforme exigência da Cláusula CG 13.

19.1.2. Ademais, se o Cliente determinar que o Consultor envolveu-se em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao competir por um Contrato ou executá-lo, o Cliente poderá, 14 (quatorze) dias após enviar notificação por escrito ao Consultor, rescindir o Contrato com o Consultor.

b. Pelo Consultor

19.1.3. O Consultor pode rescindir este Contrato, por meio de um aviso por escrito ao Cliente de pelo menos trinta (30) dias corridos, no caso de ocorrência de qualquer evento especificado nos parágrafos (a) a (d) desta Cláusula.

a) Se o Cliente deixar de pagar qualquer montante devido ao Consultor de acordo com este contrato e não sujeito a disputa de acordo com a Cláusula CG 45.1 dentro de quarenta e cinco (45) dias corridos após o recebimento de aviso por escrito do Consultor de que esse pagamento está em mora.

b) Se, por motivo de Força Maior, o Consultor não puder executar uma parte essencial dos Serviços durante um período não inferior a 60 (sessenta) dias.

c) Se o Cliente deixar de cumprir qualquer decisão final resultante de um procedimento de arbitragem conforme a Cláusula CG 45.1.

d) Se o Cliente descumprir de modo substancial as suas obrigações previstas neste Contrato e não corrigir a sua conduta no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias (ou um período maior que o Consultor pode ter subsequentemente aprovado por escrito) a partir do recebimento pelo Cliente da notificação do Consultor especificando o descumprimento.

c. Cessação dos Direitos e Obrigações

19.1.4. Após a rescisão deste Contrato de acordo com as Cláusulas CGC 12 ou CGC 19 deste documento, ou após a expiração deste Contrato de acordo com a Cláusula CG 14, todos os direitos e obrigações das Partes aqui especificadas cessarão, exceto (i) os direitos e obrigações que possam ter se acumulado na data da rescisão ou expiração, (ii) a obrigação de confidencialidade determinada na Cláusula CG 22, (iii) a obrigação do Consultor de permitir a inspeção, cópia e auditoria de suas contas e seus registros definida na Cláusula CG 25, e (iv) qualquer direito que uma das Partes possa ter de acordo com a Legislação Aplicável.

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - 4º andar - Ala C - 80.530-140 - Curitiba - Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 - Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 189

d. Cessação dos Serviços

19.1.5. Após a rescisão deste Contrato por aviso de qualquer das Partes para a outra conforme as Cláusulas CG 19a ou CG 19b, o Consultor deverá, imediatamente após o envio ou recebimento desse aviso, seguir todas as etapas necessárias para encerrar os Serviços de forma oportuna e ordenada, e deverá fazer todo o esforço possível para manter as despesas para este fim em um mínimo. Com relação aos documentos preparados pelo Consultor e aos equipamentos e materiais fornecidos pelo Cliente, o Consultor deverá proceder conforme determinado, respectivamente, pelas Cláusulas CG 27 ou CG 28.

e. Pagamento na Rescisão do Contrato

19.1.6. Após a rescisão deste Contrato, o Cliente deverá fazer os seguintes pagamentos ao Consultor:

a) pagamento dos Serviços realizados satisfatoriamente antes da data de entrada em vigor da rescisão; e

b) no caso de rescisão em conformidade com os parágrafos (d) e (e) da Cláusula CG 19.1.1, o reembolso de qualquer custo razoável incidental para a rescisão imediata e organizada deste Contrato, incluindo o custo da viagem de volta dos Especialistas.

C. OBRIGAÇÕES DO CONSULTOR

20. Disposições Gerais

a. Padrão de Desempenho

20.1. O Consultor deverá desempenhar e executar os Serviços com toda a devida diligência, eficiência e economia, de acordo com os padrões e as práticas profissionais aceitas de modo geral, observar sólidas práticas de gestão, empregar a tecnologia apropriada e equipamentos, maquinário, materiais e métodos seguros e eficazes. O Consultor deverá sempre agir, com respeito a qualquer assunto relativo a este Contrato ou aos Serviços, como um consultor fiel ao Cliente, e deverá sempre apoiar e proteger os interesses legítimos do Cliente em todas as negociações com terceiros.

20.2. O Consultor deverá contratar e fornecer Especialistas e Subconsultores qualificados conforme exigido para executar os Serviços.

20.3. O Consultor pode subcontratar parte dos Serviços até certo ponto e com os Especialistas Principais e Subconsultores aprovados previamente pelo Cliente. Não obstante essa aprovação, o Consultor deverá manter total responsabilidade pelos Serviços.

b. Legislação Aplicável aos Serviços

20.4. O Consultor deverá realizar os Serviços de acordo com o Contrato e a Legislação Aplicável e seguir todas as etapas possíveis para garantir que todos os seus

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº – 4º andar – Ala C - 80.530-140 – Curitiba – Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 – Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 190

Especialistas e Subconsultores cumpram a Legislação Aplicável.

20.5. Durante a execução do Contrato, o Consultor deverá cumprir as proibições relativas à importação de bens e serviços no país do Cliente quando

a) Por uma questão legal ou normas oficiais, o país do Mutuário proibir o estabelecimento de relações comerciais com aquele país; ou

b) Em conformidade com uma decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas tomada de acordo com o Capítulo VII da Carta das Nações Unidas, o País do Mutuário proibir qualquer importação de bens daquele país ou quaisquer pagamentos a qualquer país, pessoa ou entidade daquele país.

20.6. O Cliente deverá notificar o Consultor por escrito dos costumes locais relevantes e o Consultor deverá, após essa notificação, respeitar tais costumes.

21. Conflito de Interesses

21.1. O Consultor deverá priorizar os interesses do Cliente sem considerar a possibilidade de qualquer trabalho futuro e evitar estritamente conflitos com outros contratos ou com os seus próprios interesses corporativos.

a. O Consultor não deve se beneficiar de comissões, descontos, etc.

21.1.1. O pagamento do Consultor de acordo com a CG F (Cláusulas CG 38 a 42) deverá constituir o único pagamento do Consultor em relação a este Contrato e, conforme a Cláusula CG 21.1.3, o Consultor não deverá aceitar em seu próprio benefício nenhuma comissão comercial, desconto ou pagamento similar em conexão com as atividades relativas a este Contrato ou no desempenho das suas obrigações aqui previstas, e o Consultor deverá usar seus maiores esforços para garantir que todos os Subconsultores, bem como os Especialistas e respectivos agentes, também não recebam qualquer pagamento adicional.

21.1.2. Outrossim, se o Consultor for responsável, como parte dos Serviços, por assessorar o Cliente na aquisição de bens, obras ou serviços, o Consultor deverá cumprir as diretrizes de aquisição aplicáveis do Banco e sempre exercer tal responsabilidade visando os melhores interesses do Cliente. Quaisquer descontos ou comissões obtidos pelo Consultor durante essas atividades de aquisição reverterão em favor do Cliente.

b. O Consultor e seus Associados não poderão participar de

21.1.3. O Consultor concorda que, durante a execução deste Contrato e após o seu encerramento, ele e qualquer de suas entidades associadas, bem como quaisquer Subconsultores e as entidades afiliadas a esses subconsultores, estarão desqualificados para o fornecimento de bens, obras e serviços resultantes

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - 4º andar - Ala C - 80.530-140 - Curitiba - Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 - Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 191

certas atividades

ou diretamente relacionados aos Serviços de Consultoria prestados na preparação ou implementação do projeto, salvo disposição em contrário.

c. Proibição de Atividades Conflitantes

21.1.4. O Consultor não deverá se envolver e não levará os seus Especialistas, bem como os seus Subconsultores a participar direta ou indiretamente de atividade comercial ou profissional que possa conflitar com as tarefas que lhes foram atribuídas de acordo com o Contrato.

d. Dever restrito de divulgar atividades conflitantes

21.1.5. O Consultor tem a obrigação e deverá garantir que Especialistas e Subconsultores também tenham a obrigação de divulgar qualquer situação de conflito real ou potencial que impacte sua capacidade de servir aos melhores interesses do seu Cliente ou que possa ser interpretada como tal. A não divulgação dessas situações pode levar à desqualificação do Consultor ou à rescisão do seu Contrato.

22. Confidencialidade

22.1. Exceto mediante consentimento prévio por escrito do Cliente, o Consultor e os seus Especialistas nunca poderão revelar a qualquer pessoa ou entidade qualquer informação confidencial obtida durante a execução dos Serviços nem tornar públicas as recomendações formuladas ao longo ou resultantes dos Serviços.

23. Responsabilidade do Consultor

23.1. Sujeita a disposições adicionais, se houver, definidas nas CE, a responsabilidade do Consultor prevista neste Contrato será determinada pela Legislação Aplicável.

24. Seguro a ser obtido pelo Consultor

24.1. O Consultor (i) contratará e manterá, e fará com que os Subconsultores contratem e mantenham, às suas próprias expensas (ou dos Subconsultores, conforme o caso), nos termos e condições aprovados pelo Cliente, um seguro contra riscos e com as coberturas especificadas nas CE, e (ii) a pedido do Cliente, fornecerá as comprovações necessárias da obtenção e manutenção do seguro, assim como do pagamento dos prêmios vigentes. O Consultor deverá garantir que esse seguro está em vigor antes do início dos Serviços, conforme definido na Cláusula CG 13.

25. Contas, Inspeção e Auditoria

25.1. O Consultor deverá manter e envidar todos os esforços possíveis para assegurar que seus Subconsultores mantenham contas e registros precisos e sistemáticos em relação aos Serviços e em tal forma e detalhes que identifiquem claramente as mudanças de data e de custos pertinentes.

25.2. O Consultor deverá permitir e incentivar que seus Subconsultores permitam, que o Banco e/ou pessoas indicadas pelo Banco inspecione o local e/ou todas as suas contas e registros referentes à execução do Contrato

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº – 4º andar – Ala C - 80.530-140 – Curitiba – Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 – Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 192

e ao envio da Proposta para o fornecimento dos Serviços e submeta tais contas e registros à auditoria por auditores indicados pelo Banco se este assim o exigir. O Consultor deve dar a devida atenção à Cláusula CG 10 que dispõe, inter alia, que atos que objetivem impedir concretamente o exercício dos direitos de inspeção e auditoria do Banco, nos termos da Cláusula CG 25.2 constituem uma prática proibida sujeita à rescisão contratual (bem como à determinação de inelegibilidade de acordo com os procedimentos de sanções do Banco).

26. Obrigações de apresentar relatórios

26.1. O Consultor deverá apresentar ao Cliente os relatórios e documentos indicados no Apêndice A deste Contrato na forma, quantidade e prazos fixados no referido Apêndice.

27. Direitos de propriedade do Cliente nos relatórios e registros

27.1. A menos que seja indicado de outro modo nas CE, todos os relatórios e dados relevantes, bem como informações como mapas, diagramas, planos, bancos de dados, outros documentos e software, registros de apoio ou materiais compilados ou preparados pelo Consultor para o Cliente durante o Serviço deverão ser confidenciais e tornar-se propriedade absoluta do Cliente. O Consultor deverá, no máximo na rescisão ou expiração deste Contrato, entregar todos esses documentos ao Cliente, juntamente com um inventário detalhado desses documentos. O Consultor poderá reter uma cópia desses documentos, dados e/ou software, mas não deverá usá-la para fins que não estejam relacionados a este Contrato sem aprovação prévia por escrito do Cliente.

27.2. Se forem necessários ou apropriados acordos de licença entre o Consultor e terceiros para fins de desenvolvimento dos planos, desenhos, especificações, projetos, bancos de dados, outros documentos e software, o Consultor deverá obter a aprovação prévia por escrito do Cliente para esses acordos e o Cliente terá o direito, a seu critério, de exigir a recuperação das despesas relativas ao desenvolvimento do(s) programa(s) em questão. Outras restrições sobre o uso futuro desses documentos e software, se houver, serão especificados nas CE.

28. Equipamentos, Veículos e Materiais

28.1. Equipamentos, veículos e materiais colocados à disposição do Consultor pelo Cliente, ou adquiridos pelo Consultor com recursos integrais ou parciais fornecidos pelo Cliente serão de propriedade do Cliente e deverão ser identificados de modo adequado. Quando da rescisão ou encerramento deste Contrato, o Consultor apresentará ao Cliente o inventário dos referidos equipamentos, veículos e materiais, e os entregará de acordo com as suas instruções. Enquanto estiver de posse dos equipamentos, veículos e materiais, o Consultor deverá providenciar o seguro desses itens, às expensas do Cliente, no valor equivalente à sua total substituição, salvo determinação em contrário e por escrito do Cliente.

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº – 4º andar – Ala C - 80.530-140 – Curitiba – Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 – Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 193

28.2. Qualquer equipamento ou material trazido para o País do Cliente pelo Consultor ou seus Especialistas tanto para uso pessoal ou no projeto, permanecerá de propriedade do Consultor ou dos Especialistas, conforme aplicável.

D. Especialistas do Consultor e Subconsultores

29. Descrição de Especialistas principais

29.1. Os cargos, as funções, as qualificações mínimas e a carga de trabalho de cada um dos Especialistas Principais do Consultor, estimados para execução dos serviços, estão descritos no Apêndice B.

30. Substituição Especialistas Principais

30.1. Exceto quando o Cliente estabelecer de outro modo, não serão admitidas alterações nos Especialistas Principais.

30.2. Se, por qualquer motivo fora do controle razoável do Consultor, como morte ou doença, entre outras, for necessário substituir qualquer Especialista Principal, o Consultor deverá apresentar solicitação por escrito. Nesse caso, o Consultor deverá apresentar imediatamente como substituto outro profissional com qualificação equivalente ou superior e com a mesma faixa de remuneração.

31. Remoção de Especialistas ou Subconsultores

31.1. Se o Cliente descobrir que algum dos Especialistas ou Subconsultores incorreu em conduta indevida ou foi acusado de ter cometido um ato criminoso, ou se o Cliente determinar que o Especialista ou Subconsultor do Consultor se envolveu em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas durante a execução dos Serviços, o Consultor deverá, por solicitação por escrito do Cliente, providenciar um substituto.

31.2. Caso algum Especialista Principal, Especialista de Apoio ou Subconsultor seja considerado pelo Cliente como incompetente ou incapaz no cumprimento das tarefas atribuídas, o Cliente, especificando os motivos correspondentes, pode solicitar que o Consultor providencie um substituto.

31.3. Os substitutos dos Especialistas ou Subconsultores removidos deverão ter melhores qualificações e experiência e serem aceitáveis para o Cliente.

31.4. O Consultor deverá arcar com todos os custos oriundos ou relativos a qualquer remoção e/ou substituição de tais Especialistas.

E. Obrigações do Cliente

32. Assistência e Isenções

32.1. A menos que especificado de outra forma nas CE, o Cliente deverá envidar todos os seus esforços para:

a) Auxiliar o Consultor na obtenção dos vistos de trabalho e outros documentos necessários para permitir que o Consultor preste os Serviços.

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº – 4º andar – Ala C - 80.530-140 – Curitiba – Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 – Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 194

b) Auxiliar o Consultor na pronta obtenção, para que os Especialistas e, se for apropriado, os seus dependentes elegíveis recebam prontamente todos os vistos de entrada e saída, de residência e licença para efetuar câmbio, bem como quaisquer outros documentos necessários à sua estadia no país do Cliente enquanto executam os Serviços previstos neste Contrato.

c) Facilitar a pronta liberação pela alfândega de qualquer bem necessário aos Serviços e dos objetos pessoais dos Especialistas e de seus dependentes elegíveis.

d) Fornecer aos funcionários, agentes e representantes do Governo todas as instruções e informações necessárias ou pertinentes à imediata e eficiente execução dos Serviços.

e) Isente o Consultor, a Equipe e quaisquer Subconsultores contratados pelo Consultor para executar os Serviços de qualquer exigência de registro ou licença referente ao exercício da profissão ou ao estabelecimento individual ou como entidade corporativa no país do Cliente de acordo com a Legislação Aplicável daquele país.

f) Conceder ao Consultor, a qualquer Subconsultor ou às Equipes de ambos, o privilégio, de acordo com a Legislação Aplicável no país do Cliente, de trazer para o país do Cliente valores razoáveis em moeda estrangeira para a finalidade dos Serviços ou para seu uso pessoal, bem como de retirar quaisquer montantes ganhos pela Equipe na execução dos Serviços.

g) Fornecer ao Consultor qualquer outra assistência prevista nas CE.

33. Acesso ao Local do Projeto

33.1. O Cliente garante que o Consultor terá acesso livre e gratuito ao local do projeto, necessário à execução dos Serviços. O Cliente será responsável por quaisquer danos a esses lugares ou aos bens neles contidos, que sejam resultantes do referido acesso, e indenizará o Consultor e cada Especialista no que diz respeito à responsabilidade por tais danos, a menos que tenham sido causados por falta ou negligência do Consultor, de quaisquer Subconsultores ou dos Especialistas de ambos.

34. Mudança na Legislação Aplicável Relativa a Impostos e Taxas

34.1. Se, após a data deste Contrato, houver alguma alteração na legislação aplicável no país do Cliente com relação a impostos e direitos que aumente ou diminua o custo incorrido pelo Consultor na realização dos Serviços, a remuneração e as despesas reembolsáveis pagáveis de outro modo ao Consultor neste Contrato devem ser aumentadas ou diminuídas de modo adequado pelo acordo entre as Partes neste instrumento, e os ajustes correspondentes deverão ser feitos para o valor do preço do Contrato especificado na Cláusula CG 38.1.

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - 4º andar - Ala C - 80.530-140 - Curitiba - Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 - Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 195

35. Serviços, instalações e bens do Cliente	35.1.	O Cliente colocará à disposição do Consultor e da Equipe, para a finalidade dos Serviços a serem realizados e livres de qualquer encargo, os serviços, as instalações e os bens descritos nos Termos de Referência (Apêndice A), durante os períodos e no modo especificados no Apêndice A.
36. Equipe de Contrapartida	36.1.	Se for especificado no Apêndice A deste Contrato, o Cliente deverá colocar à disposição do Consultor, gratuitamente, os profissionais e a equipe de apoio de contrapartida, que será designada pelo Cliente com a assessoria do Consultor.
	36.2.	As equipes de profissionais e de apoio de contrapartida, excluídos os funcionários de ligação do Cliente, deverão trabalhar sob a orientação exclusiva do Consultor. Se qualquer membro da equipe de contrapartida não executar de modo adequado qualquer tarefa compatível com o seu cargo, que lhe seja atribuída pelo Consultor, este poderá solicitar a sua substituição e o Cliente não deverá se negar sem razão a tomar as providências necessárias para atender a esse pedido.
37. Obrigação de pagamento	37.1.	Em consideração aos Serviços realizados pelo Consultor neste Contrato, o Cliente deve efetuar tais pagamentos ao Consultor pelos produtos especificados no Apêndice A e da forma descrita pela cláusula CGC F a seguir.
		F. Pagamentos ao Consultor
38. Preço do Contrato	38.1.	O preço do Contrato é fixo e está determinado na CE. A discriminação do preço do Contrato é fornecida no Apêndice C.
	38.2.	Qualquer mudança no preço do Contrato especificado na Cláusula 38.1 só pode ser feita se as Partes tiverem concordado com o escopo revisado dos Serviços de acordo com a Cláusula CG 16 e modificado por escrito os Termos de Referência no Apêndice A.
39. Impostos e Direitos	39.1.	O Consultor, os Subconsultores e os Especialistas são responsáveis por cumprir todas as obrigações fiscais decorrentes do Contrato, exceto quando definido de outro modo na CE.
	39.2.	Como exceção para o estabelecido acima e o definido na CE, todos os impostos indiretos locais identificáveis (detalhados e finalizados nas negociações do Contrato) são reembolsados ao Consultor ou pagos pelo Cliente em nome do Consultor.
40. Moeda de Pagamento	40.1.	Todos os pagamentos previstos neste Contrato deverão ser feitos nas moedas do Contrato.

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº – 4º andar – Ala C - 80.530-140 – Curitiba – Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 – Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 196

41. Forma de Cobrança e de Pagamento

41.1. O total de pagamentos no âmbito deste Contrato não deverá exceder o preço do Contrato especificado na Cláusula CEC 38.1.

41.2. Os pagamentos previstos neste Contrato deverão ser feitos em prestações de preço global relativas aos produtos especificados no Apêndice A. Os pagamentos serão feitos de acordo com o cronograma de pagamentos estabelecido nas CE.

41.2.1. Adiantamento: A menos que seja indicado de outro modo nas CE, será efetuado um pagamento antecipado mediante uma garantia bancária para pagamento antecipado aceitável para o Cliente com valor (ou valores) e na moeda (ou moedas) especificados nas CE. Essa garantia (i) deverá permanecer válida até que o adiantamento tenha sido totalmente compensado e (ii) deverá ocorrer na forma definida no Apêndice D, ou em qualquer outra forma aprovado por escrito pelo Cliente. Os adiantamentos serão pagos pelo Cliente em parcelas iguais contra as prestações de preço global especificadas nas CE até que tais adiantamentos tenham sido totalmente pagos.

41.2.2. Os Pagamentos das Parcelas de Preço Global. O Cliente deverá pagar ao Consultor no prazo de sessenta (60) dias após o recebimento, por parte do Cliente, dos produtos e da fatura para o respectivo pagamento da parcela de preço global. O pagamento pode ser retido se o Cliente não aprovar os produtos enviados como satisfatórios e, nesse caso, o Cliente deverá fornecer comentários para o Consultor dentro do mesmo período de sessenta (60) dias. O Consultor deverá imediatamente fazer as correções necessárias e, em seguida, o processo deverá ser repetido.

41.2.3. O Pagamento Final. O pagamento final previsto nesta Cláusula deverá ser feito somente depois que o relatório final I tiver sido enviado pelo Consultor e aprovado como satisfatório pelo Cliente. Os Serviços deverão então ser considerados concluídos e finalmente aceitos pelo Cliente. A última parcela do preço global será considerada aprovada para pagamento pelo Cliente no prazo de noventa (90) dias corridos após o recebimento do relatório final pelo Cliente, a menos que ele, nesse período de noventa (90) dias corridos, envie um aviso por escrito ao Consultor especificando em detalhes as deficiências nos Serviços, o relatório final. O Consultor deverá imediatamente fazer as correções necessárias e, em seguida, o processo deverá ser repetido.

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - 4º andar - Ala C - 80.530-140 - Curitiba - Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 - Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 197

41.2.4. Todos os pagamentos neste Contrato devem ser efetuados nas contas do Consultor especificadas nas CE. Com exceção do pagamento final descrito em 41.2.3 acima, os pagamentos não representam a aceitação de todos os Serviços nem eximem o Consultor de quaisquer obrigações aqui descritas.

42. Juros sobre Pagamentos Atrasados

42.1. Se o Cliente tiver pagamentos atrasados com mais de quinze (15) dias após a data de vencimento definida na Cláusula CG 41.2.2, deverão ser pagos juros ao Consultor sobre qualquer montante devido, e não pago, em tal data de vencimento para cada dia de atraso na taxa anual definida nas CE.

G. Equidade e Boa-Fé

43. Boa Fé

43.1. As Partes comprometem-se a agir de boa-fé com relação aos direitos das duas Partes neste Contrato e a adotar todas as medidas razoáveis para garantir a realização dos objetivos deste Contrato.

H. Resolução de Conflitos

44. Solução Amigável

44.1. As Partes devem procurar resolver qualquer controvérsia de forma amigável por meio de consulta mútua.

44.2. Se uma Parte não concordar com qualquer ação ou inação da outra Parte, aquela que tenha discordado poderá apresentar por escrito à outra Parte uma Notificação de Controvérsia, detalhando as razões do conflito. A Parte que receber a Notificação da Controvérsia a levará em consideração e responderá por escrito até 14 (quatorze) dias após o recebimento. Se essa Parte não responder até quatorze (14) dias, ou se a controvérsia não puder ser resolvida de forma amigável até quatorze (14) dias após a resposta da Parte, a Cláusula CG 49.1 deverá ser aplicada.

45. Solução de controvérsias

45.1. Qualquer conflito resultante deste Contrato, que não possa ser solucionado de forma amigável pelas Partes, será submetido a processo judicial/arbitral de acordo com as disposições especificadas nas CE.

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - 4º andar - Ala C - 80.530-140 - Curitiba - Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 - Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 198

II. CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO

ANEXO 1: POLÍTICA DO BANCO MUNDIAL – PRÁTICAS CORRUPTAS E FRAUDULENTAS

"Fraude e Corrupção

1.23 É a política do Banco exigir de todos os Mutuários (inclusive dos beneficiários de empréstimos do Banco), consultores e seus agentes (sejam eles declarados ou não), subcontratados, subconsultores, prestadores de serviço e fornecedores, além de todo funcionário a eles vinculado, que mantenham os mais elevados padrões de ética durante a seleção e execução de contratos financiados pelo Banco[1]. De acordo com essa política, o Banco:

a) Define, para fins dessa disposição, as expressões abaixo da seguinte forma:

(i) "prática corrupta" significa oferecer, entregar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor com a intenção de influenciar indevidamente as ações de terceiros[2];

(ii) "prática fraudulenta" significa qualquer ato, falsificação ou omissão de fatos que, de forma intencional ou irresponsável, induza ou tente induzir uma parte a erro, para obter benefício financeiro ou de qualquer outra ordem, ou com a intenção de evitar o cumprimento de uma obrigação[3];

(iii) "prática colusiva" significa uma combinação entre duas ou mais partes visando alcançar um objetivo indevido, inclusive influenciar indevidamente as ações de outra parte[4];

(iv) "prática coercitiva" significa prejudicar ou causar dano ou ameaçar prejudicar ou causar dano, direta ou indiretamente, qualquer parte ou a sua propriedade para influenciar indevidamente as ações de uma Parte[5];

(v) "prática obstrutiva" significa:

(aa) deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigações ou fazer declarações falsas a investigadores, com o objetivo de impedir materialmente uma investigação do Banco de alegações de prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameaçar, perseguir ou intimidar qualquer parte interessada, para impedi-la de mostrar seu

---

1 Nesse contexto, será imprópria qualquer ação realizada por um consultor ou por qualquer dos seus funcionários, seus agentes ou seus subconsultores, subempreiteiros, prestadores de serviço, fornecedores e/ou seus empregados, no intuito de influenciar o processo de seleção ou a execução do contrato para obter uma vantagem indevida é imprópria.

2 Para a finalidade deste subparágrafo, "terceiros" refere-se a um funcionário público que atue no processo de seleção ou na execução do contrato. Neste contexto, "funcionário público" inclui a equipe do Banco Mundial e os funcionários de outras organizações que examinam ou tomam decisões sobre a seleção.

3 Para a finalidade deste subparágrafo, "Parte" refere-se a um funcionário público; os termos "benefício" e "obrigação" são relativos ao processo de seleção ou à execução do contrato; e "ato ou omissão" tem como objetivo influenciar o processo de seleção ou a execução do contrato.

4 Para os fins deste parágrafo, "parte" refere-se aos participantes do processo de aquisição ou seleção (inclusive funcionários públicos) que tentam por si mesmos ou por intermédio de outra pessoa ou entidade que não participe do processo de aquisição ou seleção simular a concorrência ou estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos ou ter acesso as propostas financeiras e outras condições.

5 Para a finalidade deste subparágrafo, "parte" refere-se a um participante do processo de seleção ou da execução do contrato.

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº – 4º andar – Ala C - 80.530-140 – Curitiba – Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 - Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 199

conhecimento sobre assuntos relevantes à investigação ou ao seu prosseguimento, ou;

(bb) atos que tenham como objetivo impedir materialmente o exercício dos direitos do Banco de promover inspeção e auditoria;

b) Rejeitará a recomendação de outorga se determinar que o consultor recomendado para a outorga do contrato, ou algum membro da sua equipe, seus agentes ou seus subconsultores, subempreiteiros, prestadores de serviço, fornecedores e/ou algum empregado destes se envolveu, de forma direta ou indireta, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao concorrer para o contrato em questão;

c) Declarará viciado o processo de seleção e cancelará a parte do Empréstimo alocado para um contrato se, a qualquer momento, concluir que os representantes do Mutuário ou de um beneficiário do Empréstimo se envolveram em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas, durante o processo de seleção ou de execução do contrato em questão, sem que o Mutuário tenha adotado medidas oportunas e adequadas, satisfatórias ao Banco, para resolver essas práticas quando ela ocorrer, inclusive ao não informar ao Banco de modo oportuno no momento que tomou conhecimentos dessas práticas;

d) Sancionará uma firma ou pessoa física a qualquer tempo, de acordo com procedimentos vigentes de sanções do Banco[6], inclusive declarando-a inelegível indefinidamente ou por prazo determinado para: (i) a outorga de um contrato financiado pelo Banco, e (ii) ser designado[7] como subconsultor, consultor, fabricante, fornecedor ou prestador de serviços de uma outra firma elegível a quem tenha sido outorgado um contrato financiado pelo Banco.

---

6 Uma firma ou uma pessoa física pode ser declarada inelegível para outorga de um contrato financiado pelo Banco após (i) a conclusão do processo de sanções do Banco, conforme seus procedimentos de sanções, incluindo nomeadamente: impedimento cruzado, conforme acordado com outras Instituições Financeiras Internacionais, incluindo Bancos Multilaterais de Desenvolvimento e procedimentos de sanções por fraude e corrupção e (ii) em conseqüência de suspensão temporária ou suspensão temporária preventiva relacionada a procedimento de sanções em andamento. Ver nota de rodapé 12 e parágrafo 8 do Apêndice 1 das Diretrizes de Consultores, datadas de janeiro de 2011.

7 Um subconsultor, fornecedor, ou prestador de serviços designado é qualquer que (i) foi incluído pelo consultor na sua proposta porque traz experiência específica e conhecimentos específicos ou cruciais que são considerados na avaliação técnica da proposta do consultor para os serviços em questão; ou (ii) designado pelo Mutuário.

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - 4º andar - Ala C - 80.530-140 - Curitiba - Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 - Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 200

III. CONDIÇÕES ESPECIAIS DO CONTRATO

Número da Cláusula CG	Emendas, Suplementos e Cláusulas nas Condições Gerais de Contrato
1.1(b) e 3.1	**O Contrato deve ser interpretado de acordo com a lei do** Brasil. (Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e Lei Estadual Nº 15.608 de 16 de agosto de 2007, suas alterações e outras legislações vigentes aplicáveis.
4.1	**O idioma é:** Português do Brasil
6.1 e 6.2	**OS ENDEREÇOS SÃO:** **CLIENTE** **ESTADO DO PARANÁ** por meio da **SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL – SEPL;** Inscrita sob o CNPJ n° 76.416.916/0001-99; Endereço: Rua Jacy Loureiro de Campos S/número, Palácio das Araucárias, 4º Andar – Ala C, bairro Centro Cívico, CEP 80.530-140 – Curitiba/Paraná A/C de: JURACI BARBOSA SOBRINHO – Secretário de Estado/SEPL E-mail: juracibarbosa@sepl.pr.gov.br multissetorialbird@sepl.pr.gov.br **CONSULTOR** **CONSÓRCIO LITORAL SUSTENTAVEL** Inscrita sob o CNPJ n° 28.705.520/0001-19 Endereço: Av. Santos Dumont, 2456 - sala 210, bairro Aldeota, CEP 60.150-162, Fortaleza/Ceará A/C de: BARCELONA BRASIL GROUP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - MARINA CABREIRA BASTOS Fax/ Telefone: 21 2533.7030 / 21 96810.6777 Endereço: Av. Rio Branco, 277 – Sala 1504, Centro – Rio de Janeiro E-mail: marina.bastos@quantaconsultoria.com E/Ou MACELO MARCOS DA SILVA FONSECA Fax/ Telefone: 21 2533.7030 / 21 96810.6777 Endereço: Rua Alice de Souza Lima, 303, bairro jardim do Alto, CEP 04.823-740, São Paulo/SP.

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 201

	E-mail:
8.1	**O Membro Líder em nome do Consórcio é:** BARCELONA BRASIL GROUP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Endereço: Rua Alice de Souza Lima, 303, bairro jardim do Alto, CEP 04.823-740, São Paulo/SP
9.1	Os Representantes Autorizados são: Para o CLIENTE: GESTOR DO CONTRATO (EXECUTORES) Nome: FABRICIO MIYAGIMA e-mail: fabriciom@sepl.pr.gov.br fone: (41) 3313 6295 e Nome: SONIA MARIA DOS SANTOS e-mail: sonia.maria@sepl.pr.gov.br> fone: (41) 3313 6815 Endereço: Rua Jacy Loureiro de Campos S/número, Palácio das Araucárias, 4º Andar – Ala D, bairro Centro Cívico, CEP 80.530-140 – Curitiba/Paraná Para o CONSULTOR: Nome: e-mail: fone: endereço:
11.1	**As condições de vigência são as seguintes:** - Contrato de formação do consórcio - Procuração para o representante autorizado, de cada membro do consórcio e para o representante do membro líder para representar todos do consórcio;
12.1	**Rescisão do Contrato por Não Entrar em Vigor:** O período deve ser de Noventa (90) dias.
13.1	**Início dos Serviços:** O número de dias deve ser trinta (30) dias, a partir da data de assinatura do contrato. Confirmação da disponibilidade dos Especialistas Principais para iniciar o Serviço deve ser enviada ao Cliente por escrito, na forma de Declaração assinada por cada Especialista Principal.
14.1	**Término do Contrato:**

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 202

	O período deve ser 12 meses, a partir do início dos serviços, cláusula 13.1 das condições especiais do contrato
21 b.	**O Cliente se reserva o direito de determinar caso a caso se o Consultor deve ser desqualificado do fornecimento de bens, obras ou serviços de não consultoria devido a um conflito de uma natureza descrita na Cláusula CG 21.1.3.:** SIM
23.1	"Limitação da Responsabilidade do Consultor em relação ao Cliente: (a) Exceto no caso de falta grave ou dolo por parte do consultor ou de qualquer pessoa ou empresa em nome do Consultor na realização dos Serviços, o Consultor, em relação ao dano causado por ele ao bem do Cliente, não será responsabilizado em relação ao Cliente: (i) por quaisquer danos indiretos ou emergentes ou prejuízos especulativos; e (ii) por quaisquer perdas ou danos diretos que excedam três vezes o valor total do Contrato; (b) Esta limitação de responsabilidade não deverá: (i) afetar a responsabilidade do Consultor, se houver, por danos a terceiros causados pelo Consultor ou por qualquer pessoa ou empresa em nome do Consultor na execução dos Serviços; (ii) ser interpretada como uma disposição que proporcione ao Consultor qualquer limitação ou exclusão de responsabilidade, o que é proibido pela Lei Aplicável no país do Cliente.
24.1	**A cobertura de seguro** contra os riscos deve ser feita como a seguir: (a) Seguro de responsabilidade profissional, com cobertura mínima do valor do contrato. (b) Seguro de responsabilidade civil contra Terceiros, em relação aos veículos motorizados operados no país do Cliente pelo Consultor ou membros da sua Equipe ou Subconsultores, com cobertura mínima de 30% do valor indicado na memória de cálculo da equipe técnica. (c) Seguro de responsabilidade de Terceiros, com uma cobertura mínima de 30% do valor indicado na memória de cálculo da equipe técnica.
27.1	Não há disposições ao contrário.
27.2	O Consultor não deve usar esses documentos, informações, materiais e produções para fins não associados a este Contrato sem uma prévia autorização por escrito do Cliente.

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº – 4º andar – Ala C - 80.530-140 – Curitiba – Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 – Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 203

38.1	Os valores globais do contrato em Reais e Euros são: **R$ 3.260.177,77 (três milhões, duzentos e sessenta mil, cento e setenta e sete reais e setenta e sete centavos) e € 485.557,89 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e sete euros e oitenta e nove centavos)**, incluindo impostos locais indiretos. Quaisquer impostos locais indiretos passíveis de cobrança em relação a este contrato para os Serviços fornecidos pelo Consultor devem ser pagos pelo Consultor. O montante de tais impostos são de R$ 163.005,88 (cento e sessenta e três mil, cinco reais e oitenta e oito centavos) e € 24.277,89 (vinte e quatro mil, duzentos e setenta e sete euros e oitenta e nove centavos).
39.1 e 39.2	O Consultor, os Subconsultores e os Especialistas são responsáveis por cumprir todas as obrigações fiscais e tributárias decorrentes do Contrato.
41.2	O pagamento das parcelas deve ser vinculado aos resultados especificados do TEC-5 (Cronograma do Trabalho e Planejamento para os produtos) da proposta técnica apresentada: **1º Pagamento: 2,25% do valor global** para pagamentos realizados em Euros e **4,84% do valor global** para pagamentos realizados em Reais, após a aprovação do Plano de Trabalho Preliminar – P.T.P. **2º Pagamento: 8,17% do valor global** para pagamentos realizados em Euros e **7,16% do valor global** para pagamentos realizados em Reais, após a realização das oficinas de Engajamento e a aprovação do Relatório de Atividades 01 (R.A. 01). **3º Pagamento: 7,99% do valor global** para pagamentos realizados em Euros e **7,16% do valor global** para pagamentos realizados em Reais, após a realização de Audiência Pública 01 e a aprovação do Plano de Trabalho Final (P.T.F.). **4º Pagamento: 7,30% do valor global** para pagamentos realizados em Euros e **6,85% do valor global** para pagamentos realizados em Reais, após a aprovação do Relatório de Contextualização Inicial (R.C.I). **5º Pagamento: 7,30% do valor global** para pagamentos realizados em Euros e **7,44% do valor global** para pagamentos realizados em Reais, após a realização das oficinas de Contextualização e a aprovação do Relatório de Atividades 02 (R.A. 02). **6º Pagamento: 7,68% do valor global** para pagamentos realizados em Euros e **7,99% do valor global** para pagamentos realizados em Reais, após a realização de Audiência Pública 02 e a aprovação do Relatório de Contextualização Final (R.C.F.).

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - 4º andar - Ala C - 80.530-140 - Curitiba - Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 - Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 204

	7º Pagamento: 7,78% do valor global para pagamentos realizados em Euros e **7,89% do valor global** para pagamentos realizados em Reais, após a aprovação Relatório de Construção de Cenário Inicial (R.C.C.I). **8º Pagamento: 7,78% do valor global** para pagamentos realizados em Euros e **7,92% do valor global** para pagamentos realizados em Reais, após a realização das Oficinas de Construção de Cenários e aprovação do Relatório de Atividades 03 (R.A.03). **9º Pagamento: 7,78% do valor global** para pagamentos realizados em Euros e **8,42% do valor global** para pagamentos realizados em Reais, após realização da Audiência Pública 03 a aprovação do Relatório de Construção de Cenário Final (R.C.C.F.). **10º Pagamento: 8,08% do valor global** para pagamentos realizados em Euros e **8,57% do valor global** para pagamentos realizados em Reais, após a aprovação do Relatório do Plano de Ação Inicial (R.P.A.I). **11º Pagamento: 9,23% do valor global** para pagamentos realizados em Euros e **8,92% do valor global** para pagamentos realizados em Reais, após realização das oficinas do Plano de Ação e a aprovação do relatório de Atividades 04 (R.A.04). **12º Pagamento: 9,23% do valor global** para pagamentos realizados em Euros e **8,92% do valor global** para pagamentos realizados em Reais, após realização da audiência pública 04 e aprovação do relatório do Plano de Ação Final (R.P.A.F.). **13º Pagamento: 9,43% do valor global** para pagamentos realizados em Euros e **7,92% do valor global** para pagamentos realizados em Reais, após a aprovação do documento final e realização da Conferência Regional Final.
41.2.1	Não se aplica
41.2.4	**As Contas são:** Os números das contas são: Os pagamentos ao CONSÓRCIO LITORAL SUSTENTAVEL serão feitos separadamente para cada uma de suas empresas, no limite da proporção da participação estipulada no contrato de formação do consórcio, cada qual responsável solidariamente perante este contrato: PARA PAGAMENTOS EM MOEDA(S) ESTRANGEIRA(S): • HIDRIA CIENCIA, AMBIENTE Y DESAROLLO S.L Banco: CaixaBank Conta: ES80 2100 5940 7802 00091197 SWIFT: CAIXESBBXXX

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - 4º andar - Ala C - 80.530-140 - Curitiba - Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 - Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 205

	Endereço: Calle Barcelona, 54 - 36203 Vigo - Espanha • MCRIT S.L. Banco: CaixaBank Conta: ES59 2100 4434 8602 0000 4881 SWIFT: CAIXESBBXXX Endereço: Avenida Icaria, 137-139 - 08008 Barcelona - Espanha PARA PAGAMENTOS EM MOEDA NACIONAL: • Barcelona Brasil Group – BBG Banco Bradesco Agência: 3114 - 3 Conta corrente: 0423365-4 • Quanta Consultoria Ltda. Banco Itaú Agência: 8789 Conta corrente: 330225
42.1	**A taxa de juros é:** Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, *pró rata-die.*
45.1	**As controvérsias serão resolvidas judicialmente de acordo com as seguintes disposições**: Fica eleito o foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato não resolvidas na esfera Administrativa.

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - 4º andar - Ala C - 80.530-140 - Curitiba - Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 - Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 206

IV. APÊNDICES

Apêndice A:

- Termo de Referência
- Proposta Técnica / Cronograma de Atividades

Apêndice B:

Composição das equipes e Currículo Vitae baseado nas experiências dos especialistas principais

Apêndice C:

Discriminação dos Preços do Contrato

Apêndice D:

Formulário de Garantia de Adiantamentos (Não se aplica)

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - 4º andar - Ala C - 80.530-140 - Curitiba - Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 - Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 207

APÊNDICE A

TERMO DE REFERÊNCIA

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 208

SEÇÃO 7: TERMOS DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA - TR

ELABORAÇÃO
DO PLANO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO LITORAL DO ESTADO DO PARANÁ - PDS_LITORAL

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº – 4º andar – Ala C - 80.530-140 – Curitiba – Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 – Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 209

2016

SUMÁRIO

SUMÁRIO **35**

1. INTRODUÇÃO **37**

1.1. Desenvolvimento Regional Sustentável 44

2. OBJETO **45**

3. OBJETIVO GERAL **45**

3.1. Objetivos Específicos 45

4. CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA **47**

4.1. Localização 47
4.2. Dinâmica Populacional 48
4.3. Contextualização 49
4.4. Planos, programas, projetos e estudos a serem considerados. 56
4.5. Marco Legal 58

5. METODOLOGIA **66**

5.1. Metodologia e processo participativo 68

6. GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO **69**

6.1. Equipe Técnica Intersecretarial – ETI 69
6.2. Equipe de Acompanhamento - EA 70

7. ETAPAS, PRODUTOS E CONTEÚDO MÍNIMO EXIGIDO. **71**

7.1. ETAPA 1: PLANO DE TRABALHO 72
7.1.1. Conteúdo Mínimo Exigido 72
7.1.2. Reunião Técnica 01 73
7.1.3. Oficinas de engajamento 73
7.1.4. Audiência Pública de Engajamento 74
7.2. ETAPA 2: CONTEXTUALIZAÇÃO DA REGIÃO 74
7.2.1. Conteúdo Mínimo 75
7.2.1.1. Sócio Territorial 75
7.2.1.2. Ambiental 77
7.2.1.3. Infraestrutura 79
7.2.1.4. Econômica 80
7.2.1.5. Institucional 81
7.2.2. Reunião Técnica 02 82
7.2.3. Oficinas de Contextualização 82
7.2.4. Audiência Pública de Contextualização 83
7.3. ETAPA 3: CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS E VISÃO DE FUTURO 83
7.3.1. Conteúdo Mínimo 84
7.3.2. Reunião Técnica 03 85
7.3.3. Oficinas de Construção de Cenários e Visão de Futuro 85
7.3.4. Audiência Pública de Construção de Cenários e Visão de Futuro 86
7.4. ETAPA 4: ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 86
7.4.1. Conteúdo Mínimo 86
7.4.1.1. Programas e metas 88

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - 4º andar - Ala C - 80.530-140 - Curitiba - Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 - Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 210

O documento final trata-se do documento consolidado e editorado, atendendo plenamente e satisfatoriamente a todos os itens previstos neste Termo de Referência.

A consultora deverá entregar uma lista sugerindo a quantidade e destinatários das cópias do documento final, bem como, uma prévia do documento final para a Equipe Técnica Intersecretarial – ETI.

A lista e o documento prévio serão avaliados em até 15 (quinze) dias e se necessário, retornará à contratada para no prazo máximo de 07 (cinco) dias proceda às correções.

Quando aprovado, a consultora terá a liberação de realizar a Conferência Regional e entregar o documento final para os destinatários.

A Conferência Regional deverá ser realizada em pelo menos um município e com a participação mínima de um representante de cada setor da sociedade, apontada previamente no Plano de Trabalho e divulgada amplamente para todos os envolvidos.

7.6. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Caberá à empresa contratada assumir toda a logística para a realização das oficinas e audiências públicas, tais como: reserva de locais adequados para a realização dos eventos, equipamentos e materiais necessários, divulgação, sistemas de áudio; filmagem dos eventos, relatórios fotográficos, equipamentos de multimídia, coffee-break, convites, transporte dos envolvidos, dentre outros.

A empresa contratada será responsável pelo fornecimento e gestão do transporte para a participação nas oficinas e audiências públicas e pela divulgação, com no mínimo quinze dias de antecedência, das oficinas, audiências públicas, reuniões e outros eventos, com os respectivos documentos, utilizando-se dos meios de comunicação como rádio, TV, redes sociais, internet, faixas, cartazes, etc.

Fica a cargo da contratada, desenvolver um ambiente on line (página na web) para a divulgação de todas as informações como relatórios, planos, projetos, vídeos, fotos, pesquisas, etc., bem como, deverá ser entregue e disponibilizadas na internet todas as apresentações realizadas.

Todo mapeamento das informações coletadas e produzidas deverão estar em uma plataforma integrada e georreferenciada, que permite o melhor conhecimento e gestão inteligente do território.

Caberá a contratada a impressão, diagramação e elaboração dos produtos a serem entregues. A quantidade e a forma de apresentação será relatada no item 8.

Exemplos de boas práticas e benchmark deverão ser utilizados para ilustrar os benefícios de abordagens alternativas e, se forem relevantes e transferíveis para recomendar a adoção de novos instrumentos, ferramentas, plataformas e metodologias. Para isto, deverão ser discutidas com a Equipe Técnica Intersecretarial - ETI para avaliação e aprovação.

8. FORMA DE APRESENTAÇÃO

Os produtos deverão ser entregues compostos por textos, mapas, croquis, fotografias, gráficos, tabelas, perspectivas, modelos 3D, maquetes e outros meios de diagramação das informações que permitam o completo entendimento dos dados coletados, suas sobreposições e análises. As informações coletadas deverão ser mapeadas, sempre que possível, a fim de gerar um conjunto de mapas temáticos.

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - 4º andar - Ala C - 80.530-140 - Curitiba - Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 - Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 211

7.4.1.2. Estratégias de financiamentos viáveis 88
7.4.1.3. Estratégia institucional e de gestão 88
7.4.1.4. Indicadores de monitoramento e avaliação 89
7.4.2. Reunião Técnica 04 89
7.4.3. Oficinas do Plano de Ação 89
7.4.4. Audiência Pública do Plano de Ação 90
7.5. ETAPA 5: CONFERÊNCIA REGIONAL 90
7.6. CONSIDERAÇÕES GERAIS 91
8. FORMA DE APRESENTAÇÃO 91
9. EQUIPES MÍNIMAS EXIGIDAS DA EMPRESA CONSULTORA 92
9.1. Equipes 92
9.1.1. Equipe Chave 93
9.1.2. Equipe de suporte da consultoria 94
9.1.3. Equipe de apoio 94
9.2. Qualificação da empresa / consórcio 94
10. CRONOGRAMA DE TRABALHOS 95

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - 4º andar - Ala C - 80.530-140 - Curitiba - Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 - Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 212

1. INTRODUÇÃO

> *"Pedimos legitimamente ao pensamento que dissipe as brumas e as trevas, que ponha ordem e clareza no real, que revele as leis que o governam. A palavra complexidade só pode exprimir nosso incômodo, nossa confusão, nossa incapacidade para definir de modo simples, para nomear de modo claro, para ordenar nossas ideias."*[1]

A estratégia para construção do "NOVO PARANÁ" [2] deve definir diretrizes com as quais governo e sociedade trabalhem juntos, buscando qualidade de vida, governança, sustentabilidade e desenvolvimento para todo o Estado. O objetivo é atingir um maior índice de desenvolvimento humano (IDH médio), direcionando o Estado para políticas voltadas para a desconcentração do desenvolvimento, uma vez que muitas regiões já demonstram capacidade de melhorar o desenvolvimento local. A diversificação das regiões aptas a investimentos deve, portanto, ser uma das prioridades, através da conformação de políticas de desconcentração econômica, que privilegiem as organizações e segmentos potenciais em atividades que priorizem as situações em que o desenvolvimento se mostra mais necessário e sustentável. Não obstante, é preciso aumentar, licitamente a riqueza do Estado ampliando a integração e o valor agregado em distintos campos da economia, considerando-se a sustentabilidade e a governança local, bem como, a segurança jurídica dos investimentos.

O desenvolvimento deve ser sustentado na *cooperação humana*, o que significa o incentivo a mecanismos democráticos, como participação pública, aprendizado social, sustentabilidade e empoderamento. Esta abordagem se coaduna com a teoria de Amartya Sen do *desenvolvimento como liberdade e expansão das capacidades*. Com este intuito, o desenvolvimento não pode ser resumido apenas ao crescimento econômico, mas sim visto como um processo *complexo*, valorativo e carregado de vicissitudes.

A cooperação é um dever estatuído em tratados internacionais, que emergiram de um consenso na comunidade internacional, como o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e a Declaração do Direito ao Desenvolvimento. A consecução de um desenvolvimento efetivo, por sua vez, é possível apenas pela articulação entre a *cooperação internacional* e a apropriação dos seus beneficiários locais. A prosperidade internacional é um objetivo presente não somente na Carta da ONU, como também nos Estatutos das Instituições de Bretton Woods.

O artigo 55 da Carta das Nações Unidas (ONU) estatui o dever de todos os Estados-membros de "promover o progresso social e melhores padrões de vida, em meio a maior liberdade." No mesmo sentido, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, enuncia o direito de todos "a um padrão de vida adequado, para saúde e bem-estar de si próprio e de

---

[1] *MORIN, Edgard. Introdução ao Pensamento Complexo. Tradução: Eliane Lisboa. Porto Alegre: Sulina 2011, p. 5.*
2 Metas do Governo do Paraná, 2011-2014, páginas 25 e 26.

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº – 4º andar – Ala C - 80.530-140 – Curitiba – Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 – Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 213

sua família, inclusive alimentação, vestuário, residência, cuidado médico e serviços sociais necessários (...)".

O Direito Internacional, em suas diversas ramificações, tem por fundamento a *cooperação internacional* em direção à conquista de objetivos comuns. As Instituições Financeiras Internacionais não estão apenas autorizadas, mas legalmente obrigadas a perseguir esses objetivos nos seus programas de empréstimo. Essas instituições não possuem uma faculdade, mas sim uma obrigação internacional de, ao realizar empréstimos, levar em consideração fatores não econômicos, porquanto um progresso efetivo das estratégias de construção de uma vida digna depende de uma ampla coalizão entre os indivíduos, grupos da sociedade civil, organizações não governamentais, governos, agências de desenvolvimento e organizações internacionais.

A Carta da Organização das Nações Unidas, em seu artigo primeiro, prevê a *cooperação econômica internacional*, que tem como objetivo o *desenvolvimento* e bem-estar das nações, o que culminou com um planejamento de assistência internacional técnica e financeira, integrado pelas Instituições Financeiras Internacionais (Bretton Woods), sobretudo o *Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional*, que deveriam uniram esforços para colaborar com o processo de *desenvolvimento*.

Neste processo, delineou-se a definição de *Desenvolvimento Sustentável*, no Relatório Brundtland "Nosso Futuro Comum", da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD, 1987)[3], posteriormente aperfeiçoado com a Conferência do RIO-92. O aspecto ambiental, assim, deveria ser considerado nos projetos financiados pelas Instituições de Bretton Woods, o que originou, posteriormente, no seio da *International Finance Corporation* (IFC), os *Princípios do Equador*, com objetivo de promover a sustentabilidade e o equilíbrio ambiental dos contratos financeiros.

As instituições financeiras internacionais e nacionais precisam exigir o cumprimento dos Princípios do Equador e, por consequência, das normas ambientais, pois não possuem uma *faculdade*, mas sim uma *obrigação internacional* de, ao realizar empréstimos, levar em consideração fatores não econômicos, porquanto um progresso efetivo depende de uma ampla coalizão entre os indivíduos, grupos da sociedade civil, organizações não governamentais, governos, agências de desenvolvimento e organizações internacionais. Em síntese, a disponibilização de recursos para o financiamento dos investimentos (*corporate finance* e *project finance*) precisa estar atrelada ao respeito à legislação ambiental.

Não existe, assim, uma oposição entre sustentabilidade e desenvolvimento, mas este necessariamente deve ser *sustentado* nas regras jurídicas, inclusive de matriz ambiental e de combate à corrupção, pois é uma contradição tratar-se de desenvolvimento sem proteger o patrimônio público ambiental.

A importância dessa abordagem reverbera nas próprias decisões de investimentos no Brasil. Os investimentos requerem garantias, instituições fortes e segurança jurídica. No atual cenário, verifica-se o sistema jurídico ambiental abalado com um projeto legislativo que desrespeita os princípios da vedação ao retrocesso, precaução e prevenção e uma

---

[3] *O relatório Brundtland preconiza "o desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades, significa possibilitar que as pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível satisfatório de* ***desenvolvimento social e econômico e de realização humana e cultural****, fazendo, ao mesmo tempo, um uso* ***razoável*** *dos recursos da terra e* ***preservando*** *as espécies e os habitats naturais". (Grifou-se)*

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº – 4º andar – Ala C - 80.530-140 – Curitiba – Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 – Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 218

jurisprudência que, apesar do discurso[4], não oferece a segurança jurídica necessária para a tomada de decisões firmes e a punição dos infratores, de forma a defender o cumprimento da Constituição da República e das Convenções Internacionais. A corrupção e a impunidade são as grandes inimigas do desenvolvimento.

O setor privado, por outro lado, precisa melhorar os seus controles internos e externos, *compliance*, *disclosure* e *accountabily* e implementar um sistema efetivo de *whistleblower*, observando, monitorando e controlando os danos ambientais causados por sua atividade, de forma a mitigar, compensar, indenizar e evitar os impactos ambientais. A responsabilidade corporativa ambiental é facilitada pelo uso de tecnologia e cria um ambiente de confiança aos stakeholders, sobretudo após a edição da Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

A *racionalidade* moderna precisa ser lida à luz do pensamento *complexo*, que considera todas as variáveis na tomada de decisões, pois eliminar a equação ambiental, apenas distorce o cálculo dos benefícios financeiros e do bem estar das populações atingidas. Destarte, imprescindível considerar os aspectos ambientais no financiamento de projetos, pois a suspensão de um licenciamento ambiental e urbanístico irregular, a interdição de atividades, o embargo de obras ou a persecução dos dirigentes das empresas e os prejuízos decorrentes são riscos de projetos sem a necessária auditoria ambiental.

Compreender o desenvolvimento como transformação de mentalidade significa que todos agentes assumirão *responsabilidades* no processo. Neste sentido, imprescindível o empoderamento da população e a apropriação do processo, através da participação ativa e eficaz. A cooperação como objetivo internacional perderia o sentido se não traduzida localmente por políticas mais solidárias e humanas.

O prisma do *desenvolvimento como liberdade e transformação* confere poder aos atores sociais que exerceriam sua *liberdade de escolha* democraticamente acerca do(s) modelo(s) mais adequado(s) à sua realidade social e política.[5] O cerne desta abordagem refere-se à expansão da liberdade como principal fim (papel constitutivo) e principal meio (papel instrumental) do desenvolvimento.[6] A *liberdade humana* é vista como objetivo supremo do desenvolvimento, sobretudo considerando que as liberdades políticas e econômicas se reforçam mutuamente. À luz da perspectiva constitutiva, o desenvolvimento é visto como um processo de expansão de liberdades reais desfrutadas pelos indivíduos. A perspectiva instrumental, que enxerga o respeito às liberdades como meio eficaz para o desenvolvimento, não pode, do mesmo modo, ser desprestigiada, considerando a interligação entre as diversas espécies de liberdade. Ressalte-se que, neste processo, os indivíduos não são passivos beneficiários de programas de desenvolvimento, ao contrário, são *agentes de mudança*

---

[4] *BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Notícias STF. Na China, ministro Lewandowski destaca papel do Judiciário na proteção ambiental. Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=288353 . Acesso em: 10 abr. 2015. A Lei nº 12.651/2012 substitui a Lei nº 4.771/1965 (Código Florestal) e, em razão de sua inconstitucionalidade, é objeto de três Ações Diretas de Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, propostas pela Procuradoria Geral da República (ADIs 4901, 4902 e 4903), que tratam da área de preservação permanente, redução da reserva legal e anistia aos promotores de degradação ambiental.*

5 Amartya Sen vislumbrou com precisão o equacionamento complementar entre o desenvolvimento social e a liberdade individual: "Existe uma acentuada complementaridade entre a condição de agente individual e as disposições sociais: é importante o reconhecimento simultâneo da centralidade da liberdade individual e da força das influências sociais sobre o grau e o alcance da liberdade individual. Para combater os problemas que enfrentamos, temos de considerar um comprometimento social." (SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. Trad. Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 10).

6 Em suas palavras: "O desenvolvimento consiste na eliminação de privações de liberdade que limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas de exercer ponderadamente sua condição de agente. A eliminação de privações de liberdades substanciais, argumenta-se aqui, é constitutiva do desenvolvimento." (SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. Trad. Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 10).

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº – 4º andar – Ala C - 80.530-140 – Curitiba – Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 – Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 219

capazes de escolher como conduzir suas vidas.

Na esteira deste raciocínio, Lopes vislumbra o *desenvolvimento como transformação*, o que significa: "fomentar processos domésticos, valendo-se da riqueza do conhecimento e das capacidades locais e expandindo-os para atingir objetivos e aspirações que o país definir."[7] Neste sentido, a *abordagem das capacidades* tem por enfoque as liberdades substantivas e as capacidades de escolha de uma vida que se valorize. A capacidade (*capability*) de um indivíduo refere-se à *liberdade substantiva* de efetuar combinações alternativas de funcionamentos possíveis em seu universo.

Os responsáveis pelos desenhos das políticas públicas possuem duas razões para se interessarem pelo vetor *justiça social*. Primeiro, a justiça é um valor cerne no delineamento dos objetivos de políticas públicas. Segundo, o senso de justiça incorporado pela comunidade deve ser conhecido para o atendimento de suas necessidades. Essa interrelação pode ser verificada no âmbito da corrupção. A corrupção dificulta a consecução das metas políticas, *inter alia*, pelo desvio de recursos humanos e financeiros a atividades ilícitas. A corrupção relaciona-se com a violação de regras de conduta com o fito de se auferir vantagem ilícita.[8]

A visão de liberdade adotada por Sen sustenta dois aspectos: o processo e a oportunidade. Os *processos* conduzem a liberdade de agir e decidir e as *oportunidades* dependem das circunstâncias pessoais dos indivíduos. Pode-se privar a liberdade, por intermédio de um processo (violação de direito político) ou oportunidade inadequada (capacidade de escapar da morte prematura). Estas duas vertentes configuram-se como constitutivas do desenvolvimento: (i) processos de tomadas de decisão (aspecto processo) e (ii) oportunidades de obter resultados considerados valiosos (aspecto oportunidade). Embora as oportunidades sejam ampliadas com a melhoria no nível de renda, há outros fatores de bem-estar que devem ser considerados, como alimentação, cultura, educação, energia, habitação, mobilidade, previdência social, saneamento básico, saúde, segurança, trabalho e transporte.[9]

O desenvolvimento não visa apenas ao labor (capacidade de sobreviver), ou ao trabalho (possibilidade de transformar a natureza), mas à *ação*. Como um processo que se retro alimenta, o desenvolvimento permite o *agir em conjunto dos indivíduos*, pois contribui para o despertar de sua consciência cidadã, da mesma forma como a capacidade de escolher, agir e transformar contribui para o desenvolvimento.

A liberdade como cerne do desenvolvimento possui as seguintes premissas: (i) a sua importância intrínseca (livres para escolher algo de que se prefira abdicar); (ii) seu papel *consequencial* de conceder incentivos políticos para a segurança econômica; (iii) seu papel *construtivo* de valores e prioridades, em *qualquer* cultura. A diversidade somente é conhecida no seio de uma sociedade livre. A liberdade permite participação e respeito, essenciais na pavimentação do caminho do desenvolvimento.[10] Conforme resumiu Lopes: "O desenvolvimento humano, definido como uma constante expansão das oportunidades dos indivíduos e sociedades merece e precisa da defesa das liberdades culturais de todo e de cada indivíduo." [11]

---

7 LOPES, Carlos. Cooperação e Desenvolvimento Humano: a agenda emergente para o novo milênio. São Paulo: Unesp, 2005, p. 86.
8 STIGLITZ, Joseph. Globalização: como dar certo. Trad. Pedro Maia Soares. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 131.
9 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. Trad. Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p.330-324.
10 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. Trad. Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 281-282.
11 LOPES, Carlos. Cooperação e Desenvolvimento Humano: a agenda emergente para o novo milênio. São Paulo: Unesp, 2005, p. 22.

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº – 4º andar – Ala C - 80.530-140 – Curitiba – Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 – Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 220

Ademais, o *Desenvolvimento deve ser Sustentado* no Estado de Direito Ambiental e nos Princípios Constitucionais da Democracia, República e Devido Processo Legal, legitimados na atuação dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e tendo como escopo a cooperação, nacional e internacional, tendo em vista o respeito às normas jurídicas socioambientais como condição, inclusive, de financiamento para o *desenvolvimento* e a liberdade dos cidadãos em participar da definição de estratégias para o desenvolvimento econômico e social. A visão inicial racionalista de maximizar a eficácia do sistema de produção, progressivamente, deu lugar a uma perspectiva mais humana, pois existem demandas políticas e sociais adicionais para acelerar a expansão da plena liberdade, com igualdade, justiça e a realização dos direitos fundamentais[12]. O processo de desenvolvimento pode ser descrito como a expansão da liberdade substancial[13], a saber, das capacidades das pessoas de levar o tipo de vida que valorizam ou têm razões para valorizar.14 O sucesso da promoção do pleno desenvolvimento depende de programas, recursos institucionais e financeiros adequados para atender a demanda de diferentes grupos sociais e do equilíbrio ambiental, sem prejuízo da melhoria dos mecanismos de *compliance* e *disclosure* de informações relevantes para construção da confiança dos *stakeholders*, traduzida na responsabilidade corporativa.

Além disso, deve-se observar a necessidade dos órgãos ambientais, componentes do SISNAMA (Sistema Nacional de Meio Ambiente), e demais instituições de planejamento, controle interno e externo, se fortalecerem, no sentido de capacitar a equipe, melhorar a metodologia e as técnicas de trabalho, planejamento, fiscalização, aplicação de sanções e orientação dos cidadãos, administrados e jurisdicionados, pessoas físicas e jurídicas, para permitir procedimentos administrativos e processos judiciais *eficazes, impessoais e transparentes.*

Portanto, o *desenvolvimento sustentado* exige: **(i)** o respeito ao Estado de Direito Ambiental, **(ii)** a obediência aos Princípios Republicanos e **(iii)** o respaldo Democrático, baseado na cooperação humana, o que significa, inclusive, o incentivo a mecanismos democráticos como participação pública, aprendizado social, sustentabilidade e empoderamento. Esta abordagem se coaduna com a teoria de Amartya Sen do desenvolvimento como liberdade e expansão das capacidades. A base da metodologia, assim, deve ser a cooperação, um dever estatuído em tratados internacionais, que emergiram de um consenso na comunidade internacional, cuja obediência deve ser buscada em nível local através do diálogo participativo-democrático e do *agir em conjunto* na esfera política. O valor do diálogo e a da apropriação da *res* pública são pilares fundamentais de uma *cooperação verdadeiramente humana.*

O estudo deve apontar, além da valoração do dano, do impacto ambiental e das compensações ambientais, os *prejuízos* patrimoniais e extrapatrimoniais, que devem ser ressarcidos (art.1º, I, da Lei nº. 7.347/85). A *reparação integral* do dano ambiental não se confunde com a *reconstituição* do bem lesado, havendo uma presunção da necessidade de cumulação dessa reconstituição (restauração ou recuperação) com o dever de indenização/compensação do dano ambiental, em decorrência da sua *complexidade*, do

---

[12] SENGUPTA, Arjun O Direito ao Desenvolvimento como um Direito Humano, Social Democracia Brasileira, março, 2002, p. 82.

[13] SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. Tradução de: "Development as Freedom", por Laura Teixeira Motta, São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 10.

[14] "Se o desenvolvimento funda-se na realização das potencialidades humanas, é natural que se empreste a esta ideia um sentido positivo. As sociedades são desenvolvidas na medida em que nelas mais cabalmente o homem logra satisfazer suas necessidades e renovar suas aspirações." (Celso FURTADO. Pequena Introdução ao Desenvolvimento: enfoque interdisciplinar, I p. IX.).

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - 4º andar - Ala C - 80.530-140 - Curitiba - Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 - Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 221

amplo espectro de impacto na flora, fauna e no ser humano e do desestímulo à degradação ambiental, do dano real *post factum* e do dano provável.

Importante salientar ainda o papel relevante da *interpretação* para preservação da *força normativa da constituição*: "a interpretação constitucional está submetida ao princípio da ótima concretização da norma (*Gebot optimaler Verwirklichung der Norm*)" (HESSE, 1991, p. 22) e deve ser realizada dentro de certos limites, como condição fundamental da *força normativa* e da estabilidade da Constituição, sobretudo no que concerne à preservação ambiental.[15]

Portanto, a partir da Constituição de 1988, buscou-se estruturar um sistema normativo de proteção aos direitos fundamentais sociais e ambientais e de deveres correspectivos, dentre eles, o dever de *fiscalização* e *punição* das infrações ambientais, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente, punindo-se os respectivos infratores, e destinando-se os recursos auferidos à restauração e recuperação do dano ambiental.

Neste sentido, constrói-se e mantêm-se o **Estado de Direito Ambiental**, alicerçado sobre a eficácia das normas ambientais e impulsionado pelo seu efeito *concretizador*, com a conservação, preservação e recuperação dos bens jurídicos ambientais. Existe, portanto, um *dever constitucional*, chancelado sob a perspectiva internacional, de que o Estado busque formas lícitas de unir esforços para aprimorar a eficácia e a transparência da fiscalização e recuperação do dano ambiental.

O *desenvolvimento humano* e a *cooperação internacional* interligam-se justamente no viés ético de um rico espaço de debate. Os organismos internacionais, sob os auspícios da ONU, sustentam justamente o papel de transformar os direitos de declaração em direitos de ação. Essa transformação integra o processo de desenvolvimento.

O Pacto Global da ONU é uma iniciativa política estratégica para empresas, entidades civis e governos que estão empenhados em alinhar suas operações e estratégias aos dez princípios universalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção, com vistas à implementação de práticas de sustentabilidade e catalisação de ações de apoio a objetivos mais amplos da ONU, incluindo os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

---

[15] *HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição. Die normative Kraft der Verfassung. Tradução Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1991, p. 22.*

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº – 4º andar – Ala C - 80.530-140 – Curitiba – Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 – Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 222

O Programa Cidades, por sua vez, é o componente urbano do Pacto Global da ONU, que reconhece que cidades, em particular, têm o potencial de fazer grandes avanços na criação de sociedades sustentáveis – nas quais questões econômicas, ecológicas, políticas e culturais são integradas e trabalhadas em conjunto, com todos os níveis de governo, empresas e sociedade civil para aumentar a sustentabilidade, resiliência, diversidade e adaptação das cidades em face dos complexos desafios urbanos. O Estado do Paraná e os Municípios de Antonina, Morretes e Paranaguá aderiram ao Programa das Cidades e, por consequência, possuem o dever de pautar suas políticas públicas nos objetivos de desenvolvimento sustentável e nos dez princípios universalmente aceitos, inclusive a preservação ambiental e o combate à corrupção.

Para isto, o ponto de convergência de todo o esforço da sociedade e do Estado, deve ser o desenvolvimento regional e local integrados e sustentados. Uma das regiões prioritárias é o litoral do Paraná, que detém elementos naturais com riquíssima biodiversidade (Mata Atlântica, a Serra do Mar e a Zona Costeira e que são considerados patrimônio nacional - CF, art. 225, § 4º), atividades econômicas essenciais, não apenas à nível local mas à nível internacional e questões sociais e institucionais que devem ser alavancadas, para atingir um nível de desenvolvimento sustentado.

As mudanças e conflitos que ocorrem no litoral do Paraná motivaram o Governo do Estado, sob a coordenação da Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral – SEPL, a propor a contratação de consultoria especializada para a elaboração do Plano para o Desenvolvimento Sustentável do Litoral do Paraná – PDS_LITORAL, com o objetivo de sintonizar as ações dos três níveis de governo e da sociedade local, de forma a concentrar esforços na definição de ações que permitam o desenvolvimento sustentável da região.

Importante ressaltar que, por se tratar de trabalho altamente especializado e de caráter não rotineiro, além da imparcialidade no tocante aos produtos esperados, foi sugerida a contratação de consultoria independente.

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº – 4º andar – Ala C - 80.530-140 – Curitiba – Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 – Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 223

Este documento apresenta o termo de referência, instrumento de orientação para a elaboração do Plano para o Desenvolvimento Sustentável do Litoral do Paraná – PDS_LITORAL.

1.1. Desenvolvimento Regional Sustentável

Com o intuito de tratar do Desenvolvimento Sustentável, e particularmente do Desenvolvimento Regional Sustentável, é importante citar primeiramente o conceito de desenvolvimento sustentável, definido em 1987 no Relatório Brundtland:

> *"Desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades das gerações presentes sem comprometer a capacidade de as futuras gerações satisfazerem suas próprias necessidades".*

Este é um conceito abrangente e indiscutível, porém se faz necessário buscar mais especificamente os recortes regionais existentes. Buarque (2002) define desenvolvimento local sustentável como "um processo endógeno de mudança, que leva ao dinamismo econômico e à melhoria da qualidade de vida da população em pequenas unidades territoriais e agrupamentos humanos".

Por outro lado, segundo o próprio autor (Buarque 2006), a equação do desenvolvimento sustentável para um recorte territorial, envolve muitas outras variáveis além do dinamismo econômico e melhor qualidade de vida da população, como a criação de novas *institucionalidades*, mudanças nas relações de trabalho, crescimento econômico seletivo, maior competitividade dos investimentos, novos padrões de consumo e produção e o crescimento de setores terciários e quaternários da economia. Em se tratando de uma região tão dinâmica em termos ecossistêmicos e sociais como o litoral do Paraná, deve-se considerar fatores como a vulnerabilidade, o risco, a resiliência, inclusive às mudanças climáticas, as fragilidades dos ecossistemas, as necessidades de conservação e manutenção dos processos ecológicos. O desenvolvimento sustentável é então aquele que consegue fazer todas essas variáveis oscilar em torno de valores ótimos relativos à complexa trama ambiental-social-político-econômica-territorial, buscando-se um equilíbrio que considere a preservação ambiental e a qualidade de vida da população, como, por exemplo, o Butão, país que implementou a Felicidade Interna Bruta (*Gross National Hapinnes*), cuja essência é a paz e a felicidade dos cidadãos, a segurança e a soberania da nação, baseadas em nove domínios: bem estar psicológico, padrão de vida, boa governança, educação, saúde, vitalidade da comunidade, diversidade cultural e resiliêcia, uso do tempo e diversidade ecológica e resiliência.[16]

A unidade territorial discutida pode ser considerada como uma unidade de desenvolvimento territorial sustentável. Dentro desta temática, Cazella, Bonnal e Malluf (2009) ressaltam que o território não é apenas uma realidade geográfica ou física, mas uma realidade humana, social, cultural e histórica. Pensar em desenvolvimento regional sustentável é "promover o desenvolvimento e a gestão de políticas públicas para uma lógica

[16] *Disponível em: http://www.grossnationalhappiness.com/. Acesso em: 08.12.2015.*

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - 4º andar - Ala C - 80.530-140 - Curitiba - Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 - Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 224

baseada em projetos que valorize as vocações e os recursos específicos do território". (Beduschi Filho e Abramovay, 2004).

2. OBJETO

A Contratação de consultoria especializada para elaboração do Plano para o Desenvolvimento Sustentável do Litoral do Paraná (PDS_LITORAL).

3. OBJETIVO GERAL

Traçar diretrizes e ações estratégicas para o desenvolvimento sustentável do Litoral do Paraná, respeitando as peculiaridades de cada município e fragilidade ambiental da região, protegendo o patrimônio natural, histórico e cultural, e garantindo o protagonismo dos atores locais no processo de elaboração e implementação do PDS_LITORAL.

3.1. Objetivos Específicos

- **Contextualizar a região,** através do levantamento, análise, compilação e diagnóstico de trabalhos existentes (diretrizes, planos, programas, projetos, metas, etc. - verificar capítulo 4.4. Planos, programas, projetos e estudos a serem considerados), de dados primários e secundários, legislações existentes e válidas (identificando-se eventuais conflitos), dentre outros, identificados durante os trabalhos.
- **Complementar a contextualização** da região com a elaboração de dados primários e pesquisas, aproveitando as contribuições coletadas nos eventos (reuniões, oficinas e audiências) a serem realizados, organizando e analisando as informações de forma integrada e dinâmica.
- Identificar, contextualizar, compatibilizar e propor um **ordenamento territorial** dos planos diretores municipais, da gestão da bacia hidrográfica, das unidades de conservação e das diretrizes do gerenciamento costeiro, em torno de uma perspectiva regional (macrozoneamento) de desenvolvimento sustentável, especialmente no que se refere à ocupação territorial (uso e ocupação do solo); infraestrutura logística e mobilidade (ferrovias, portos, aeroportos, rodovias, etc.), infraestrutura urbana (saneamento, energia, equipamentos e serviços públicos, etc.), áreas de risco, e Proteção e Preservação Ambiental (formação de corredores ecológicos e proteção da biodiversidade, respeitando-se a legislação[17] ambiental, sanitária, social e urbanística, internacional e nacional).
- **Identificar e contextualizar a relação da região de estudo** com o Estado do Paraná, outros estados, regiões vizinhas e com o litoral brasileiro, especialmente

[17] *Por exemplo, Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001), Política Nacional (Lei nº 6.938/1981), Estadual e Municipal do Meio Ambiente, Código Florestal (Lei nº 4.771/1965 e nº 12.651/2012), Lei da Mata Atlântica (Lei nº 11.428/2006), Decreto Lei nº 3.365/1941, Lei nº 4.132/1962, Lei nº 6.766/1979, Lei nº 7.347/1985, Lei nº 8.429/1992, Lei nº 9.605/1998, Lei nº 9.985/2000, Lei nº 10.605/2003 e Lei nº 12.846/2013, além da jurisprudência estadual e federal da região – Ver Capítulo 4.5 Marco Legal.;*

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS. Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº – 4º andar – Ala C - 80.530-140 – Curitiba – Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 – Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 225

considerando a gestão do Mosaico Lagamar e as relações do custo-benefício econômico-social-ambiental para o Litoral.

- Identificar, contextualizar, compatibilizar e propor as principais **funções públicas de interesse comum** entre os municípios, evidenciando suas relações, semelhanças e peculiaridades, com a finalidade de subsidiar a criação uma governança Interfederativa de cada tema levantado, através de propostas de diretrizes e ações para o desenvolvimento de programas, planos e projetos a serem desenvolvidos em conjunto pelos municípios, com a possibilidade da celebração de termos de cooperação técnica que vinculem os Municípios;
- Identificar e contextualizar os principais arcabouços institucionais da região, rever e propor a modernização dos **instrumentos legais e institucionais** de gestão urbana, ambiental e territorial, estabelecendo as bases para a modernização/criação de instância de gestão interfederativa compartilhada, através de uma unidade/comitê/conselho de planejamento e coordenação permanente, considerando-se, sempre, os princípios da prevenção, precaução e proibição do retrocesso em matéria ambiental, de matriz constitucional;
- **Elaborar cenários prospectivos** econômicos, sociais, ambientais, de infraestrutura logística e urbana e do uso e ocupação do território, baseadas em projeções demográficas e de crescimento industrial / turística a serem desenvolvidas, avaliando a capacidade de suporte do território, de modo a subsidiar ações para a melhoria da qualidade de vida, a preservação e proteção ambiental e a promoção do desenvolvimento regional. Estes cenários deverão respeitar fundamentalmente a fragilidade ambiental da região e de proteção da biodiversidade.
- Propostas de **modelos de ocupação** para implantação e ampliação de grandes equipamentos logísticos, estruturas viárias, instalações industriais, grandes empreendimentos imobiliários, hidrelétricos, minerários, dentre outros, com a construção de cenários possíveis, considerando e avaliando os impactos ambientais, sanitários, social e urbanístico resultantes, identificando biodiversidade e as comunidades direta e indiretamente atingidas e os custos de mitigação, compensação, restauração e recuperação ambiental.
- **Avaliar sinergicamente os impactos ambientais**, sanitários, sociais e urbanísticos resultantes dos cenários e modelos de ocupação propostos; valorar os impactos ambientais, os serviços ecossistêmicos e as compensações ambientais, dos empreendimentos existentes e potenciais, elaborando-se uma matriz que permita a valoração do dano sinérgico, a valoração dos serviços ecossistêmicos, a valoração do impacto em áreas de preservação permanente, na Mata Atlântica, nas Unidades de Conservação e na Fauna, visando, inclusive, à melhoria do cuidado com a Fauna e a Flora, da gestão das Unidades de Conservação, com o incremento da regularização fundiária, segurança, fiscalização e vigilância
- Propostas de metas para a adaptação dos territórios municipais aos possíveis **impactos das mudanças climáticas**, já prognosticados a partir de pesquisas e

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - 4º andar - Ala C - 80.530-140 - Curitiba - Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 - Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 226

estudos já realizados, incluindo ações de adaptação baseada em ecossistemas fomentadas pelos governos Federal, Estadual e GIZ;

- Integrar políticas, planos e ações do Plano de Desenvolvimento Sustentável ao **conhecimento científico e tradicional** existente;
- Integrar o mandamento de **preservação, proteção e conservação ambiental** com os desafios do desenvolvimento econômico e social sustentável;
- Proposta de um **plano de ação, com diretrizes, propostas e metas** que visem ações de curto, médio e longo prazo dos poderes público federal, estadual e municipal, iniciativa privada e sociedade em geral, que promovam o desenvolvimento econômico e social sustentável; a preservação, proteção e a conservação do meio ambiente e do patrimônio histórico e cultural; revisão a e modernização dos instrumentos legais e institucionais e de gestão urbana e territorial por meio da governança territorial, considerando-se, sempre, os princípios da prevenção, precaução e proibição do retrocesso em matéria ambiental, de matriz constitucional;
- Garantir a **participação de instituições** governamentais, sociedade civil, academia, terceiro setor e empresas da região para a colaboração, construção e implementação do plano, formalizando os compromissos firmados e consolidando o processo de planejamento participativo contínuo.

Tais diretrizes, propostas e metas, traduzir-se-ão num conjunto de projetos, priorizando e complementando aqueles que já estão em processo de discussão e estudos, tais como: a recuperação física da orla marítima; o controle de cheias e enchentes; estruturação das Unidades de Conservação existentes; criação de novas unidades de conservação; gestão para a conservação da biodiversidade marinha e dos recursos pesqueiros; ordenamento pesqueiro; turismo de baixo impacto; prevenção e o monitoramento de acidentes naturais e acidentes antrópicos e consequentemente o seu atendimento; o monitoramento da qualidade do ar, do solo e das águas; a proteção da biodiversidade; as demandas e necessidades de infraestrutura, em especial aquelas que propiciam a movimentação de cargas e consequentemente a exportação e a importação – vias, ferrovias, portos, aeroportos, arranjos logísticos e os voltados à mobilidade urbana das cidades e à acessibilidade dos balneários; a modernização da atuação do Poder Público naquele espaço através a revisão da sua atuação jurídica e institucional e implementação de gestão tecnológica e sustentável (*smart cities*);

Ou seja, o Plano pautará a elaboração e implementação de políticas públicas estaduais para o litoral do Paraná e deverá servir de subsídio para as demais esferas governamentais, iniciativa privada e instituições de ensino e pesquisa, extensão e inovação.

4. CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA

4.1. Localização

Composto por sete municípios (Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná), a região do litoral paranaense apresenta diversas

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - 4º andar - Ala C - 80.530-140 - Curitiba - Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 - Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 227

características econômicas, sociais, ambientais, culturais e históricas de extrema importância e complexidade, não apenas para o estado, mas também para o Brasil.

Figura 1: Municípios da área de estudo do plano

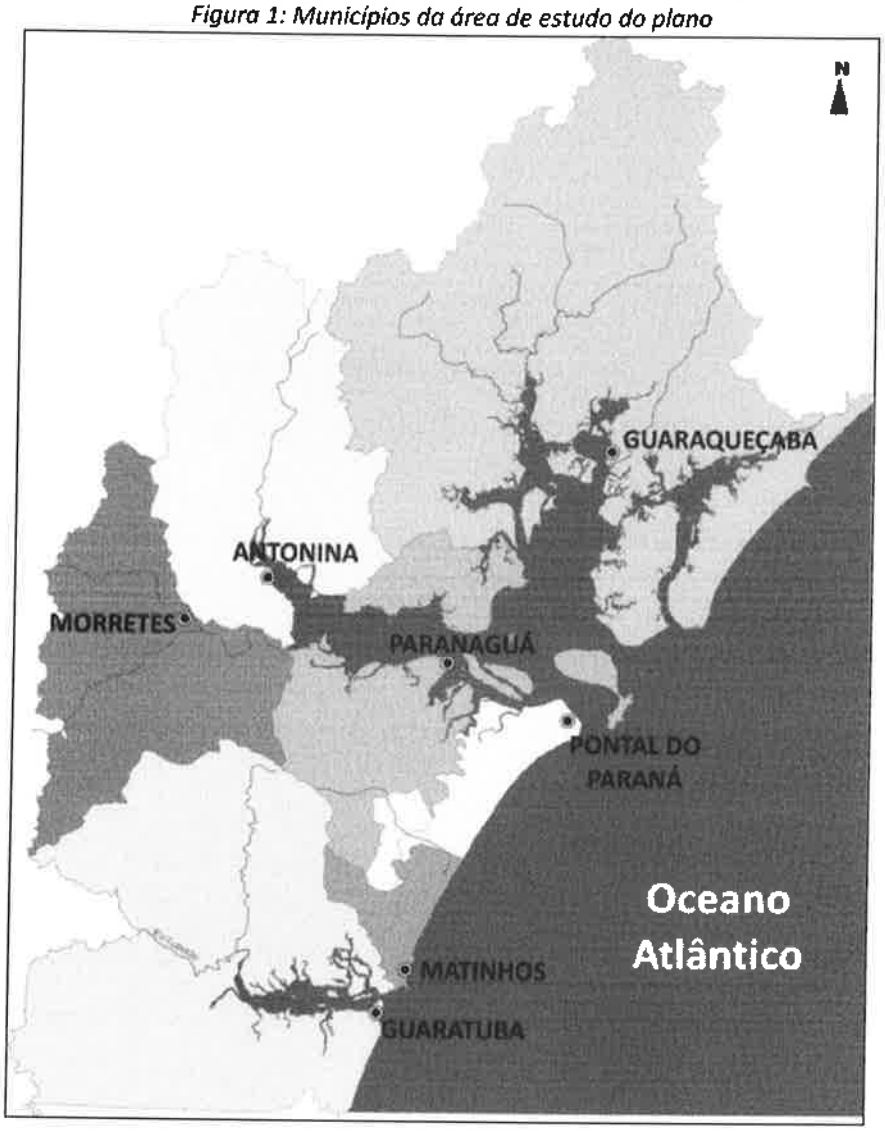

Fonte: SEPL (2015)

4.2. Dinâmica Populacional

A dinâmica populacional dos municípios do litoral paranaense apresenta situações distintas, com impacto relacionado a mudanças econômicas e sociais em seu território. Exemplo disso é o município de Matinhos, que teve a implantação da Universidade Federal do Paraná – UFPR Litoral, em Caiobá (Matinhos), gerando uma nova dinâmica populacional, que resultou no maior incremento populacional entre os municípios do litoral, de 1991 a 2010, como demonstram a Tabela 1 e o Gráfico 1.

Tabela 1: População dos Municípios do Litoral Paranaense por situação do domicílio, 2010.

MUNICÍPIOS	POPULAÇÃO						INCREMENTO POPULACIONAL 1991/2010
	2010		2000		1991		
	Total	Urbana	Total	Urbana	Total	Urbana	

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - 4º andar – Ala C - 80.530-140 – Curitiba - Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 – Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 228

Antonina	18.891	15.576	19.174	15.587	17.070	14.018	*1.821*
Guaraqueçaba	7.871	2.556	8.288	2.582	7.762	1.742	*109*
Guaratuba	32.095	27.561	27.257	23.156	17.998	14.019	*14.097*
Matinhos	29.428	29.279	24.184	24.000	11.325	10.866	*18.103*
Morretes	15.718	6.732	15.275	7.153	13.135	6.194	*2.583*
Paranaguá	140.469	131.776	127.339	122.347	107.675	94.689	*32.794*
Pontal do Paraná	20.920	20.743	14.323	14.149	-	-	*20.920*

Nota-se na Tabela 1, que o crescimento populacional ocorreu mais intensamente no município de Matinhos, que teve um incremento populacional de aproximadamente 160% no período 1991-2010, enquanto Guaratuba alcançou o valor percentual de 78,3%, no mesmo período. A população de Guaraqueçaba praticamente permaneceu estável durante essas duas décadas com um incremento insignificante de 1,4%. Paranaguá – polo da microrregião – apresentou o maior crescimento em valores absolutos, com 32.794 novos habitantes.

Figura 2: Incremento Populacional em %, por Município entre 1991 e 2010.

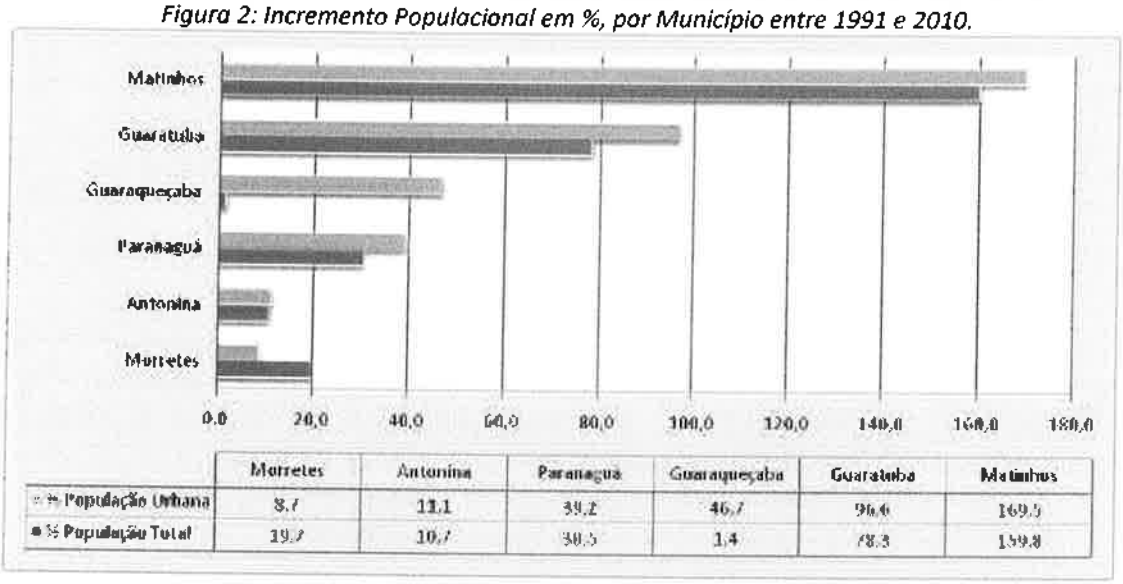

	Morretes	Antonina	Paranaguá	Guaraqueçaba	Guaratuba	Matinhos
% População Urbana	8,7	11,1	39,2	46,7	96,6	169,5
% População Total	19,7	10,7	30,5	1,4	78,3	159,8

Fonte: Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010 (IBGE,2010).

4.3. Contextualização

Na dimensão ambiental, mais de 81% de todo o território do litoral é considerado Área de Preservação[18], com uma série de unidades de conservação que protegem uma das porções de remanescentes de Mata Atlântica mais conservadas do Brasil. Devem ser consideradas ainda as seguintes premissas ambientais, tais como: A ocorrência de ecossistemas preservados e com alta biodiversidade que sustentam atividades econômicas e de subsistência da população local; O potencial dos atributos ambientais para o ecoturismo, o lazer náutico, a recreação, a pesca esportiva e o mergulho recreativo; O potencial de estruturação e utilização das UCs

18 ZONEAMENTO ecológico - econômico do estado do Paraná: fase litoral. Camila Cunico (Org.). Curitiba: ITCG, 2013, Páginas 232; áreas de preservação permanente, áreas úmidas, áreas de manancial, áreas de Mata Atlântica e áreas de Unidade de Conservação de proteção integral e uso sustentável, que devem ser necessariamente preservadas, conservadas e protegidas.

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - 4º andar - Ala C - 80.530-140 - Curitiba - Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 - Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 229

da região para visitação pública e fo-mento ao turismo no litoral, com a possibilidade de polos turísticos com impactos regionais positivos; A utilização das UCs para o incremento do ICMS Ecológico dos municípios; A conservação e a preservação dos ecossistemas e da biodiversidade não antagoniza com o desenvolvimento sustentável; Várias atividades industriais e acidentes operacionais afetam e deterioram os processos ecossistêmicos e comprometem e restringem os benefícios ambientais, sociais e econômicos de ambientes conservados;

Na dimensão cultural e histórica conta com a presença de um vasto patrimônio histórico e cultural, principalmente nas cidades de Paranaguá, Morretes, Antonina e Guaraqueçaba, com os conjuntos de casario histórico, comunidades tradicionais, gastronomia, folclore e manifestações culturais.

Na dimensão econômica, as atividades portuárias localizadas em Paranaguá e Antonina são de fundamental importância para região, para o Estado e para ao país, tendo como destaque o Porto de Paranaguá, um dos maiores exportadores de grãos do país e que gera aproximadamente muitos empregos diretos e indiretos.

Outra atividade econômica de extrema importância e de grande impacto é o turismo. O litoral paranaense, durante o ano de 2010, recebeu mais de 1.800.000 visitantes, principalmente na temporada de verão, sendo que, 65% se concentraram nos municípios balneários (Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná)[19]. Alguns municípios chegam a ter uma população de 10 a 17 vezes maior que a população residente.

Na dimensão social, observa-se que os municípios apresentam indicadores sociais baixos e diversificados. Enquanto os municípios balneários (Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná) e Paranaguá apresentam um IDH-M Alto, Morretes e Antonina apresentam um IDH-M Médio, enquanto Guaraqueçaba apresenta um dos IDH-M mais baixos de todo o estado.

Todas estas dimensões são complementadas pela crescente necessidade da melhoria e implantação de infraestrutura logística (ferrovia, rodovia, portos e aeroportos) e infraestrutura urbana (saneamento, energia, equipamentos e serviços públicos), bem como a melhoria da alimentação, cultura, educação, energia, habitação, mobilidade, previdência social, saneamento básico, saúde, segurança, trabalho e transporte. Além disso, é imprescindível a melhoria da fiscalização e da metodologia de licenciamento e monitoramento, tendo em vista o imenso impacto do tráfego pesado de veículos; da poluição atmosférica, aquática e de solo; dos acidentes ambientais e dos incêndios; da zoonoses, dengue e doenças alérgicas e na falta de requisitos básicos para o funcionamento dos empreendimentos, como a regularidade do licenciamento ambiental, sanitário, de segurança e urbanístico, refletindo no grande volume de ações judiciais, pela ausência do Estado de Direito (Rule of Law).

Observa-se que o Litoral e a RMC somam as maiores ocorrências de desastres no Paraná devido aos altos índices pluviométricos e pela falta de fiscalização, monitoramento e prevenção.

A região litorânea abriga 265.392 habitantes[20], podendo este número aumentar expressivamente durante o verão, devido às férias e deslocamentos de turistas. Para tal, é

---

19 ZONEAMENTO ecológico - econômico do estado do Paraná: fase litoral. Camila Cunico (Org.). Curitiba: ITCG, 2013, Páginas 236;
20 IBGE, Censo 2010.

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº – 4º andar – Ala C - 80.530-140 – Curitiba – Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 – Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 230

necessário um conjunto de ações preventivas relacionadas à prevenção destes desastres, conflitos ambientais e melhoria de infraestrutura.

Figura 3: Unidades de Conservação, Áreas Turísticas e Portuária e infraestrutura logística.

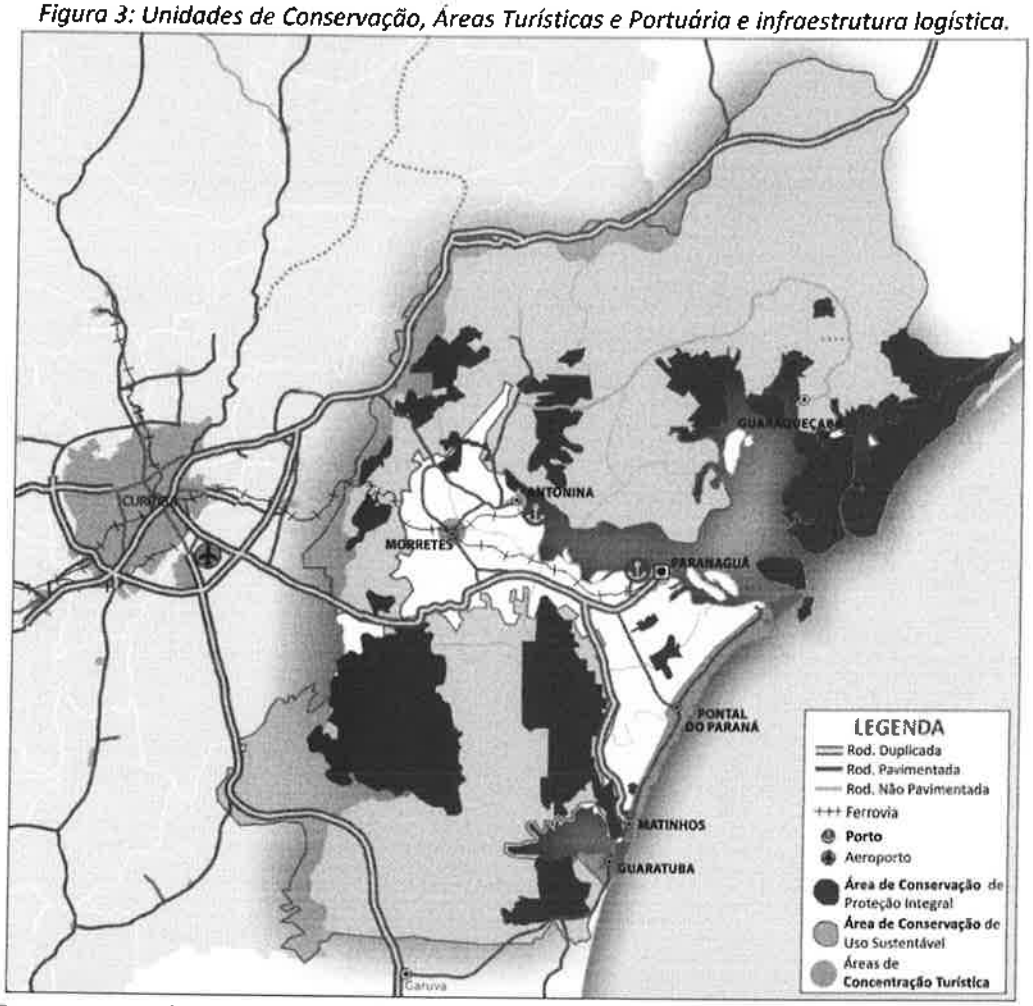

Para tanto, devem ser levados em consideração diversos elementos vinculados às mudanças ocorridas do ponto de vista socioeconômico e aqueles relacionados à preservação e conservação do patrimônio ambiental, histórico e cultural da região:

a) A existência de diversas **unidades de conservação ambiental** relevantes, que necessitam de estratégias de valorização junto à sociedade de forma a garantir sua manutenção, estruturação e perenidade, destacando-se as áreas com amplitude e reconhecimento internacional:
   - Serra do Mar. Em 5 de junho de 1986 foi decretado o tombamento da Serra do Mar (publicado no DOE n.º 2290, de 05/06/86), com o objetivo de garantir a preservação das paisagens naturais de grande valor histórico e cultural, assegurando ao mesmo tempo a manutenção das matas nativas, que representam a maior reserva de remanescentes de floresta atlântica do país e originais do estado do Paraná, que totaliza uma área de 386.500 há;
   - Reserva da Biosfera da Mata Atlântica/ UNESCO - As Reservas de Mata Atlântica do Sudeste, nos estados de Paraná e São Paulo, reúnem alguns dos melhores e maiores exemplos de Mata Atlântica no Brasil. As 25 áreas protegidas que

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS. Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - 4º andar - Ala C - 80.530-140 - Curitiba - Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 - Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 231

formam o sítio (cerca de 470.000 hectares, no total) preservam a riqueza biológica e a história evolucionária dos últimos vestígios de vegetação atlântica remanescentes. Com montanhas cobertas por densas florestas, passando por áreas de mangue, ilhas costeiras com montanhas isoladas e dunas, a área compreende um ambiente natural rico e um cenário de grande beleza;

- Sitio do Patrimônio Histórico/ ONU – Parque Nacional do Superagui;
- Mosaico de Áreas Protegidas Lagamar- englobando o litoral sul do estado de SP e todo o litoral do PR.

b) A existência de um vasto **patrimônio histórico e cultural**, principalmente nos municípios de Antonina, Morretes e Paranaguá, que possibilita o resgate da história do Estado do Paraná como função educativa ao público jovem e, que deve ser valorizado pelo segmento de turismo histórico. Historicamente o Litoral do Paraná destaca-se pela sua importância na colonização do Paraná, tendo algumas das cidades mais antigas do Estado. As primeiras colonizações, datadas do século XVI, aconteceram em Guaraqueçaba e Paranaguá, por portugueses, e um pouco mais tarde, no século XVII, foram encontrados em Antonina, os primeiros vestígios de ocupação humana da região em sambaquis. Além da colonização portuguesa, a região tem registros de habitantes primitivos como os índios Tupiniquins e Carijós que contribuíram diretamente para os nomes de cidades, balneários e atrativos da região. Toda esta miscigenação construiu na região, uma cultura muito rica no seu folclore, manifestações culturais e gastronômicas, que merecem ser valorizadas e preservadas. Por essas razões, existem importantes setores do que pertencem ao patrimônio histórico cultural e ambiental, destacando-se entre eles:

- O centro histórico de Paranaguá, caracterizado por densidade de ocupação que vem se mantendo inalterada ao longo dos anos em que as construções de caráter histórico determinam o gabarito para as novas edificações. (Inscrição Tombo 109-II. Processo nº17/90 de 22 de dezembro de 1.990).
- Centro Histórico de Antonina, tombado pelo IPHAN,
- A Orla de Matinhos, incluindo todos os bens de caráter material que caracterizam a paisagem original da área tombada, especialmente: (a) a orla marítima; (b) a faixa de praia; (c) as pontas e pontais; (d) os costões e outros afloramentos rochosos; (e) as dunas frontais; (f) a vegetação nativa existente na área tombada; (g) os morros e elevações; (h) as ilhas; (i) a linha do horizonte como vista pelos observadores situados nos níveis da calçada e da praia; (j) os rios e demais corpos d'água; (l) as edificações de interesse cultural; (m) os sítios de valor arqueológico, histórico e artístico; (n) as manifestações culturais típicas do local; (o) os serviços ecossistêmicos, entendidos como aqueles componentes da natureza que são diretamente usufruídos, consumidos ou usados para sustentar ou aumentar a qualidade de vida humana. (Inscrição Tombo 23-I. Processo nº23/70 de 15 de fevereiro de 1970).
- O Caminho do Itupava, incluindo sua área de influência, que perpassa por unidades de conservação, de forma a manter a integridade das suas características. A parcela do caminho objeto do tombamento compreende o trecho localizado entre o distrito de Borda do Campo, no município de Quatro Barras e o distrito de Porto de Cima, no município de Morretes. Quase a

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - 4º andar – Ala C - 80.530-140 – Curitiba – Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 – Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 232

totalidade deste trecho encontra-se na área de tombamento da Serra do Mar, exceto uma pequena parcela de 1.729 metros na localidade denominada Prainhas, em Porto de Cima. O tombamento foi homologado em 25 de julho de 1986 pelo Conselho Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, com fundamento na lei 1.211, de 16 de setembro de 1953, que dispõe sobre o patrimônio histórico, artístico e natural do Estado do Paraná.

c) O fortalecimento das atividades características do **turismo**, conforme definido pela lei Estadual nº 15973 de 13 de Novembro de 2008, que instituiu a Política de Turismo do Paraná. De acordo com o Plano de Desenvolvimento do Turismo do Paraná (2008-2011):

> *(...) o litoral, tem o maior movimento no período de dezembro a fevereiro, quando passam pela região um número superior a um milhão de visitantes, buscando principalmente o sol e as praias, como também os inúmeros produtos de ecoturismo, náutico, turismo de aventura que são explorados ao longo do ano, mas ainda com pouca representatividade.*

A movimentação econômica gerada pelo turismo fez com que o Litoral do Paraná fosse considerado pelo Ministério do Turismo como uma das três regiões turísticas prioritárias do estado, bem como Paranaguá fosse considerado como destino indutor para o turismo internacional no Plano Nacional de Turismo 2007 – 2010.

O litoral paranaense tem uma importância estratégica para o estado e sua economia devido aos portos de Paranaguá e Antonina, que poderão ser utilizados também para embarque e desembarque de cruzeiros marítimos, reforçando as aptidões turísticas locais que necessitam de infraestrutura para absorver o aumento da atividade. O Estado do Paraná vem se destacando no cenário turístico brasileiro sendo o quarto estado mais visitado (FIPE, 2010), recebendo cerca de 13 milhões de turistas, sendo que no mercado internacional possui o terceiro maior portão de entrada de turistas estrangeiros do país.

d) O crescimento da **atividade portuária em Paranaguá e Antonina,** que desde 2000, vem promovendo o crescimento econômico da região. Com o segundo maior PIB per capita do estado, Paranaguá assiste a aceleração da economia local, que apresenta grande potencial de crescimento. Aproximadamente 21% da produção de soja é exportada pelo Porto de Paranaguá, que recebe 40% dos fertilizantes importados que entram no País. Em 2011, cerca de 44 milhões de toneladas de carga foram movimentadas. O Porto de Paranaguá é considerado o maior porto graneleiro da América Latina, e a principal conexão de escoamento da produção de grãos dos municípios do interior do estado com os importadores internacionais.

e) O **eixo logístico-industrial** Ponta Grossa–Região Metropolitana de Curitiba–Litoral do Paraná tem papel estratégico na alavancagem do desenvolvimento econômico de todo o Paraná e sua consolidação é também fonte potencial de impactos ambientais, sanitários, sociais e urbanísticos para o Litoral do Paraná. A consolidação deste eixo

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº – 4º andar – Ala C - 80.530-140 – Curitiba – Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 – Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 233

motiva a exploração de novas infraestruturas. Entre elas, ressaltam-se os diversos modais de transporte, como a nova ligação ferroviária Curitiba-Paranaguá; a construção de um novo aeroporto no Litoral; e melhorias na interconexão rodoviária entre os portos, demandando estudos de impacto sobre o ambiente e comunidades existentes.

f) A possível implantação do **terminal portuário** de container em Pontal do Paraná, que se transformará em mais um polo de dinamização do litoral e que demanda uma nova leitura do uso e da ocupação do solo e consequente revisão do seu zoneamento, sendo necessários estudos dos impactos na dinâmica sócio ambiental.

g) A proximidade do litoral paranaense com os grandes blocos da Bacia de Santos, que vem se mostrando a mais promissora nas prospecções do pré-sal, vem promovendo o interesse de **empreendimentos** dirigidos ao setor e que demanda uma nova leitura do uso e da ocupação do solo e consequente revisão do seu zoneamento, sendo necessários estudos dos impactos na dinâmica sócio ambiental.

h) Possibilidade da reativação de dois antigos **estaleiros** em Pontal do Paraná, para a montagem de plataformas de exploração de petróleo, o que poderá gerar milhares de empregos, incremento nos níveis de renda e arrecadação local, mas que demandam uma nova leitura do uso e da ocupação do solo e consequente revisão do seu zoneamento, sendo necessários estudos dos impactos na dinâmica sócio ambientais.

i) A saturação da rodovia estadual **PR-412**, no trecho entre Matinhos e o Balneário Pontal do Sul durante os períodos de veraneio. A rodovia, de uma forma geral, encontra-se com graves problemas de circulação e segurança de pedestres, uma vez que suas margens encontram-se totalmente ocupadas por edificações comerciais, comunitárias e até mesmo residenciais. A rodovia dá acesso a todos balneários do litoral norte paranaense, além do complexo insular, sendo de importância vital para o desenvolvimento de atividades turísticas e econômicas que fujam daquelas dirigidas ao veraneio, como vem acontecendo na região.

j) A saturação da rodovia **PR-407**, que faz a ligação da BR-277 com a PR-412. Em seu trecho que atravessa as áreas residenciais no perímetro urbano apresenta fluxo expressivo de tráfego local, o qual sofre um aumento substancial no período de verão com o tráfego gerado pela demanda aos balneários. Por ser uma rodovia em pista simples, com capacidade de tráfego reduzida, os congestionamentos, o comprometimento da segurança viária e as interferências nas atividades da população residente na área são inevitáveis.

k) A possibilidade de implantação e construção da **BR-101** no litoral Paranaense, rodovia que interligaria as três rodovias principais do litoral (BR-277, BR376 e BR-116).

l) A possibilidade de implantação da **Faixa de Infraestrutura**, no município de Pontal do Paraná, elemento estruturante de infraestrutura logística (rodovia, ferrovia) e infraestrutura urbana (drenagem, energia elétrica, dutos), conectando a futura área portuária/industrial à PR-407.

m) A possibilidade de implantação de uma **nova rodovia direta entre Antonina e BR-277**, desafogando a PR-408 e o núcleo urbano do município de Morretes. O atual acesso ao porto de Antonina é feito através da PR-408, gerando conflitos com a área urbana de Morretes.

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº – 4º andar – Ala C - 80.530-140 – Curitiba – Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 – Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 234

n) A possibilidade de mudança da **Poligonal do Porto Organizado de Paranaguá e Antonina**, aumentando a possibilidade de terminais privados de se instalarem na região litorânea, trazendo tanto os benefícios quanto impactos para a região.

o) A ocorrência de **enchentes e inundações** nos municípios do litoral, decorrentes da ocupação antrópica e da ausência de fiscalização, que demanda a elaboração de um projeto de realocação e de macrodrenagem de forma a evitar desastres naturais com consequências de perdas ambientais, materiais, humanas e econômicas.

p) A constante necessidade de realização de **obras de dragagem** relacionadas ao assoreamento dos rios e à manutenção e aprofundamento dos canais de navegação marítima, bem como mensurar, avaliar os impactos, sendo necessários estudos dos impactos na dinâmica sócios ambientais.

q) A crescente **ocupação irregular** de áreas por famílias carentes e até mesmo empresas, que vem gerando a degradação de áreas de mangues, entre outras, e que exige uma atitude do Poder Público, no sentido de reforçar os programas de habitação de interesse social e controle na região. É necessária a realização de um levantamento fundiário detalhado do litoral, tendo em vista a expressiva sobreposição de propriedades, bem como elevado número de posses irregulares, com mapeamento das propriedades e posses e sua respectiva regularidade.

r) A expressiva densidade de **estradas rurais mal implantadas**, com destaque para a bacia hidrográfica do Rio Sagrado (Morretes), que ocasionam elevada produção de sedimentos à rede de drenagem, intensificando os processos de enchentes nos municípios do litoral, bem como assoreamento das baías de Antonina e Paranaguá, configurando a necessidade de identificação das moradias e empreendimentos em áreas rurais e seu impacto nas bacias hidrográficas da região.

s) A necessidade de uma **Avaliação Ambiental Estratégica Integrada e Sinérgica**, bem como **Estudos de Impacto**, sejam eles ambiental, social, sanitário, vizinhança e urbanístico, que contemplem uma abordagem de todas às mudanças relacionadas e existentes na região dos diversos projetos previstos na região.

t) A necessidade de criação de **protocolos de atendimento** relacionados de acidentes ambientais, incêndios e desastres naturais, como deslizamentos, desmoronamentos, inundações, enchentes, etc; e protocolo de atendimento à fauna em situações cotidianas, de emergências e acidentes ambientais, com a construção de centros de recebimento, cuidado, monitoramente, transporte e reabiltiação de fauna silvestre e aquática;

u) A necessidade de identificação, compatibilização e atualização da **legislação** existente nas três esferas governamentais (Federal, Estadual, Municipal), respeitando-se os princípios da prevenção, precaução, proibição do retrocesso e máxima proteção em matéria ambiental;

v) A necessidade de uma **gestão compartilhada** eficiente, participativa e atuante, que tenha como objetivo o planejamento e gestão integrada da região.

Estes e outros elementos que forem levantados durante a execução do plano, devem ser premissas para a elaboração do Plano para o Desenvolvimento Sustentável do Litoral do Estado do Paraná – PDS_LITORAL, resultando em um conjunto de ações governamentais que intercedam para uma mudança favorável do cenário atual da região, que considere os marcos teóricos expressos na introdução.

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - 4º andar - Ala C - 80.530-140 - Curitiba - Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 - Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 235

4.4. Planos, programas, projetos e estudos a serem considerados.

O Plano em questão deverá observar e utilizar documentos técnicos como planos, programas, projetos e estudos, produzidos pelas diversas instituições governamentais nas esferas federal, estaduais e municipais, instituições de ensino e pesquisa e agentes privados, que contribuam para a elaboração do mesmo, evitando assim a duplicidade de geração de dados primários e/ou secundários, dentre os quais (alguns documentos poderão ser encontrados em **http://1drv.ms/202BMRX):**

Especialmente e principalmente, os trabalhos deverão utilizar-se, pautar-se, (complementar e detalhar o **Zoneamento Ecológico e Econômico – ZEE do Litoral do Paraná (2013)**, o qual integra informações ambientais e socioeconômicas a partir de mapas e estudos específicos para a definição de zonas com características semelhantes, indispensável para planejar a ocupação racional e o uso sustentável dos recursos naturais. A Escala de trabalho do ZEE-PR de 1:50.000 deverá ser melhor detalhada, considerando as áreas urbanas dos municípios. Deverão ser consolidados os apontamentos da academia, da sociedade civil organizada e do Ministério Público Estadual e Federal, quanto à necessidade de revisão de vários aspectos do Zoneamento Ecológico e Econômico – ZEE do Litoral do Paraná (2013) e a consideração dos estudos anteriores e propostas de zoneamento, em especial o estudo e proposta desenvolvida pela SEMA/PR, denominada de Proposta de Intervenção da **Zona Costeira do Paraná: Zoneamento Marinho do Paraná, no âmbito do Programa do Ministério do Meio Ambiente - PNMA II**, que traz diagnóstico do ambiente estuarino-costeiro e a proposta de ordenamento marinho.

Assim como estes estudos anteriores, com caracterizações e bases de dados, inclusive geográficas, tem o PLDM (**Planos Locais de Desenvolvimento da Maricultura**) do Ministério da Pesca (2010), Zoneamentos Ecológicos Econômicos e **Avaliações Ambientais Integrada e Estratégica da Bacia Litorânea.**

Destaca-se ainda, em relação a temática da infraestrutura, o **Plano Aeroviário Estadual do Paraná (PAE/PR)** que foi atualizado no ano de 2015, e conta com a descrição e proposta de desenvolvimento para os aeroportos do litoral do Estado, e também o **Plano Hidroviário Estadual**, que realizou o levantamento das travessias hidroviárias, incluindo aquelas localizadas no litoral do Estado. Este documento, assim como o primeiro, também foi entregue no ano de 2015

Em 2013, foram desenvolvidos **Projetos Contra Risco e Desastres Naturais no Litoral do Paraná** referentes à um acordo judicial referente ao rompimento do duto OLAPA, aprovados pelo Ministério Público Federal e Estadual. São cinco projetos, que vão desde a proposta de uma rede de monitoramento hidrometeorológico, mapeamento de riscos geológicos, fortalecimento da polícia ambiental, centro de gerenciamento de riscos e desastres e fortalecimento da defesa civil. Outra parte do acordo previa **Projetos e Medidas sócios ambientais no Litoral do Paraná,** onde Municípios e Estado poderiam enviar projetos referentes ao tema.

Foi concluído também, em 2013, o **Projeto Executivo de Proteção da Orla de Matinhos (2013)** que visa integrar soluções dos problemas de drenagem, de erosão marinha e da qualidade das águas, possibilitando a definição das obras prioritárias e de metas de médio e

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - 4º andar - Ala C - 80.530-140 - Curitiba - Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 - Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 236

longo prazo, que são as diretrizes e premissas deste projeto para recuperar e preservar o meio-ambiente costeiro[21].

Em 2012 foi concluído o **Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto De Paranaguá – PDZPO (2012).** O plano empreendeu um estudo minucioso da situação atual dos portos em questão, assim como estudou tendências futuras de demanda, tráfego marítimo, e outros aspectos importantes para o planejamento portuário, e assim definir o uso apropriado das áreas do porto. De posse desse estudo, será possível delinear o zoneamento futuro em busca do qual a Autoridade Portuária deve gerir as ações inerentes ao porto, permitindo, assim, programar e antecipar as ações da Autoridade Portuária para garantir seu papel de destaque no cenário portuário nacional e internacional, e conquistar seus objetivos futuros[22].

No mesmo ano, foram apresentados os resultados do **Grupo de Trabalho criado pelo Decreto 2.647/2011**, que tratava sobre a elaboração e desenvolvimento do "Plano Estratégico para o Desenvolvimento Territorial Sustentável do Litoral do Paraná". Foi elaborada uma carta temática baseada nas macro diretrizes e uma das principais conclusões foi a necessidade da continuação do trabalho através da contratação de uma empresa de consultoria.

Em 2010, foi desenvolvido o **Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável – Polo Turístico do Litoral do Paraná**, onde foi apresentado o resultado analítico e propositivo dos trabalhos, desenvolvidos no sentido de identificar os limites e potencialidades para o desenvolvimento do turismo no Litoral Paranaense[23].

Em 2007, foi desenvolvido o **Projeto básico integrado de Micro drenagem, Macro drenagem e controle de erosão marinha** para os municípios de Matinhos, Guaratuba e Pontal Do Paraná.

Em 2006, foi elaborado o trabalho **Plano Regionais de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Paraná – PRDE** que tinha como objetivo, propor planos regionais, considerando as potencialidades e vocações do estado.

Neste mesmo ano, foi elaborado o **Projeto Orla** dos três municípios balneários, sendo uma iniciativa inovadora do Ministério do Meio Ambiente - MMA, em parceria com a Secretaria do Patrimônio da União - SPU, e buscava contribuir, em escala nacional, para aplicação de diretrizes gerais de disciplinamento de uso e ocupação da Orla Marítima.

Outros documentos importantes são os **Estudos de Impacto Ambiental e os Relatórios de Impacto Ambiental – EIA/RIMA** dos diversos empreendimentos que se instalaram ou pretendem se instalar na região desde 2011, e que estão disponíveis no site do Instituto Ambiental do Paraná - IAP24 e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. Os EIA/RIMA são importantes fontes de estudo e compreensão da situação e contextualização local.

Além destes documentos, o **InBioVeritas**[25] realizou um estudo que levantou mais de 1.100 documentos de pesquisa, que foram listados, avaliados e classificados de acordo com a temática e aplicação sobre áreas de Mata Atlântica.

---

21 Projeto Executivo de Proteção da Orla de Matinhos. Instituto das Águas do Paraná, Março, 2013.
22 Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto De Paranaguá – PDZPO.
23 Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável – Polo Turístico do Litoral do Paraná (2010)
24 http://www.iap.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1365
25 Os membros fundadores do Centro são os Departamentos de Zoologia, Botânica e de Solos e Engenharia Agrícola da Universidade Federal do Paraná, Museu Estadual de História Natural Karlsruhe (SMNK / Alemanha) e Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental (SPVS)

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - 4º andar - Ala C - 80.530-140 – Curitiba – Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 - Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 237

No site do Instituto Ambiental do Paraná - IAP[26] e do ICMBio, também poderão ser acessados os **Planos de Manejo** das unidades de conservação. Planos de Manejo são documentos que estabelecem diretrizes básicas para o manejo das unidades, sendo reavaliado constantemente de modo a manter-se sempre ajustado às mudanças que ocorrem na realidade cumprindo seu objetivo, ou seja, proteger os importantes ecossistemas que abrigam. Para além dos planos de manejo, devem ser observados os Planos de Ação Nacional para espécies protegidas, elaborados pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade –ICMBio e parceiros.

Deverão ser consultados os diversos estudos e acervos técnicos referentes ao **Patrimônio e Cultura,** tanto do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, quanto à Secretaria Estadual da Cultura. Deverão ser consultados também os diversos estudos e acervos técnicos referentes às questões **indígenas e quilombolas** existentes e em estudo no Litoral do Paraná.

Devem ser considerados outros estudos como a base de dados das Unidades de Conservação do Litoral do Paraná; áreas relevantes para a Conservação do Litoral do Paraná; banco de dados da Bacia Litorânea do Paraná; bases cartográficas da cobertura vegetal, solos, recursos hídricos, estuário, áreas de preservação permanente e áreas indígenas, entre outras.

Devem ser considerados os **Programas, Planos, projetos e estudos à nível Municipal**, tais como: Planos Diretores Municipais elaborados, em elaboração e em revisão; Planos Municipais da Mata Atlântica; Planos de Saneamento Básico e de gestão integrada de resíduos; Planos de Mobilidade e Transporte; Planos de Habitação; Planos de Turismo; dentre outros.

Devem ser consideradas também as recomendações, termos de ajustamento de conduta e as ações civis e criminais do **Ministério Público** e jurisprudência da Região.

Além dos planos, programas, projetos e estudos já apresentados, a empresa consultora deverá levantar, identificar e contextualizar outros trabalhos já realizados e considerar durante a elaboração do plano.

4.5. Marco Legal

As legislações pertinentes podem ser encontradas em: Legislação Federal (http://www4.planalto.gov.br/legislacao) e Legislação Estadual (http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/entradaSite.do?action=iniciarProcesso)

Além da **Constituição Federal de 1988** e a **Constituição Estadual do Estado do Paraná de 1989**, destacam-se as legislações que tratam das questões relativas ao litoral que abrangem temas como: turismo, uso e ocupação do solo, vegetação, recursos hídricos, Gerenciamento Costeiro, Defesa Civil, dentre outros, para análise e avaliação da sua compatibilização com as mudanças em curso.

Dentre as legislações que tratam de questões turísticas e de uso e ocupação do solo, destacam-se:

Em 1977 foi sancionada a **Lei Federal nº 6.513/77** que entre outros temas, dispôs sobre a criação de Áreas Especiais e de Locais de Interesse Turístico, que entende-se como:

---

26 http://www.iap.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1201

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - 4º andar - Ala C - 80.530-140 – Curitiba - Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 - Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 238

> *... os trechos contínuos do território nacional, inclusive suas águas territoriais, a serem preservados e valorizados no sentido cultural e natural, e destinados à realização de planos e projetos de desenvolvimento turístico;*

E como locais de interesse turístico:

> *Os trechos do território nacional, compreendidos ou não em áreas especiais, destinados por sua adequação ao desenvolvimento de atividades turísticas, e à realização de projetos específicos, e que compreendam bens não sujeitos a regime específico de proteção e os respectivos entornos de proteção e ambientação.*

Posteriormente, em 1979, foi instituída a **Lei Federal nº 6.766/79** que trata do parcelamento do solo urbano, e que estabeleceu em seu artigo 13 que:

> *Caberá aos estados disciplinar a aprovação pelos municípios de loteamentos e desmembramentos localizados em áreas de interesse especial, tais como as de proteção aos mananciais ou ao patrimônio cultural, histórico, paisagístico e arqueológico, assim definidas por legislação estadual ou federal.*

O artigo 15 da mesma lei estabelece que os estados definirão por decreto, as áreas de proteção especial.

Assim sendo, em 1980, a **Lei Estadual nº 7.389/80**[27] [28] definiu como Áreas Especiais de Interesse Turístico e Locais de Interesse Turístico, localidades dos municípios de Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes e Paranaguá. Foram considerados para efeito daquela lei, como Áreas Especiais de Interesse Turístico e Locais de Interesse Turístico:

> *...(a) localidades que apresentam condições climáticas especiais; (b) paisagens notáveis; (c) localidades e os acidentes naturais adequados ao repouso e à prática de atividades recreativas, desportivas, de lazer, de pesca artesanal e de artesanato regional típico: (d) áreas lindeiras à orla marítima que compreendem a faixa de terra que se estende até 2.000 m (dois mil metros), medidos horizontalmente, bem como a faixa que se estende até 400 m (quatrocentos metros) em torno das baías, estuários de rio e canais do litoral do Estado, que serão estabelecidas a partir da linha do preamar-médio de 1831; (e) reservas e estações ecológicas; (f) áreas destinadas à proteção dos recursos naturais; (g) fontes hidrominerais; (h) locais de interesse histórico, artístico, arqueológico ou pré-histórico; (i) locais onde ocorram*

---

27 Posteriormente complementado pela Lei Estadual 7.694/83, Decreto Estadual 6.274/83, Decreto Estadual 4.758/89,
28 Substituída pela Lei 12.243/98, que incluiu as áreas e localidades do município de Pontal do Paraná, criado em 1995.

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS. Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº – 4º andar – Ala C - 80.530-140 – Curitiba – Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 – Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 239

manifestações culturais ou etnológicas; (j) habitat de espécies ameaçadas de extinção.

Ficou ainda estabelecido pela referida lei, que os municípios litorâneos deveriam realizar seus Planos Diretores com a finalidade de dar cumprimento às Leis Federais nºs 6.513/77 e 6.766/79.

Na **Constituição da República**, a proteção ambiental se encontra plasmada nos artigos 5º, LXXIII, 23, I, III, IV, VI, VII, IX, XI, 24, VI, VII e VIII, 129, III, 170, VI, 186, II, 200, VIII, 220, § 3º, II e 225. A proteção constitucional fundamentou o arcabouço socioambiental construído na legislação infraconstitucional brasileira. **A Lei Federal nº. 6.938/81 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente)** consagrou como um dos seus objetivos a imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados ao meio ambiente e aos terceiros afetados por sua atividade, independentemente da existência de culpa (artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 e artigo 143, § 2º, do Decreto nº 6.514/2008) e constitui o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), cujos integrantes possuem legitimidade para instauração, apuração, julgamento e adoção de todas as providências relacionadas às infrações ambientais no âmbito administrativo.

O **Decreto Estadual nº 2.722/84**[29], ainda vigente, regulamenta a Lei 7.389/80 e estabelece onze categorias de áreas e locais de interesse para fins de proteção das áreas litorâneas, conforme dispõem os artigos 1º e 2º.

Em 1984, foi instituído o Conselho de Desenvolvimento Territorial do Litoral Paranaense - COLIT, pelo **Decreto Estadual Nº 4.605/84**[30], com a competência de assessorar a administração estadual, no desenvolvimento do litoral paranaense, assim como no cumprimento dos princípios legais referentes ao parcelamento, uso e ocupação do solo, à prevenção e controle da poluição, à gestão dos recursos naturais, à proteção das áreas e locais declarados de interesse e proteção especial, do patrimônio histórico, paisagístico, arqueológico ou pré-histórico e outros de interesse regional, definidos em Lei Federal, Estadual e Municipal; como também colaborar, junto aos poderes públicos, no desenvolvimento dos atos legislativos e regulamentares concernentes à região litorânea do estado. As atribuições e a composição do Conselho é instituído pelo **Decreto Estadual nº 2.415/15 de 21/09/2015.**

A **Lei Federal nº 7.661/88**, que institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, foi regulamentada pelo **Decreto Federal nº 5.300/04**. Esse Decreto, conforme sua ementa, "Regulamenta a Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988, que institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro - PNGC dispõe sobre regras de uso e ocupação da zona costeira e estabelece critérios de gestão da orla marítima, e dá outras providências", visando à gestão ambiental da zona costeira do país, criando assim bases para a formulação de políticas, planos e programas federais, estaduais e municipais. O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, que integra a Política Nacional para os Recursos do Mar e a Política Nacional do Meio Ambiente, objetiva orientar a utilização racional dos recursos da zona costeira. A resolução do Conselho Interministerial para os Recursos do Mar – **CIRM 05/97** dispõe sobre a aprovação

---

29 Complementado pela Resolução do COLIT 001 de 24/07/86, Decreto Estadual 8.743/86, Resolução COLIT 001 de 21/02/89 e Resolução COLIT 002 de 30/09/89

30 Alterado posteriormente pelo decreto estadual nº 8.863/86, Nº 125 de 12 de fevereiro de 1987, nº 822 de 06 de julho de 1987, Decreto Estadual º 4.926/89 Decreto Estadual Nº4.259/94, Decreto Estadual Nº 2.154, Decreto Estadual Nº 3.060/97, Decreto Estadual Nº 828/07.

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - 4º andar - Ala C - 80.530-140 - Curitiba - Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 - Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 240

do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro II (PNGC II). A **Lei Estadual nº 13.164/01** dispõe sobre a zona costeira do Estado do Paraná.

Em 1989, o **Decreto Estadual nº 5.040/89** regulamentou o Macrozoneamento da Microrregião Litoral Paranaense, constituída pelos municípios de Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná, assim como suas diretrizes e normas de uso. O órgão responsável pela implantação do regulamento é o COLIT, cabendo à sua secretaria executiva o papel de articuladora de soluções entre as instituições federais, estaduais e municipais, a iniciativa privada e o terceiro setor.

A **Lei Federal nº 9.605/98** cria o normatiza os crimes ambientais e prevê as penas restritivas de direito, como prestação de serviços à comunidade, interdição temporária de direitos, suspensão parcial ou total de atividades, prestação pecuniária e recolhimento domiciliar (art. 8º). Também, considera infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente e estatui as sanções aplicadas às infrações administrativas, como advertência, multa simples, multa diária, apreensão de fauna, flora e bens, destruição ou inutilização do produto, suspensão de venda e fabricação do produto, embargo de obra ou atividade, demolição de obra, suspensão parcial ou total de atividades e restritiva de direitos (suspensão de registro, licença ou autorização; cancelamento de registro, licença ou autorização; perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais; perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito; proibição de contratar com a Administração Pública, pelo período de até três anos) (art. 72, caput e § 8º). Por fim, com vistas a proteger o meio ambiente, exige-se a reparação do dano ambiental (art. 17, 20, 27 e 28).

A atividade portuária das referidas cidades é regulada pela **Lei Federal nº 8.630/93**, que dispõe sobre o regime jurídico da exploração dos portos organizados e das instalações portuárias.

Em 1998, revogou-se a Lei Estadual nº 7.389/80 através da **Lei Estadual nº 12.243/98**, que inclui município e moderniza a legislação referente a áreas Especiais de Interesse Turístico e Locais de Interesse Turístico.

A **Lei Federal nº 9.985/2000** institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e a **Lei Federal n.º 10.650/2003** trata do acesso às informações ambientais (Lei de Acesso à Informação – Lei Federal n.º 12.527/ 2011). Observe-se que 83% do território do litoral paranaense abriga uma imensa diversidade de Unidades de Conservação e, por isso, deve ser observada a Lei Federal nº 9.985/2000, que dispõe do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da natureza e seu **Decreto regulamentador nº 4.340/2002**.

Em 2000, o **Decreto Estadual nº 1.861/2000** aprovou o regulamento que define o zoneamento de uso e ocupação do solo das áreas urbanas do município de Paranaguá.

Em 2001, **o Decreto Federal nº 10.257/2001**, conhecido como estatuto da Cidade, estabelece diretrizes gerais da política urbana.

A **Lei Federal nº 11.428/2006** (Mata Atlântica) dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, a **Lei Federal nº 11.284/2006** trata da gestão de florestas públicas para a produção sustentável.

A **Lei Estadual nº 15.229/2006**, dispõe sobre normas para a execução do sistema das diretrizes e bases do planejamento e desenvolvimento estadual.

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº – 4º andar – Ala C - 80.530-140 – Curitiba – Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 – Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 241

A Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT), instituída em 2007, por meio do **Decreto Federal nº 6.040/07**, é uma ação do Governo Federal que busca promover o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais, com ênfase no reconhecimento, fortalecimento e garantia dos seus direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais, com respeito e valorização a sua identidade, suas formas de organização e suas instituições.

O **Decreto Federal nº 6.514/2008**, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração das infrações que a Lei Federal Nº 9.605/98 normatiza.

No âmbito de proteção contra desastres naturais, **a Lei Federal Nº 12.340/10** Dispõe sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil - SINDEC, sobre as transferências de recursos para ações de socorro, assistência às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução nas áreas atingidas por desastre, e sobre o Fundo Especial para Calamidades Públicas, e dá outras providências.

Em 2011, o **Decreto Estadual nº 1.562/2011** declarou de utilidade pública as áreas do Macro Zoneamento da Área do Porto Organizado de Paranaguá, incluindo suas áreas de expansão, tais como a Ilha Rasa da Cotinga, em sua integralidade, na forma estabelecida pela resolução nº. 008/2010 – CAP/PGUÁ, para fins de intervenção em Área de Preservação Permanente – APP, lembrando-se que a intervenção em área de preservação permanente deve obedecer aos requisitos de utilidade pública (**Decreto Lei Nº 3.365/1941**) e interesse social (**Lei Federal Nº 4.132/1962**).

Ainda em 2011, o **Decreto Estadual nº 2.647/2011**, dispôs sobre a elaboração e desenvolvimento do "Plano Estratégico para o Desenvolvimento Territorial Sustentável do Litoral do Paraná", do qual trata esse Termo de Referência.

A **Lei Federal Nº 12.651/12**[31] dispõe sobre a proteção da vegetação nativa.

Em 2014, o **Decreto Estadual nº 10.855/2014** estabeleceu o zoneamento, uso e ocupação do solo para o município de Guaratuba. Também em 2014, o **Decreto Estadual nº 10.856/2014** estabeleceu o zoneamento, uso e ocupação do solo para o município de Matinhos.

Além disso, o Banco Central editou a **Resolução nº 4.327/2014**, que dispõe sobre as diretrizes da Política de Responsabilidade Socioambiental para instituições financeiras e demais organizações autorizadas a funcionar pela autoridade monetária, reproduzindo critérios dos Princípios do Equador e do Protocolo Verde (PNUMA). Editou ainda a Resolução nº 3792/2009, que trata dos planos administrados pelas entidades fechadas de previdência complementar e a observância dos princípios de responsabilidade socioambiental na política de investimento (art. 16, § 3º, VIII). O BNDES implementou os *Guias Socioambientais de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário* e assinou a *Carta de Princípios para o Desenvolvimento Sustentável de 1995* (Protocolo Verde).[32] O Conselho Federal de

---

[31] *A Lei nº 12.651/2012 substitui a Lei nº 4.771/1965 (Código Florestal) e, em razão de sua inconstitucionalidade, é objeto de três Ações Diretas de Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, propostas pela Procuradoria Geral da República (ADIs 4901, 4902 e 4903), que tratam da área de preservação permanente, redução da reserva legal e anistia aos promotores de degradação ambiental.*

[32] *BRASIL. BNDES. Guias Socioambientais. Disponível em: http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/BNDES_Transparente/Responsabilidade_Social_e_Ambiental/Politica_Socioambiental/guias_socioambientais.html. Acesso em: 10 abr. 2015. BRASIL. BNDES. Protocolo Verde. Disponível em: http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/empresa/download/ProtocoloVerde.pdf. Acesso em: 10 abr. 2015.*

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - 4º andar - Ala C - 80.530-140 - Curitiba - Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 - Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 242

Contabilidade (CFC) também adotou critérios para o exercício contábil dos passivos e ativos socioambientais das pessoas jurídicas empresariais (Resolução nº 751/1993 e NBC T nº 15/2004).

Em 12 de janeiro de 2015, o Governo Federal sanciona a **Lei Federal nº 13.089/2015** que institui o Estatuto da Metrópole e altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Esta lei estabelece diretrizes gerais para o planejamento, a gestão e a execução das funções públicas de interesse comum em regiões metropolitanas e em aglomerações urbanas instituídas pelos Estados, normas gerais sobre o plano de desenvolvimento urbano integrado e outros instrumentos de governança interfederativa no campo do desenvolvimento urbano.

Deve-se considerar ainda a legislação internacional e nacional de proteção ao meio ambiente, como a Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, de 1972 (Declaração de Estocolmo); Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992); Agenda 21 de diretrizes para o desenvolvimento sustentável (1992); Princípio para a Administração Sustentável das Florestas (1992); Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB) (1992); Convenção sobre Mudança do Clima (1992); Convenção Interamericana Contra Corrupção; Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção de 2003 (Mérida) (Decreto nº 5.687/2006) e Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado de 2004 (Palermo) (Decreto nº 5.015/2004); Convenção sobre o combate de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais da OCDE (1997); o Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF), implementado, em conjunto, pelo Banco Mundial, pelo Programa de Desenvolvimento da ONU (PNUD) e pelo Programa Ambiental das Nações Unidas (UNEP) (1991); Declaração do Direito ao Desenvolvimento (1986); Painel da ONU sobre Biodiversidade (1993); Declaração e Programa de Ação de Viena de 1993; Conferência sobre População e Desenvolvimento (Cairo) (1994); Convenção da ONU sobre o Combate à Desertificação (Paris) (1994); Segunda Conferência Mundial sobre Assentamentos Humanos (Habitat II) (Istambul) (1996); Protocolo de Kyoto (1997); Conferência Mundial do Milênio da ONU (Nova York) (2000); Protocolo de Biossegurança de Cartagena (Canadá) (2000); Reunião Ministerial da Organização Mundial do Comércio (Doha) (2001); Conferência Internacional da ONU sobre Financiamento para o Desenvolvimento (Monterrey) (2002); Princípios do Equador, da International Finance Corporation (IFC); Constituição da República, na qual a proteção ambiental se encontra plasmada nos artigos 5º, LXXIII, 23, I, III, IV, VI, VII, IX, XI, 24, VI, VII e VIII, 129, III, 170, VI, 186, II, 200, VIII, 220, § 3º, II e 225; a Constituição do Estado do Paraná; Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº. 6.938/81); Decreto nº 6.514/2008); Lei nº 9.605/98;Código Penal (Decreto Lei nº 2.848/40); Lei nº 9.985/2000; Lei nº 11.428/2006 (Mata Atlântica); Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal); Resolução nº 4.327/2014 e nº 3792/2009, do Banco Central; Guias Socioambientais de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do BNDES; Carta de Princípios para o Desenvolvimento Sustentável de 1995 (Protocolo Verde); Resolução nº 751/1993 e NBC T nº 15/2004, do Conselho Federal de Contabilidade.

Além de todo o arcabouço legal aqui apresentado, a empresa consultora deverá levantar, identificar, compatibilizar, contextualizar e propor outras legislações que não foram citadas e que também influenciam no território do litoral paranaense.

Outras leis relacionadas ao Litoral do Estado (recursos hídricos, saneamento, resíduos, vegetação, educação ambiental) estão listas abaixo, devendo ser complementadas com todos os decretos de Unidades de Conservação, as politicas nacionais e estaduais relativas ao Meio Ambiente, recursos hídricos, vegetação e saneamento.

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - 4º andar - Ala C - 80.530-140 - Curitiba - Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 - Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 243

Tabela 2: Legislação incidente sobre a área do Litoral do Paraná

TIPO	NÚMERO	DATA	SÚMULA
Decreto Federal	24.643	10/07/34	Decreta o Código das Águas
Decreto Federal	50.877	29/06/61	Dispõe sobre o lançamento de resíduos tóxicos ou oleosos nas águas interiores ou litorâneas do País, e dá outras providências.
Decreto Estadual	1.234	30/30/92	Criação da APA de Guaratuba
Lei Federal	9.433	08/01/97	Política Nacional de Recursos Hídricos
Lei Federal	9.537	11/12/97	Segurança do Tráfego Aquaviário
Decreto Federal	2.596	18/05/98	Regulamenta a Lei Nº 9.537/97 que dispões sobre a segurança do tráfego aquaviário
Lei Federal	9.985	18/07/00	Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza
Resolução Conama	274	29/11/00	Água e balneabilidade
Decreto Federal	4.297	10/07/02	Regulamenta o art. 9o, inciso II, da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, estabelecendo critérios para o Zoneamento Ecológico-Econômico do Brasil - ZEE, e dá outras providências.
Decreto Estadual	6.800	30/12/02	Ordenamento Territorial e Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo da Ilha do Mel
Resolução Conama	334	03/04/03	Procedimentos de licenciamento ambiental de estabelecimentos destinados ao recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos.
Resolução Conama	335	03/04/03	Licenciamento ambiental de cemitérios
Resolução Conama	357	17/03/05	Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais tais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras previdências.
Resolução Conama	369	28/03/06	Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente-APP.
Norma Regulamentadora 29/2006, Segurança e Saúde no Trabalho Portuário – Redação conforme a Portaria SIT 158/2006.	Portaria SSST nº 53/1997 e Portaria SIT nº 158/2006	-	Segurança e Saúde no Trabalho Portuário – Elaboração de Plano de Controle de Emergência - PCE e Plano de Ajuda Mútua – PAM.
Lei Federal	11.445	05/01/2007	Política Nacional de Saneamento Básico
Lei Estadual	16.037	08/01/09	Dispõe que a Ilha do Mel, situada na baía de Paranaguá, Município de Paranaguá,

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº – 4º andar – Ala C - 80.530-140 – Curitiba – Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 – Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 244

			constitui região de especial interesse ambiental e turístico do Estado do Paraná
Decreto Estadual	4.242	09/02/09	Regulamenta a Lei n° 16.037, de 08 de janeiro de 2009, a qual dispõe que a Ilha do Mel, situada na baía de Paranaguá, Município de Paranaguá, constitui região de especial interesse ambiental e turístico do Estado do Paraná.
Lei Federal	9.795	27/04/09	Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências.
Decreto Estadual	7.750	14/07/10	Dispõe sobre a Comissão Coordenadora do ZEE para a elaboração do Zoneamento Ecológico Econômico, denominado de Consórcio ZEE-PARANÁ, e dá outras providências.
Resolução Conama	428	17/12/10	Dispõe, no âmbito do licenciamento ambiental sobre a autorização do órgão responsável pela administração da Unidade de Conservação (UC), de que trata o § 3º do artigo 36 da Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000, bem como sobre a ciência do órgão responsável pela administração da UC no caso de licenciamento ambiental de empreendimentos não sujeitos a EIA-RIMA e dá outras providências.
Portaria SPU	24	28/01/11	Dispõe sobre normas e procedimentos para a instrução de processos visando à cessão de espaços físicos em águas públicas e fixa parâmetros para o cálculo dos valores devidos a título de retribuição à União.
Decreto Estadual	1.893	04/06/11	Instituí Grupo de Trabalho, com a finalidade de promover estudos e medidas de estímulo com vistas ao fomento do turismo marítimo no Estado do Paraná
Resolução SEMA	001	15/08/11	Dispõe sobre a aprovação do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município de Paranaguá.
Lei Complementar	140	08/12/11	Lei Complementar, Fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Lei Estadual	17.048	04/01/12	Dispõe sobre o uso de lagos, lagoas e represas públicas e privadas para a prática de esportes aquáticos
Lei Estadual	17.133	25/04/12	Institui a Política Estadual sobre Mudança do Clima.

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n° – 4° andar – Ala C - 80.530-140 – Curitiba – Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 – Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 245

Lei Estadual	17.134	25/04/12	Institui o Pagamento por Serviços Ambientais, em especial os prestados pela Conservação da Biodiversidade, integrante do Programa Bioclima Paraná, bem como dispõe sobre o Biocrédito.
Lei Estadual	17.505	11/01/13	Institui a Política Estadual de Educação Ambiental e o Sistema de Educação Ambiental e adota outras providências.
Resolução SEMA	040	26/08/2013	Dispõe sobre o licenciamento ambiental de empreendimentos náuticos localizados nas margens e nas águas interiores e costeira do Estado do Paraná, estabelecendo condições, critérios e dá outras providências.
Resolução COLIT	001	28/03/14	Aprova os Planos Diretores dos Municípios de Guaratuba e Matinhos, e dá outras providências.

5. METODOLOGIA

A metodologia adotada pela empresa contratada deverá observar claramente os objetivos do PDS_LITORAL explicitados no Item 3 deste documento. A Figura 4: Estágios do Planejamento Estratégico[33] apresenta uma proposta de metodologia para planos regionais, indicada pelo Ministério da Integração Nacional, e pode ser adotada pela empresa contratada ou substituída por similar, com anuência da SEPL, desde que atendidos aos objetivos discriminados. No fluxograma abaixo, deve ser considerado a inserção de uma área de "aspectos ambientais", imprescindível ao planejamento estratégico do litoral paranaense.

33 http://bibspi.planejamento.gov.br/bitstream/handle/iditem/498/05%20Desenvolvimento%20local_ILPES.pdf?sequence=1

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS. Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº – 4º andar – Ala C - 80.530-140 – Curitiba – Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 – Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 246

Figura 4: Estágios do Planejamento Estratégico

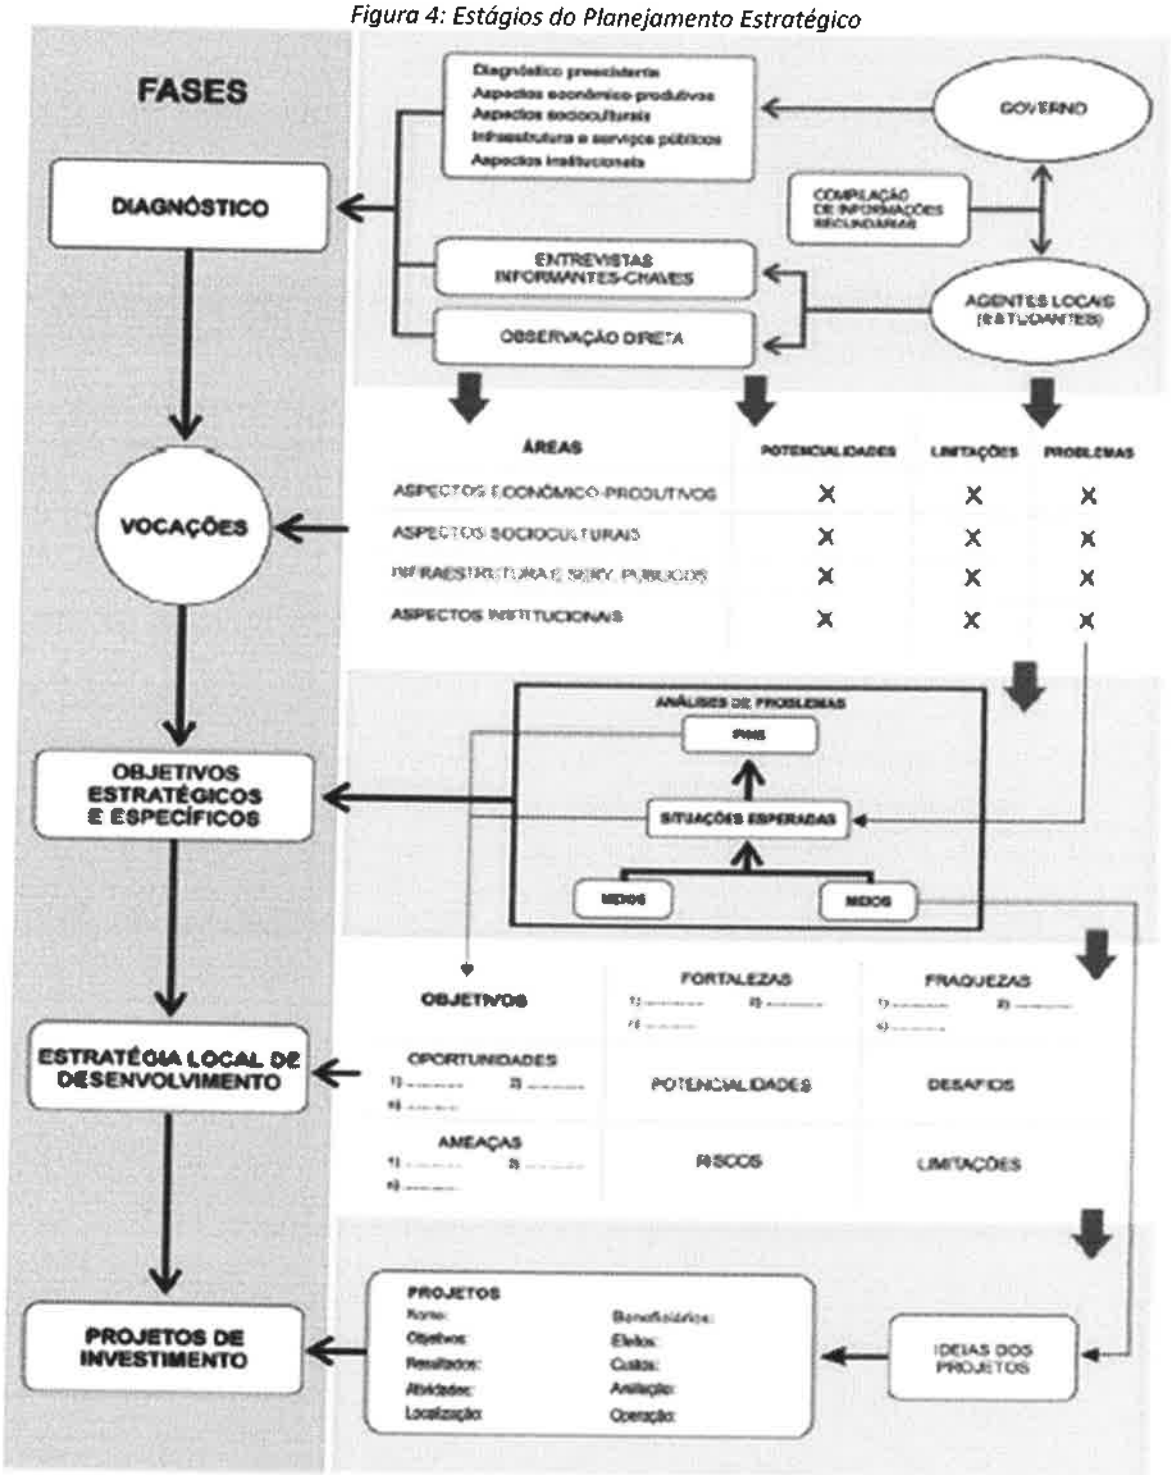

Fonte: Ministério da Integração Nacional, 2010

Esta metodologia[34] é baseada em técnicas cognitivas de repetição e execução de atividades ligadas aos temas que compõem as estratégias de desenvolvimento local. O passo

34 Metodologia descrita por Ivan Silva Lira na séria de publicações Gestão Pública nº 42 da CEPAL (ISSN eletrônica 1680-8835)

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - 4º andar - Ala C - 80.530-140 - Curitiba - Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 - Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 247

a passo da metodologia proposta está disponível no sítio do Ministério da Integração (www.mi.gov.br).

A consultoria deverá elaborar o plano, adotando no mínimo, esta metodologia apresentada, mas poderá ainda, utilizar outras metodologias inovadoras como a metodologia do pensamento sistêmico, teoria do U para resolução de problemas complexos, etc., desde que apresentadas no Plano de Trabalho e posteriormente, discutidas e aprovadas pela Equipe Técnica Intersecretarial - ETI.

O Plano de Trabalho deverá prever a utilização de documentos técnicos como planos, programas, projetos e estudos, legislações existentes e válidas, produzidos pelas diversas instituições governamentais nas esferas federal, estaduais e municipais, instituições de ensino e pesquisa e agentes privados, que contribuam para a elaboração do mesmo, evitando assim a duplicidade de geração de dados primários ou mesmo secundários.

Os trabalhos deverão utilizar como referência o contido no Zoneamento Ecológico e Econômico – ZEE do Litoral do Paraná (2013), o qual integra informações ambientais e socioeconômicas a partir de mapas e estudos específicos para a definição de zonas com características semelhantes, indispensável para planejar a ocupação racional e o uso sustentável dos recursos naturais, além de levantar e compatibilizar os estudos, planos, programas e projetos existentes.

Tomaram-se dois conceitos que deverão ser incorporados e desenvolvidos pela contratada, de forma que o plano estabeleça condições específicas para a construção do desenvolvimento regional sustentável e ao mesmo tempo adote a metodologia do planejamento estratégico de forma a garantir a ampliação da capacidade competitiva regional, sem comprometer os processos ecossistêmicos e a biodiversidade associada, numa metodologia baseada em consensos entre os atores envolvidos baseados nos princípios apresentados na introdução do termo de referência.

Enquanto que, na definição de desenvolvimento sustentável, ressalta-se a importância que deve ser dada ao processo de mudança, mais que ao objetivo estático de otimização, é importante frisar o processo de aprendizagem coletiva com o máximo de sinergia entre a economia, a sociedade, a tecnologia e o meio ambiente e com o mínimo de externalidades cruzadas de tipo negativo. O processo de construção de uma participação social de caráter informativo e educativo possibilitará o acesso da sociedade às informações que eram acessíveis apenas a pequenos grupos técnicos, além de incorporar na discussão outros tipos de "saberes" e não exclusivamente o técnico, como feito até recentemente.

5.1. Metodologia e processo participativo

Em matéria de instrumentos de previsão qualitativa, o plano deverá proporcionar efetiva integração e participação dos diversos setores da sociedade, a fim de colaborar na contextualização da região e elaboração de cenários futuros no campo do planejamento estratégico.

Os conselhos de Desenvolvimento Regionais, Conselhos Municipais (Meio Ambiente, Cidade, Saneamento, dentre outros), Comitês das bacias hidrográficas, poderes públicos executivos e legislativos das três esferas de governo, a sociedade civil organizada, academia, além de outras entidades representativas, devem auxiliar na mobilização para garantir a

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - 4º andar - Ala C - 80.530-140 - Curitiba - Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 - Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 248

representatividade e participação de todos os segmentos da sociedade nos trabalhos propostos e consequentemente, a contínua implementação do plano.

A metodologia de participação deverá respeitar também a Resolução nº25, de 18 de março de 2005, do Conselho Nacional das Cidades, que emite orientações e recomendações sobre a garantia do processo participativo.

A organização dos trabalhos pode utilizar técnicas como o método Delphi, workshops, seminários, grupos focais, mapeamento de comunidades, entrevistas e pesquisas, observando-se, inclusive, as melhores práticas do PMBOK no gerenciamento de projetos, a metodologia do Programa das Cidades do Pacto Global da ONU e a metodologia ICES, da Iniciativa de Cidades Emergentes e Sustentáveis do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID. Importa apontar a necessidade de aplicação de métodos não indutivos e de mediações isentas nos processos participativos.

No que concerne as audiências públicas, devem seguir a regulamentação federal, estadual e municipal, inclusive do Estatuto da Cidade (Lei no 10.527/2001)e do Conselho Nacional das Cidades, da Lei no 8.666/1993, Lei no 9.427/1996 e Lei no 9.478/1997, preservando-se o princípio da publicidade, com divulgação de todos os atos e documentos e da participação, com possibilidade de intervenção dos participantes, por intermédio de questionamentos ou colaborações orais e escritas, bem como a apresentação de pareceres, manifestações, moções, etc., anteriores, durante ou posteriores as audiências. Em todas as oficinas e audiências públicas deve necessariamente haver a participação de gestores e representantes de unidades de conservação estadual e federal.

O Ministério Público Estadual (Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, Coordenação Geral da Rede Ambiental, Coordenadoria Regional da Bacia Litorânea e as Promotorias de Justiça das seis comarcas do Litoral do Paraná) e o Ministério Público Federal serão intimados de todas as etapas mencionadas no ponto sete, com antecedência mínima de quinze dias, com acesso a todos os documentos.

6. GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

Neste item, está descrita as equipes de gestão do contrato, definindo a estrutura da Equipe Técnica Intersecretarial – ETI e Equipe de Acompanhamento - EA.

6.1. Equipe Técnica Intersecretarial – ETI

Como gestora e equipe técnica do contrato, a Equipe Técnica Intersecretarial – ETI verificará se o contrato está sendo cumprido de acordo com o Termo de Referência, avaliando os eventos realizados e produtos entregues. Participará ao longo de todo o processo de elaboração do plano, colaborando para a realização das tarefas e atividades necessárias para a construção do plano e emitirá pareceres técnicos sobre os relatórios do plano;

Composta por técnicos da contratante e instituições governamentais estaduais. Poderá convocar para participar, quando julgar necessário, representantes dos órgãos e instituições governamentais, conselhos e prefeituras municipais, contribuindo para a realização dos trabalhos por meio de reuniões e do fornecimento de informações relativas às suas instituições. Tem por atribuições:

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - 4º andar - Ala C - 80.530-140 - Curitiba - Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 - Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 249

- Acompanhar o processo de elaboração do Termo de Referência;
- Avaliar as propostas técnicas, gerenciamento e fiscalização do contrato;
- Receber toda a correspondência oficial entre a consultoria e as demais entidades do Plano;
- Encaminhar essa correspondência aos seus respectivos destinatários;
- Receber a validação da equipe de Acompanhamento quanto os produtos entregues, aprovando a entrega nas etapas intermediárias.
- Validar os processos de elaboração do Plano e aprovar o conteúdo de cada etapa conforme o Termo de Referência dando os aceites Iniciais e finais;
- Tramitar a documentação de contratação da Consultoria,
- Autorizar pagamentos e emitir recibos.
- Dar suporte técnico à Empresa Consultora no âmbito do conteúdo do Plano, emitindo pareceres, facilitando a busca de documentos e informações e auxiliando na logística de realização de consultas públicas;
- Fazer a verificação da consistência técnica do conteúdo apresentado pela Empresa Consultora;

6.2. Equipe de Acompanhamento - EA

Tem como principal função apresentar manifestação, validar e acompanhar as diferentes partes do processo de desenvolvimento do plano. O número de participantes para cada equipe de acompanhamento deverá ser sugerido pela empresa consultora e validado pela Equipe Técnica Intersecretarial – ETI.

Composta por representantes da Sociedade Civil e Técnicos Municipais efetivos (concursados) de cada um dos municípios da área de abrangência do plano e serão eleitos nas oficinas de engajamento realizadas na primeira etapa descritas neste Termo de Referência.

Para cada município, deverão ser apontados:

- Técnicos municipais efetivos
- 1 (um) representante do Setor Produtivo Empresarial
- 1 (um) representante de Academia
- 1 (um) representante do Conselho Municipal de Planejamento ou Cidade
- 1 (um) representante do Conselho Municipal de Meio Ambiente
- 1 (um) representante de Organização Não Governamental
- 1 (um) representante à livre escolha do plenário da Oficina de Engajamento. Em qualquer um desses segmentos, o representante deverá obrigatoriamente pertencer à sociedade civil.

Além dos atores municipais, serão convocados: Representantes da Academia (UNESPAR, UFPR, PUC, UFPR Litoral, UFPR CEM, IFPR e UTFPR), representantes de Organização Não Governamental, atuante na região; Representante de Observatórios (Observatório de Conservação Costeira do Paraná, Observatório Social, Mosaico Lagamar...), representante do Programa de Cidades do Pacto Global da ONU; representantes do Ministério Público Estadual (Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, Coordenação Geral da Rede Ambiental, Coordenadoria Regional da Bacia Litorânea e as Promotorias de Justiça das seis comarcas do

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº – 4º andar – Ala C - 80.530-140 – Curitiba – Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 – Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 250

Litoral do Paraná); Ministério Público Federal; Conselhos de Classe (CFA, OAB, CAU, CREA, CRBIO...); Federações (FIEP, FAEP); agências de Desenvolvimento; Associações, dentre outros.

Estes deverão ser levantados e distribuídos nos municípios com o intuído de fortalecer a discussão local e consequentemente aperfeiçoar a discussão sobre o território regional.

Tem por atribuições:

- Participar de cada uma das oficinas e Audiências Públicas previstas no Termo de Referência, relativas às Etapas 2, 3, 4 e 5;
- Validar os processos de elaboração do Plano e aprovar o conteúdo de cada etapa conforme o Termo de Referência dando os aceites intermediários;
- Acessar os endereços eletrônicos em que estão publicados os relatórios parciais e finais dos planos e tomar conhecimento de seu conteúdo;
- Emitir parecer sobre cada oficina, dando o seu aceite quanto a sua forma e conteúdo e validá-lo quando corretamente finalizado.

Os pareceres e o aceite da Equipe de Acompanhamento - EA, deverão ser emitidos para a Equipe Técnica Intersecretarial – ETI, com cópia para a empresa consultora, por meio eletrônico, em até 15 (quinze) dias úteis após as reuniões públicas (Oficinas, Audiências e Conferência Final). Os representantes de cada município deverão emitir um único parecer e um único aceite, que represente o consenso entre eles.

7. ETAPAS, PRODUTOS E CONTEÚDO MÍNIMO EXIGIDO.

O plano será constituído por cinco etapas, cada qual com suas sub-etapas, resultando em produtos contendo o conteúdo mínimo exigido a serem entregues pela consultora, garantindo a participação dos diversos atores no processo de acompanhamento, discussão e elaboração do plano.

Figura 5: Etapas do Plano

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº – 4º andar – Ala C - 80.530-140 – Curitiba – Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 – Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 251

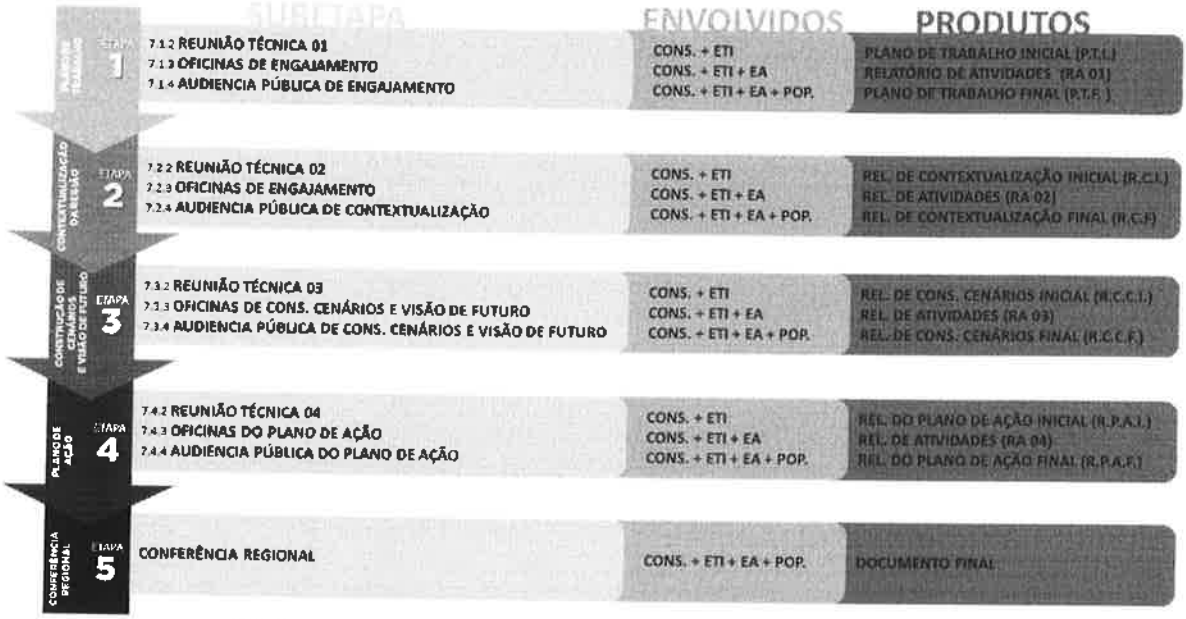

CONS. (Empresa Consultora) | ETI (Equipe Técnica Intersecretarial) | EA (Equipe de Acompanhamento) | POP. (População)

As etapas, sub-etapas, equipes envolvidas e produtos a serem entregues, estão detalhados nos subitens seguintes:

7.1. ETAPA 1: PLANO DE TRABALHO

7.1.1. Conteúdo Mínimo Exigido

O Plano de Trabalho deve descrever detalhadamente a metodologia de elaboração do plano, bem como metodologias de construção de cenário e visão de futuro, especificando as atividades a serem desenvolvidas em cada uma das etapas, contendo cronograma e fluxograma detalhados. Deve ser coerente com o Termo de Referência, apresentando uma abordagem técnica e metodológica adequada e demonstrando a perfeita compreensão dos objetivos do PDS_LITORAL.

Para assegurar a participação dos diversos atores sociais envolvidos, a empresa consultora deverá indicar também uma metodologia de comunicação e elaborar um plano de comunicação, bem como, sugerir os locais das reuniões, oficinas e audiências públicas, contendo cronograma com a previsão de encontros prévios e fluxograma detalhado. Também deverá propor uma metodologia de divulgação das informações de forma dinâmica que, inclua, no mínimo, a existência de um site, onde serão disponibilizados todos os documentos e o cronograma referente às etapas da metodologia, com a antecedência necessária à análise da sociedade civil, além da divulgação ativa que permitam a maior participação possível.

Como articulador entre os diversos atores, a empresa consultora deverá apresentar uma lista prévia das diversas instituições governamentais (federal, estadual, municipal), sociedade civil, academia, terceiro setor e outros interessados que deverão participar das reuniões, oficinas e audiências públicas, garantindo o processo de construção e implementação do plano de forma participativa e contínua.

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - 4º andar - Ala C - 80.530-140 - Curitiba - Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 - Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 252

7.1.2. Reunião Técnica 01

A Reunião Técnica 01 celebra a apresentação e entrega do Plano de Trabalho pela empresa consultora com a Equipe Técnica Intersecretarial - ETI.

O resultado da Reunião Técnica 01 será a entrega do **Plano de Trabalho Inicial (P.T.I.)**, que é o resultado compilado alterações e contribuições, se houver, desde que acordadas entre os participantes. Deverá conter as atas de reunião e uma lista prévia das diversas entidades que participarão das oficinas de engajamento.

O Plano de Trabalho Inicial (P.T.I) será analisado e aprovado pela Equipe Técnica Intersecretarial – ETI em até 07 (sete) dias úteis e retornará, se for o caso, à contratada para devidos ajustes, a qual terá um prazo de 07 (sete) dias para reapresentá-lo.

Assim que aprovado, a empresa consultora estará autorizada a realizar a próxima sub-etapa e deverá disponibilizar o Plano de Trabalho Inicial (P.T.I) e todo o material elaborado para consulta pública através da internet, até a data de realização das Oficinas de Engajamento.

7.1.3. Oficinas de engajamento

As Oficinas de Engajamento são encontros realizados em cada um dos municípios integrantes da área de abrangência do PDS_LITORAL com atores sociais locais de maior representatividade e de comunidades tradicionais e tem como objetivo o engajamento e recebimento de contribuições ao plano, garantindo a participação e contribuição dos diversos atores na sua construção. Será apresentado o Plano de Trabalho Inicial (P.T.I.) e também serão definidos os representantes locais que irão compor a Equipe de Acompanhamento – EA.

O resultado das Oficinas de Engajamento será a entrega do **Relatório de Atividade 01: Oficinas de Engajamento e Plano de Trabalho Consolidado (RA 01)**. Este relatório deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos:

a) De cada uma das 07 (sete) oficinas de engajamento:
   - Lista de Presença, contendo nomes, instituição e informações de contato;
   - Ata da reunião que contenha a transcrição das contribuições de cada município;
   - Relatórios fotográficos;
   - Relatórios e entrevistas em vídeo;
   - Lista dos Integrantes das Equipes de Acompanhamento - EA;
   - Outras informações pertinentes.

b) Plano de trabalho Consolidado:
   - Plano de trabalho avaliado e compilado com as contribuições das 07 oficinas de engajamento.
   - Definição do local e listagem prévia dos participantes da Audiência Pública Inicial.

O Relatório de Atividade 01: Oficinas de Engajamento e Plano de Trabalho Consolidado (RA 01) será analisado e aprovado pela Equipe Técnica Intersecretarial – ETI em até 7 (sete) dias úteis e retornará, se for o caso, à contratada para devidos ajustes, a qual terá um prazo de 7 (sete) dias para reapresentá-lo.

Assim que aprovado, a empresa consultora estará autorizada a realizar a próxima sub-etapa e deverá disponibilizar todo o material elaborado para consulta pública através da

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - 4º andar - Ala C - 80.530-140 - Curitiba - Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 - Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 253

internet, ao menos 15 (quinze) dias antes da data de realização da Audiência Pública de Engajamento.

7.1.4. Audiência Pública de Engajamento

A Audiência Pública é a apresentação do plano de trabalho para a população. Será realizada em três municípios a serem definidos e tem como objetivo garantir participação amplificada da população, ouvindo os seus anseios e contribuições para a construção do Plano.

O resultado das Audiências Públicas de Engajamento será a entrega do **Plano de Trabalho Final (P.T.F.)**, que é o documento resultante da compilação do Plano de Trabalho Inicial (P.T.I.), Relatório de Atividade 01: Oficinas de Engajamento e Plano de Trabalho Consolidado (RA 01) e contribuições recebidas durante a Audiência Pública de Engajamento. Deverá conter um relato das contribuições e das presenças dos participantes durante a audiência pública.

O Plano de trabalho Final (P.T.F) será analisado e aprovado pela Equipe Técnica Intersecretarial – ETI em até 7 (sete) dias úteis e retornará, se for o caso, à contratada para devidos ajustes, a qual terá um prazo de 7 (sete) dias para reapresentá-lo.

Assim que aprovado, a empresa consultora estará autorizada a realizar a próxima Etapa e deverá disponibilizar todo o material elaborado para consulta pública através da internet.

7.2. ETAPA 2: CONTEXTUALIZAÇÃO DA REGIÃO

Esta etapa tem por objetivo conhecer a realidade da região compreendida pelo Plano. Isto significa levantar, diagnosticar e mapear a região estudada, através de metodologia adequada, que permita, utilizando-se a metodologia SWOT, reconhecer as Forças (S), Fraquezas (W), Oportunidades (O) e Ameaças (T) para o desenvolvimento regional sustentável e; a partir desta compreensão, propor medidas e ações necessárias para reforçar os aspectos positivos e enfrentar e superar os adversos.

A contextualização deve ser analisada sob as condições peculiares de sazonalidade da população e tendo em vista a população projetada, bem como, as pressões de expansão urbana e de infraestrutura, sem com isto, perder de vista um cenário futuro de perenidade, buscando propor melhorias sociais e econômicas e preservação do ambiente da região do litoral. Mais do que uma descrição estática, a contextualização deve conter análises dinâmicas comparativas, permitindo situar a região em relação a outras regiões do estado e país, de tal forma, que permita dimensionar seu grau de desenvolvimento sustentável e competitividade.

A região deverá ser contextualizada através de levantamentos e diagnósticos de dados primários e secundários, elaboração de pesquisas, oficinas, entrevistas, dentre outros.

Todo o item deverá ser ilustrado por textos, fotografias, quadros, tabelas, gráficos, imagens, mapas georreferenciados, fotos aéreas, perspectivas, modelos e outros elementos de comunicação visual, que facilitem a compreensão e interpretação. Deverá vir acompanhado de uma matriz de interrelação das contextualizações, apontando os pontos fortes e fracos, oportunidades e desafios.

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - 4º andar - Ala C - 80.530-140 - Curitiba - Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 - Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 254

Após o levantamento e compilação dos dados e realização dos diagnósticos, será necessário priorizar os temas em que a região deverá se concentrar em relação aos maiores desafios de sustentabilidade.

Exemplos de boas práticas e benchmark deverão ser utilizados para ilustrar os benefícios de abordagens alternativas e, se forem relevantes e transferíveis para recomendar a adoção de novos instrumentos, ferramentas, plataformas e metodologias. Para isto, deverão ser discutidas com a Equipe Técnica Intersecretarial - ETI para avaliação e aprovação.

7.2.1. Conteúdo Mínimo

A contextualização deverá abordar, no mínimo, as seguintes dimensões, acrescendo-se a estas, informações indispensáveis para a análise e compreensão de condições peculiares à região estudada, integrando todas as informações e documentos colhidos em uma base de dados e em plataforma tecnológica integrada, mapeada e georreferenciada, permitindo o geoprocessamento das informações, o melhor conhecimento e gestão inteligente do território, com a colaboração de todas as secretarias e instituições envolvidas, tendo em vista o princípio da eficiência e a maximização da utilização das informações colhidas:

7.2.1.1. Sócio Territorial

- Padrões de uso e ocupação do solo: levantar, caracterizar e mapear os padrões de uso e ocupação do solo existentes nas áreas urbanas e rurais e sua evolução nos últimos 10 anos. Nas áreas urbanas, enfatizar os padrões de ocupação (vertical e horizontal), vazios urbanos, padrões de uso (comercial, serviço, residencial e industrial), densidade (fixa e sazonal); além de levantar, caracterizar e mapear as diversas formas de ocupação irregular do litoral, áreas subutilizadas nas áreas urbanas e áreas que conflitem com a legislação atual; levantamento e caracterização de compatibilidade de usos e ocupação entre municípios através da análise dos planos diretores vigentes, bem como, a incompatibilidades de usos entre municípios limítrofes e áreas urbanas contíguas;
- Demografia e fluxos migratórios: Levantamento, diagnóstico, análise e mapeamento da história demográfica, considerando os censos do IBGE e estudos do IPARDES, objetivando identificar fluxos e tendências. Elaborar um estudo de projeção demográfica, subsidiando a construção de cenários e com o objetivo final de identificar os investimentos necessários na região a longo prazo (por exemplo, número de empregos, número de unidades habitacionais, número de vagas, infraestrutura urbana, equipamentos sociais, etc.). Deverão ser analisados o seu rebatimento no orçamento, na atuação e no desempenho dos governos estadual e municipais. Estabelecer relações entre demografia, ofertas, demandas, e capacidade de superação de entraves, bem como o levantamento e mapeamento das necessidades e potencialidades que a mudança da dinâmica populacional ocasiona nos municípios.
- Funções públicas de interesse comum: Levantamento, diagnóstico e mapeamento das diversas atividades ou serviços cuja realização por parte de um município, isoladamente, seja inviável ou cause impacto em outros municípios, ou que dependam de outro município vizinho.

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - 4º andar - Ala C - 80.530-140 - Curitiba - Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 - Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 255

- Habitação: Levantamento, diagnóstico e mapeamento das demandas por habitação pelos diferentes extratos sociais; caracterizar o nível de atendimento, programas em andamento e identificação de estoques de terras atuais e necessários, com apontamentos prospectivos. Além disto, os levantamentos e análises deverão abordar as dificuldades legais e institucionais para implantação de projetos habitacionais e da demanda por regularização fundiária, urbana e rural, do nível atual das condições de moradia (qualidade, infraestrutura e serviços disponíveis).
- Questões Fundiárias: Levantamento, diagnóstico e mapeamento das áreas públicas e privadas (posse e propriedade); dos loteamentos e sua regularidade; de ocupações irregulares da população e de empresas; de áreas ocupadas irregularmente em faixas de domínio da União, áreas próximas às rodovias, áreas de preservação permanente, áreas úmidas, regiões de mananciais e áreas geomorfologicamente vulneráveis.
- Saúde: Levantamento, diagnóstico e mapeamento do número e das condições de equipamentos de saúde públicos e privados (postos de saúde, hospitais, pronto atendimentos, maternidades, pronto socorros, etc.), do atendimento à população e das especialidades ofertadas, com indicações prospectivas considerando os prováveis movimentos demográficos (fixa e sazonal) da região.
- Segurança: Levantamento, diagnóstico e mapeamento do número e das condições dos equipamentos de segurança pública (delegacias, postos de serviços, unidades da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícias Civil, Federal, Rodoviária Federal e Estadual, Guarda Municipal, Força Verde, penitenciárias, presídios, etc.) e da capacidade de atendimento, carência de atendimento, de prevenção e combate à criminalidade, com indicações prospectivas considerando os prováveis movimentos demográficos (fixa e sazonal) da região.
- Educação: Levantamento, diagnóstico e mapeamento do número e condições dos equipamentos educacionais, bem como, o levantamento e análise das carências e demandas por vagas, profissionais da área, programas e serviços voltados à educação, à capacitação e à qualificação de mão de obra, com indicações prospectivas considerando os prováveis movimentos demográficos (fixa e sazonal) da região. Considerar creches, escolas (municipais, estaduais, federais), universidades, faculdades, descrevendo os cursos ofertados.
- Esporte, entretenimento e lazer: Levantamento, diagnóstico e mapeamento levantamento e diagnóstico dos diversos equipamentos esportivos, entretenimento e lazer, bem como as diversas instituições e significantes para a região, com indicações prospectivas considerando os prováveis movimentos demográficos (fixa e sazonal) da região.
- Comunidades e Comunidades tradicionais: Levantamento, diagnóstico e mapeamento das diversas comunidades, indígenas e quilombolas, bem como aspectos de localização, composição, posse e regularidade da terra, relevância social, com indicações prospectivas considerando ameaças e potencialidades dos prováveis movimentos demográficos (fixa e sazonal) da região, identificando possíveis impactos de empreendimentos (novos e existentes) nas comunidades.
- Culturas tradicionais e étnicas: Levantamento, diagnóstico e mapeamento das diversas culturas, bem como aspectos de localização, composição e relevância social, com

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - 4º andar - Ala C - 80.530-140 - Curitiba - Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 - Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 256

indicações prospectivas considerando ameaças e potencialidades dos prováveis movimentos demográficos (fixa e sazonal) da região, identificando possíveis impactos de empreendimentos (novos e existentes) nas culturas.

- Patrimônio histórico, cultural e sítios arqueológicos: Levantamento, diagnóstico e mapeamento dos principais elementos de relevância histórica e cultural presentes no litoral do Paraná, com indicações prospectivas considerando ameaças e potencialidades dos prováveis movimentos demográficos (fixa e sazonal) da região, identificando possíveis impactos de empreendimentos (novos e existentes) nas culturas.

7.2.1.2. Ambiental

- Solo, subsolo e topografia: Levantamento, diagnóstico e mapeamento das condições geológicas e geopedológicas, visando a análise das áreas suscetíveis à ocorrência de processos erosivos, e análise de estabilidade geotécnica (movimento de massa) diante do uso e ocupação atual do solo rural e urbano, da sua tipologia de uso e da dinâmica natural, visando seu controle e recuperação e identificação de riquezas minerais, com indicações prospectivas considerando ameaças e potencialidades dos prováveis movimentos demográficos (fixa e sazonal) da região. O estudo da compartimentação topográfica, relevo (erosão acelerada e assoreamento, áreas sujeitas a inundações, destacando os demais fenômenos característicos da região); definição de classes de solo presentes e sua caracterização morfológica e analítica, inclusive de coeficiente de percolação; diagnóstico das condições geológicas e análise de estabilidade e risco geotécnico diante da ocupação atual do solo e utilização do subsolo, da sua tipologia de uso e da dinâmica natural de construção do ambiente costeiro do Paraná, visando seu controle e recuperação;
- Ambientes Hidromórficos (Áreas Úmidas): Levantamento, diagnóstico e mapeamento dos ambientes hidromórficos (áreas úmidas), tendo em vista que os solos que constituem estes ambientais não exercem a função de filtro, o que potencializa o risco de contaminação do lençol freático.
- Unidade de Conservação: Levantamento, diagnóstico e mapeamento de unidades de conservação públicas e privadas de acordo com o que prevê o SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação, e áreas que potencialmente possam ser utilizadas ou disponibilizadas para implantação de projetos de compensação, recuperação e recomposição florestal, com indicações prospectivas considerando ameaças e potencialidades dos prováveis movimentos demográficos (fixa e sazonal) da região. Identificar e mapear nas Unidades de Conservação a sua respectiva infraestrutura física, técnica e humana; a existência, atualização e implementação efetiva dos Planos de Manejo e da regularização fundiária; Identificar áreas para implantação de novas unidades de conservação municipal, estadual e federal, públicas e privadas, com o levantamento dos respectivos proprietários/posseiros (matrículas, escrituras, ações judiciais, entrevistas, etc.) e a criação de corredores ecológicos, para proteção da fauna e da flora;
- Hidrografia e hidrologia: Levantamento, diagnóstico e mapeamento do contexto das disponibilidades hídricas superficiais e subterrâneas, qualitativas e quantitativas, para

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº – 4º andar – Ala C - 80.530-140 – Curitiba – Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 – Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 257

fins de abastecimento público (doméstico, industrial, irrigação, etc.), levando em consideração as projeções de população e tendências de desenvolvimento econômico; as bacias hidrográficas com seus mananciais, regime hidrológico, riscos de inundação e rede de drenagem; balneabilidade e qualidade das águas, com caracterização físico-química e bacteriológica das águas superficiais; identificação dos usos das águas na bacia hidrográfica. Caracterização da hidrografia marinha e das influências fluvio-marinhas na região, a cunha salina, o aporte continental, o tempo de resistência da água do CELP, de todas as baías da região, dentro outros; caracterização costeira, com descrição dos aspectos físicos das áreas submersas e emersas (pós-praias, praias, antepraias, costões e afloramentos rochosos); classificação morfodinâmica das praias; caracterização sedimentológica (amostrar antepraia superior, máximo recuo de onda, face praial e berma) Avaliar as condições hidrológicas locais e atuais ponderando-se as precipitações pluviométricas nas diferentes estações climáticas do ano, a infiltração, o escoamento superficial diante da impermeabilização urbana (atual e estimada para o futuro) e as interferências sobre os fluxos das drenagens, regime dos ventos, identificando processos erosivos, enchentes e alagamentos e suas causas, projetando formas de controle, prevenção e recuperação, com indicações prospectivas considerando ameaças e potencialidades dos prováveis movimentos demográficos (fixa e sazonal) da região.

- Fauna e flora: Levantamento, diagnóstico e mapeamento do estado da cobertura florestal (corredores, remanescentes, em regeneração, estágio sucessional etc.), principalmente, dos remanescentes da Mata Atlântica no Litoral do Paraná, conforme a Lei Federal nº 11.428/2006 (vegetação primária e secundária em estágio avançado, médio e inicial de regeneração) em escala 1:50.000 na área rural e 1:20.000 na área urbana, detalhando as características dos elementos de fauna e flora existentes nas Zonas de Proteção Ambiental – ZPAs estabelecidas pelo Decreto Estadual nº 2722/1984. Identificação de áreas prioritárias para proteção da biodiversidade e identificação de *áreas intocáveis*. Identificação dos ecossistemas terrestres: análise dos ecossistemas terrestres; cobertura vegetal e diferentes estratos vegetais; densidade da vegetação e levantamento florístico, com identificação das espécies raras e ameaçadas de extinção, e descrição da vegetação integrante da mata ciliar, considerando a importância dos corredores ecológicos; delimitação de áreas de preservação permanentes, áreas úmidas e mananciais; mastofauna, anurofauna, hepertofauna, avifauna; identificação das espécies animais presentes, inclusive aquelas endêmicas da Mata Atlântica e/ou ameaçadas de extinção, com tipologias vegetais presentes e seu estágio sucessional; os ecossistemas de transição (ecótonos), considerando o seu papel regulador assim como os ambientes úmidos (brejos e várzeas); identificação dos ecossistemas aquáticos marinhos: fauna nectônica, bentônica e demersal, com informações sobre a existência de áreas de desova e alimentação de cetáceos e quelônios;
- Áreas de risco: Levantamento, diagnóstico e mapeamento das áreas de risco e identificação de ameaças, suscetibilidades e vulnerabilidades de áreas consideradas impróprias ao assentamento humano por estarem sujeitas a riscos naturais ou decorrentes da ação antrópica (inundação e enchentes, deslizamentos, desmoronamentos, etc.) com indicações prospectivas considerando ameaças e

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº – 4º andar – Ala C - 80.530-140 – Curitiba – Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 – Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 258

potencialidades dos prováveis movimentos demográficos (fixa e sazonal) da região. A Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Paraná (SEMA) está contratando um mapeamento por radar que abrange as áreas de atenção de riscos e desastres (áreas SISMAAR). Este material poderá ser utilizado como insumo para sugestão de futuros planos de contingência

7.2.1.3. Infraestrutura

- Transporte público e sistema viário: Levantamento, diagnóstico e mapeamento de temas referentes ao transporte coletivo público de passageiros (linhas disponíveis, tanto nas áreas municipais quanto nas áreas intermunicipais, terminais de transporte, condições de frota e infraestrutura, etc..), transporte individual de pessoas; transporte de mercadorias e serviços; e sistema viário (infraestrutura existente, atendimento às demandas e carências, condições de circulação, pesquisa volumétrica, etc.), de mobilidade e de acessibilidade, com indicações prospectivas considerando ameaças e potencialidades dos prováveis movimentos demográficos (fixa e sazonal) da região. Realização de uma pesquisa simplificada de Origem-Destino de veículos de passageiros e cargas no litoral do Paraná em alguns pontos estrategicamente localizados de suas rodovias. No caso, as áreas abrangidas seriam: posto de polícia rodoviária da rodoviária da PR-412 antes de Coroados, no município de Guaratuba; travessia do Ferry-Boat, entre Guaratuba e Matinhos; Posto da PRE na PR-508; Posto da PRE na PR-407, Posto do PRF na BR-277 entre os acessos da PR-408 e PR-508; PR-410, antes do acesso a Antonina, entre o Acesso da PR-408 e PR-340; PR-412 após do trevo da PR-407. A contagem deverá ser realizada seguindo metodologia e amostragem próprias para a determinação dos fluxos internos do litoral e as origens dos acessos externos. Identificação do impacto (mobilidade, ambiental, social, etc.) do tráfego pesado de caminhões na região litorânea, principalmente na área do porto de Paranaguá, considerando as filas que se formam sistema de fretes, condições dos veículos, ausência de infraestrutura, dentre outros. Analisar os impactos da implementação da tecnologia Brasil ID, na identificação dos veículos e das cargas, para melhor organização logística;
- Logística: Levantamento, diagnóstico e mapeamento dos arranjos logísticos locais ou regionais, de suas disponibilidades, necessidades, carências e deficiências, dificuldades operacionais e de implantação, condicionantes e potencialidades, com indicações prospectivas considerando ameaças e potencialidades dos prováveis movimentos demográficos (fixa e sazonal) da região. Identificação das formas de fiscalização das cargas e containers, pelas instituições (tecnologia Brasil ID, scanner, etc);
- Infraestrutura de energia e comunicações: Levantamento, diagnóstico e mapeamento do nível de fornecimento de insumos energéticos para a produção, carências e demandas, assim como o fornecimento e da prestação dos serviços voltados à comunicação – telefonia fixa e móvel, internet, tecnologia da informação, etc., tendo em vista o crescimento populacional previsto e as tendências de desenvolvimento econômico, com indicações prospectivas considerando ameaças e potencialidades dos prováveis movimentos demográficos (fixa e sazonal) da região. Identificação dos empreendimentos de fornecimento de energia como PCHs e Hidrelétricas, e a sua

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - 4º andar - Ala C - 80.530-140 - Curitiba - Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 - Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 259

regularidade ambiental; identificação de fontes alternativas para geração de energia limpa, como placas fotovoltaicas, levantando-se a utilização destes mecanismos por residências e empresas;

- Saneamento: Levantamento, diagnóstico e mapeamento das condições de saneamento, tais como: fornecimento de água tratada e atendimento por rede coletora e tratamento de esgoto, atendimento por rede de drenagem (macro e micro) que propiciem encaminhamentos de soluções de problemas, de demandas e de carências, com indicações prospectivas considerando ameaças e potencialidades dos prováveis movimentos demográficos (fixa e sazonal) da região.
- Resíduos sólidos e efluentes: Levantamento, diagnóstico e mapeamento de informações sobre a coleta e tratamento sobre os diversos tipos de resíduos (domiciliares, industriais, de saúde, etc.), classe, volume, destinação, gestão e situação atual sobre os planos de gerenciamento de resíduos e do cumprimento de um Plano de Rastreabilidade da Cadeia de Geração de Resíduos, com indicações prospectivas considerando ameaças e potencialidades dos prováveis movimentos demográficos (fixa e sazonal) da região. Levantar a existência de lixões e aterros sanitários (licenciamento), a atual situação do solo e corpos hídricos, os danos causados, perspectiva de regularização, recuperação e custos; a existência de transporte de resíduos e sua regularidade (licenciamento); a existência de serviços de coleta, capina e roçada nos Município e respectivos prestadores e contratos; a existência de coleta seletiva, logística reversa e cooperativa de catadores e a forma de funcionamento; o cumprimento do Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos e Plano Municipal de Saneamento Básico pelos Municípios; a existência de Conselho Municipal de Saneamento Básico e do respectivo Fundo;
- Empreendimentos: Levantamento, diagnóstico e mapeamento da existência de: Pequenas Centrais Hidrelétricas e Hidrelétricas, Empreendimentos Portuários, Empreendimentos Minerários, Empreendimentos Imobiliários e Rodoviários, considerando a sua regularidade em relação ao licenciamento ambiental, sanitário, de segurança e urbanístico, a realização de estudos de impacto ambiental, a valoração dos impactos causados e a valoração dos serviços ecossistêmicos, com a indicação e quantificação dos impactos e das medidas mitigatórias e compensatórias decorrentes;

7.2.1.4. Econômica

- Produção e Desempenho: Levantamento, diagnóstico e mapeamento dos diferentes setores da produção e análise de desempenho – setores primário, secundário e terciário e de turismo, vislumbrando seus níveis e evolução de crescimento nos últimos 10 (dez) anos, potenciais de mercado e dificuldades de atuação, modernização e competividade, identificação da vocação e potencial estratégico de cada município dentro da região, com sua área de influência e relações com municípios vizinhos; Levantamento dos impactos dos empreendimentos planejados e o grau de interferência no turismo, considerando o forte atrativo do litoral paranaense com as paisagens naturais.
- Cadeias Produtivas e Arranjos Produtivos Locais - APL: Levantamento, diagnóstico e mapeamento das cadeias produtivas e seus elos faltantes, identificação de

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - 4º andar - Ala C - 80.530-140 - Curitiba - Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 - Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 260

aglomerações produtivas locais e seus sistemas de governanças, caracterização das vocações locais, identificação dos setores produtivos e de serviços com potencial de inovação tecnológicos e setores econômicos mais representativos na região.

- Emprego e renda: Levantamento, diagnóstico e mapeamento dos níveis e setores de empregabilidade e ocupação, dos percentuais de emprego e de desemprego por setor e faixas etárias, das necessidades de capacitação e qualificação/requalificação. Considerar os níveis de educação local na produtividade, trabalho e renda.
- Investimentos previstos ou em andamento: Levantamento, diagnóstico e mapeamento dos investimentos públicos e privados previstos ou em andamento para o litoral, voltados à expansão econômica, o aumento e melhoria da malha viária e de circulação de mercadorias.

7.2.1.5. Institucional

- Arcabouço legal (federal, estadual e municipal): Levantamento e diagnóstico do arcabouço legal incidente sobre o litoral do Paraná, considerando-se sua complexidade, sobreposições de instrumentos legais, possíveis dificuldades administrativas e conflitos gerados em relação ao planejamento e gestão para a área como um todo, especialmente quanto às legislações ambiental, de uso e ocupação do solo, portuária, patrimônio histórico, cultural e arqueológico, de interesse turístico, prevenção de desastres naturais, saneamento, dentre outras.
- Instituições: Levantamento, diagnóstico e mapeamento das diferentes instituições governamentais, academia, sociedade civil, conselhos municipais (meio ambiente, urbanismo, cidade, etc.) com atuação no litoral paranaense, seus níveis de atuação e competências (sombreamentos e conflitos se houver), assim como, identificar as suas dificuldades administrativas, orçamentárias, de infraestrutura e recursos humanos, para a perfeita atuação com impacto no planejamento para o litoral.
- Arrecadações municipais e dependências de repasses fiscais: Levantamento e diagnóstico dos níveis de arrecadação de tributos (impostos, taxas, contribuição de melhoria e preços públicos) municipais, das dependências de repasses fiscais (estaduais e federais), do desempenho financeiro municipal nos últimos 10 (dez) anos e das necessidades de financiamento de programas socioeconômicos e de modernização e manutenção urbana; Identificar os valores arrecadados e a destinação do ICMS Ecológico, e o impacto positivo das Unidades de Conservação na receita municipal, avaliando-se se os recursos são investidos na área ambiental.
- Órgãos de Fiscalização e licenciamento: Levantamento, diagnóstico e mapeamento dos órgãos de fiscalização, licenciamento e de emergências para fauna e acidentes ambientais, à nível municipal, estadual e federal, das áreas ambiental, segurança, sanitária e urbanística, verificando sua estrutura de recursos físicos e humanos, gestão e aparato tecnológico.
- Infrações: Levantamento, Diagnóstico e mapeamento dos impactos das infrações ambientais e da improbidade administrativa, no desenvolvimento local, com a verificação dos autos de infração (municipal, estadual e federal, dos Municípios, IAP, IBAMA e ICMBio), dos boletins de ocorrência da Polícia Ambiental, das ações criminais e cíveis judiciais, com a implementação de plataforma tecnológica de mapeamento,

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - 4º andar - Ala C - 80.530-140 - Curitiba - Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 - Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 261

centralização, coordenação e georreferenciamento destes dados, para sua leitura por mecanismos de *Big Data*, *Data Mining* e *Business Intelligence*;

7.2.2. Reunião Técnica 02

A Reunião Técnica 02 celebra a apresentação e entrega, para a Equipe Técnica Intersecretarial – ETI, do **Relatório de Contextualização Inicial (R.C.I.)** produzido pela empresa consultora.

O Relatório de Contextualização Inicial (R.C.I.) será analisado e aprovado pela Equipe Técnica Intersecretarial – ETI em até 15 (quinze) dias úteis e retornará, se for o caso, à contratada para devidos ajustes, a qual terá um prazo de 15 (quinze) dias para reapresentá-lo.

Assim que aprovado, a empresa consultora estará autorizada a realizar a próxima sub-etapa e deverá disponibilizar o Relatório de Contextualização Inicial (R.C.I.) e todo o material elaborado para consulta pública através da internet, 15 (quinze) dias antes da data de realização das Oficinas de Contextualização.

7.2.3. Oficinas de Contextualização

As Oficinas de Contextualização são encontros realizados em 7 (sete) municípios integrantes da área de abrangência do PDS_LITORAL com atores sociais locais de maior representatividade e tem como objetivo, submeter o Relatório de Contextualização Inicial (R.C.I.) À apreciação dos participantes da Equipe de Acompanhamento – EA. Os locais dos encontros serão sugeridos pela consultora e aprovada pela Equipe Técnica Intersecretarial – ETI, durante o Plano de Trabalho.

O resultado das Oficinas de Contextualização será a entrega do **Relatório de Atividade 02: Oficinas de Contextualização e Relatório de Contextualização Consolidado (RA 02).** Este relatório deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos:

a) De cada uma das 7 (sete) oficinas de contextualização:
   - Lista de Presença, contendo nomes, instituição e informações de contato;
   - Ata da reunião que contenha a transcrição das contribuições de cada oficina;
   - Relatórios fotográficos;
   - Relatórios e entrevistas em vídeo;
   - Lista dos Integrantes das Equipes de Acompanhamento - EA;
   - Outras informações pertinentes.

b) Relatório de Contextualização Consolidado:
   - Contextualização da Região avaliado e compilado com as contribuições das 7 oficinas de e contextualização.
   - Definição do local e listagem prévia dos participantes da Audiência Pública de Contextualização da Região.

O Relatório de Atividade 02: Oficinas de Contextualização e Relatório de Contextualização Consolidado (RA 02) será analisado e aprovado pela Equipe Técnica

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº – 4º andar – Ala C - 80.530-140 – Curitiba – Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 – Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 262

Intersecretarial – ETI em até 7 (sete) dias úteis e retornará, se for o caso, à contratada para devidos ajustes, a qual terá um prazo de 7 (sete) dias para reapresentá-lo.

Assim que aprovado, a empresa consultora estará autorizada a realizar a próxima sub-etapa e deverá disponibilizar todo o material elaborado para consulta pública através da internet, 15 (quinze) dias antes da data de realização da Audiência Pública de Contextualização.

7.2.4. Audiência Pública de Contextualização

A Audiência Pública é a apresentação da contextualização para a população. Será realizada em três locais dentro da área de abrangência do projeto, a ser sugerido no plano de trabalho pelo consultor e aceito pela Equipe Técnica Intersecretarial – ETI e tem como objetivo garantir participação amplificada da população, ouvindo os seus anseios e contribuições para a construção do Plano.

O resultado da Audiência Pública de Contextualização será a entrega do **Relatório de Contextualização Final (R.C.F.)**, que é o documento resultante da compilação do Relatório de Contextualização Inicial (R.C.I.), Relatório de Atividade 02: Oficinas de Contextualização e Relatório de Contextualização Consolidado (RA 02) e contribuições recebidas durante a Audiência Pública de Contextualização. Deverá conter um relato das contribuições e das presenças dos participantes durante a audiência pública.

O Relatório de Contextualização Final (R.C.F.) será analisado e aprovado pela Equipe Técnica Intersecretarial – ETI em até 7 (sete) dias úteis e retornará, se for o caso, à contratada para devidos ajustes, a qual terá um prazo de 7 (sete) dias para reapresentá-lo.

Assim que aprovado, a empresa consultora estará autorizada a realizar a próxima Etapa e deverá disponibilizar todo o material elaborado para consulta pública através da internet.

7.3. ETAPA 3: CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS E VISÃO DE FUTURO

A construção de cenários fundamenta a prática do planejamento, uma vez que fornece alternativas de análise e escolha para o encaminhamento de projetos e propostas de desenvolvimento, dependendo da realidade enfrentada.

"Os estudos de cenários têm sido crescentemente utilizados na área de planejamento estratégico, tanto de grandes empresas quanto de governos, por oferecer um referencial de futuros alternativos em face dos quais decisões serão tomadas. À medida que aumentam as incertezas em quase todas as áreas de conhecimento, cresce também a necessidade de análise e reflexão sobre as perspectivas futuras da realidade em que se vive e diante da qual se planeja. As técnicas de cenários vêm conquistando rapidamente o cotidiano dos planejadores e dos decisores do mundo contemporâneo, apesar da percepção de que o futuro é algo incerto e indeterminado. Embora não possam eliminar incertezas nem definir categoricamente a trajetória futura da realidade estudada, as metodologias de construção de cenários contribuem para delimitar os espaços possíveis de evolução da realidade."[35]

---

35 BUARQUE, Sérgio C. Metodologia e Técnicas de Construção de Cenários Globais e Regionais. Texto para discussão Nº 939, IPEA – Brasília, fevereiro de 2003.

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº – 4º andar – Ala C - 80.530-140 – Curitiba – Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 – Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 263

O processo de construção de cenários é uma excelente oportunidade para concatenar as diferentes visões de futuro de cada um dos atores envolvidos. Tem como resultado a elaboração de cenário desejável e a consolidação de uma "visão de futuro", compartilhado por todos, em busca do desenvolvimento sustentável.

A "visão de futuro" é um modelo mental claro e 'luminoso' de um estado ou situação altamente desejável: (i) de uma realidade futura e possível; (ii) - descrita de uma forma simples e objetiva e (iii) - partilhada por todos, que envolve a construção de cenários e objetivos a serem buscados pela região em um futuro de médio e longo prazos, considerando as atuais tendências e influências; visando a sua competitividade.

7.3.1. Conteúdo Mínimo

Com o intuito de propiciar uma visão de futuro para o Litoral do Paraná num horizonte de 5 anos (curto prazo), 10 anos (médio prazo) e 20 anos (longo prazo), potencializando seus aspectos positivos e oportunidades de melhoria, assim como neutralizando e eliminando aspectos negativos e ameaças, a contratada deverá apresentar um conjunto prepositivo de diretrizes, objetivos e metas, que contemple:

a) Eixos estratégicos orientadores do Plano;
b) Formulação de visão geral de futuro para até 2035;
c) Previsão detalhada dos cenários de desenvolvimento sustentável;
d) Os efeitos/impactos no meio natural e comunidades (pesqueiras, rurais, tradicionais, quilombolas e indígenas);
e) Esboço dos princípios orientadores do Plano;
f) Metas previstas e as políticas do Plano; e
g) Realização de uma extensa consulta com as partes interessadas.

Tais intervenções deverão ter caráter de recuperação e manutenção da integridade do patrimônio natural e social, socioambiental, de conservação do patrimônio histórico e cultural, de implantação de infraestrutura, de conservação do patrimônio histórico e cultural, de planejamento urbano, territorial e turístico, de gestão pública e de atuação jurídica ou normativa e de modelagem institucional, dentre outras, que garantam o desenvolvimento sustentável do Litoral do Paraná e os objetivos do plano a ser contratado, em consonância com as diretrizes estratégicas do Governo do Paraná, seus planos, programas e projetos em andamento, respeitando o contido no Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE do Litoral do Paraná (2013), e o contido na Lei Estadual nº 13.164/2001, que estabelece as diretrizes da Zona Costeira Paranaense em atendimento à Constituição Federal e outras normas federal para a Zona Costeira Nacional.

Deverão ser definidos os eixos estratégicos que nortearão a construção do plano, com a sugestão que sigam a mesma linha de raciocínio utilizado na introdução e na contextualização da região e assim realizar a formulação de diversos cenários prospectivos desejáveis, alternando as prioridades de cada dimensão analisada.

O planejamento de cenários será utilizado para articular a visão e os princípios orientadores. O "exercício de visão" deverá se concentrar na identificação do cenário geral desejado e os resultados/objetivos para cada uma das áreas principais incluídas no plano, e políticas e estratégias mais amplas para alcançar esses resultados/objetivos.

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS. Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - 4º andar - Ala C - 80.530-140 - Curitiba - Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 - Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 264

O desenvolvimento regional sustentável deve ser premissa durante todo o processo de elaboração do plano, na constante busca do equilíbrio entre os eixos e diretrizes estratégicas propostas, com a finalidade de criar uma "visão de futuro" compartilhada por todos.

7.3.2. Reunião Técnica 03

A Reunião Técnica 03 celebra a apresentação e entrega, para a Equipe Técnica Intersecretarial – ETI, do **Relatório de Construção de Cenários e Visão de Futuro Inicial (R.C.C.I.)** produzido pela empresa consultora.

O Relatório de Construção de Cenários e Visão de Futuro Inicial (R.C.C.I.) será analisado e aprovado pela Equipe Técnica Intersecretarial – ETI em até 15 (quinze) dias úteis e retornará, se for o caso, à contratada para devidos ajustes, a qual terá um prazo de 15 (quinze) dias para reapresentá-lo.

Assim que aprovado, a empresa consultora estará autorizada a realizar a próxima sub-etapa e deverá disponibilizar o Relatório de Construção de Cenários e Visão de Futuro Inicial (R.C.C.I.) e todo o material elaborado para consulta pública através da internet, até 15 (quinze) dias antes da data de realização das Oficinas de Construção de Cenários e Visão de Futuro.

7.3.3. Oficinas de Construção de Cenários e Visão de Futuro

As Oficinas de Construção de Cenários e Visão de Futuro são encontros realizados em 7 (sete) municípios integrantes da área de abrangência do PDS_LITORAL com atores sociais locais de maior representatividade e tem como objetivo, submeter o Relatório de Construção de Cenários e Visão de Futuro Inicial (R.C.C.I.) à apreciação dos participantes da Equipe de Acompanhamento – EA. Os locais dos encontros serão sugeridos pela consultora e aprovada pela Equipe Técnica Intersecretarial – ETI, durante o Plano de Trabalho.

O resultado das Oficinas de Construção de Cenários e Visão de Futuro será a entrega do **Relatório de Atividade 03: Oficinas de Construção de Cenários e Visão de Futuro Contextualização e Relatório de Construção de Cenários e Visão de Futuro consolidado (RA 03)**. Este relatório deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos:

a) De cada uma das 7 (sete) Oficinas de Construção de Cenários e Visão de Futuro:
   - Lista de Presença, contendo nomes, instituição e informações de contato;
   - Ata da reunião que contenha a transcrição das contribuições de cada oficina;
   - Relatórios fotográficos;
   - Relatórios e entrevistas em vídeo;
   - Lista dos Integrantes das Equipes de Acompanhamento - EA;
   - Outras informações pertinentes.

b) Relatório Construção de Cenários e Visão de Futuro Consolidado:
   - Relatório Construção de Cenários e Visão de Futuro avaliado e compilado com as contribuições das 7 oficinas.
   - Definição do local e listagem prévia dos participantes da Audiência Pública de Construção de Cenários e Visão de Futuro.

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº – 4º andar – Ala C - 80.530-140 – Curitiba – Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 – Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 265

O Relatório de Atividade 03: Oficinas de Construção de Cenários e Visão de Futuro Contextualização e Relatório Construção de Cenários e Visão de Futuro consolidado (RA 03) será analisado e aprovado pela Equipe Técnica Intersecretarial – ETI em até 7 (sete) dias úteis e retornará, se for o caso, à contratada para devidos ajustes, a qual terá um prazo de 7 (sete) dias para reapresentá-lo.

Assim que aprovado, a empresa consultora estará autorizada a realizar a próxima sub-etapa e deverá disponibilizar todo o material elaborado para consulta pública através da internet, até 15 (quinze) dias antes da data de realização da Audiência Pública de Construção de Cenários e Visão de Futuro.

7.3.4. Audiência Pública de Construção de Cenários e Visão de Futuro

A Audiência Pública é a apresentação do Relatório de Construção de Cenários e Visão de Futuro consolidado para a população. Será realizada em três municípios dentro da área de abrangência do projeto, a ser sugerido no plano de trabalho pelo consultor e aceito pela Equipe Técnica Intersecretarial – ETI e tem como objetivo garantir participação amplificada da população, ouvindo os seus anseios e contribuições para a construção do Plano.

O resultado da Audiência Pública de Contextualização será a entrega do **Relatório de Construção de Cenários e Visão de Futuro Final (R.C.C.F.)**, que é o documento resultante da compilação do Relatório de Construção de Cenários e Visão de Futuro Inicial (R.C.C.I.), Relatório de Atividade 03: Oficinas de Construção de Cenários e Visão de Futuro Contextualização e Relatório de Construção de Cenários e Visão de Futuro consolidado (RA 03) e contribuições recebidas durante a Audiência Pública de Construção de Cenários e Visão de Futuro. Deverá conter um relato das contribuições e das presenças dos participantes durante a audiência pública.

O Relatório de Construção de Cenários e Visão de Futuro Final (R.C.C.F.) será analisado e aprovado pela Equipe Técnica Intersecretarial – ETI em até 7 (sete) dias úteis e retornará, se for o caso, à contratada para devidos ajustes, a qual terá um prazo de 7 (sete) dias para reapresentá-lo.

Assim que aprovado, a empresa consultora estará autorizada a realizar a próxima Etapa e deverá disponibilizar todo o material elaborado para consulta pública através da internet.

7.4. ETAPA 4: ESTRATÉGIAS DE AÇÃO

Nesta etapa deverão ser formuladas e detalhadas ações para permitir a implementação do PDS_LITORAL. A contratada deverá apresentar conjunto de planos, programas, projetos e ações, que contenham mecanismos de monitoramento e controle de ações governamentais para cada um dos meios diagnosticados e de forma que se inter-relacionem, por meio de matriz de inter-relacionamento.

7.4.1. Conteúdo Mínimo

As propostas, sempre acompanhadas de cronograma físico e estimativas orçamentárias (inclusive com indicação preliminar de fontes de recursos), deverão ser de intervenções físicas, estudos complementares e ações institucionais, de curto, médio e longo

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - 4º andar - Ala C - 80.530-140 - Curitiba - Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 - Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 266

prazo, que propiciem o equilíbrio entre os componentes da sustentabilidade (sociais, econômicos e ambientais), não deixando de analisar as questões infraestruturais e a sensibilidade dos ambientes naturais e os serviços ambientais prestados, sendo apresentadas na forma de textos acompanhadas de cronogramas, ilustrações, figuras, mapas, gráficos, quadros e tabelas para sua perfeita compreensão.

As propostas deverão contemplar as seguintes áreas:

a) Identificação e localização das zonas funcionais (existentes e propostas) que serão necessárias para acomodar o crescimento demográfico e econômico projetado para a área do Litoral, incluindo: áreas urbanas, áreas de indústria/logística, zonas turísticas, instalações públicas (incluindo saúde, educação, segurança e esporte em nível municipal), zonas de preservação, áreas rurais; e instrumentos regulatórios propostos para protegê-las.

b) Zonas ambientais/ecológicas para preservação (existentes e propostas), ou seja, parques naturais, reservas ambientais, reservas marinhas, florestas, áreas agrícolas e de aquacultura; áreas de preservação permanente, áreas de mananciais, áreas úmidas, áreas de Mata Atlântica, áreas de Unidades de Conservação, áreas de especial proteção ecológica, áreas com fauna e flora ameaçadas de extinção e áreas intocáveis e instrumentos regulatórios e estratégias de valorização propostas.

c) Áreas vulneráveis à mudança climática (existentes e futuras), incluindo áreas de risco de inundação e áreas expostas a outros riscos naturais (como deslizamentos), e instrumentos regulatórios de salvaguarda e estratégias de mitigação/adaptação.

d) Zonas históricas, culturais e arqueológicas para preservação (existentes e propostas) e instrumentos de salvaguarda e estratégias de valorização propostas.

e) Com base nas zonas funcionais, identificar a rede principal de transporte (existente e proposta) que irá articular a área Litoral a longo prazo, incluindo estradas, ferrovias, aeroporto(s), porto(s); desenvolver estimativas preliminares de custo para novos ativos e propor instrumentos regulatórios para garantir essas zonas e identificar os impactos ambientais sinérgicos; valorar os impactos ambientais; valorar os serviços ecossistêmicos e valorar as compensações ambientais;.

f) Com base nas zonas funcionais, identificar e localizar os investimentos-chave em infraestrutura urbana necessária para atender a capacidade de suporte dos municípios e apoiar o crescimento da área Litoral, tais como: sistemas de macro-drenagem, sistemas de esgoto e tratamento de efluentes, coleta, tratamento e distribuição de água; tratamento e descarte de resíduos sólidos; logística reversa e reciclagem de resíduos; linhas de energia e telecomunicação, educação, saúde, segurança, dentre outros e desenvolver estimativas preliminares de custo.

g) Identificar áreas informais/de baixa renda para o aprimoramento de programas de desenvolvimento social.

h) Proporcionar orientações às municipalidades para harmonizar os indicadores de planejamento urbano e padrões de desenvolvimento que tratam da forma de construção, utilização de terra, espaço público, áreas verdes, mobilidade não motorizada, e a prestação de serviços públicos básicos (educação, saúde e esportes).

i) Identificar as unidades de conservação atuais e futuras, a formação de corredores ecológicos e as áreas intocáveis;

j) Identificar outras iniciativas que irão apoiar a visão para a área Litoral à Longo Prazo.

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - 4º andar - Ala C - 80.530-140 - Curitiba - Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 - Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 267

Nesta etapa deverão ser construídas as estratégias de ação conforme sugeridas na Figura 6:

Figura 6: Estratégias de Ação

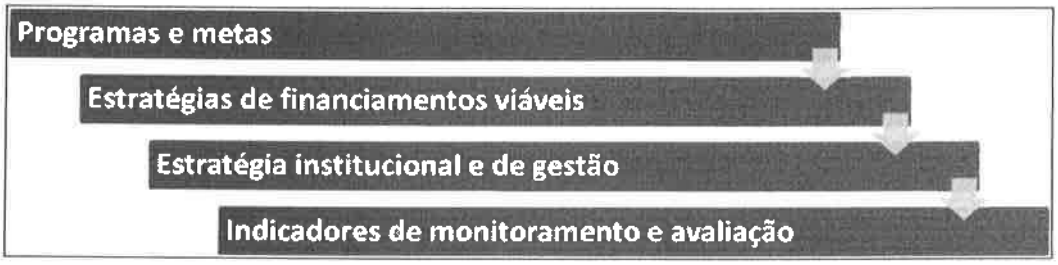

7.4.1.1. Programas e metas

Nesta etapa deverão ser formulados e detalhados os planos, programas, projetos e ações prioritárias pensados em curto, médio e longo prazo, hierarquizados por prazos de execução, acompanhados de propostas orçamentárias, cronogramas físicos e indicação prospectiva de fontes de recursos que permitam a implementação do plano.

As estratégias de ação deverão ser definidas segundo as áreas estabelecidas na Etapa de Contextualização (item 6.2), ou seja, compreendendo as seguintes dimensões: sócio territorial, ambiental, infraestrutura, econômica e institucional. Para cada uma dessas dimensões serão estabelecidos os programas e projetos e as respectivas metas a atingir segundo um horizonte temporal.

As propostas deverão ser de intervenções físicas, estudos complementares e ações institucionais que propiciem o equilíbrio entre os componentes da sustentabilidade (sociais, econômicas e ambientais), da organização espacial e modernização institucional, de infraestrutura e produtiva.

A fim de maximizar o impacto desta etapa, um plano de ação de curto prazo com foco nos primeiros cinco anos deverá ser elaborado em consulta com as partes interessadas. Alguns dos principais investimentos e iniciativas deverão ser priorizados de acordo com critérios e agrupados em componentes menores do projeto. Deverão incluir projetos que possam ser implementados de forma rápida, com a indicação de recursos, reunir o apoio dos principais atores e ter forte impacto e visibilidade ("alto impacto-baixo custo").

A definição de um conjunto de projetos tangíveis de curto prazo deverá contribuir para manter o ímpeto do planejamento e alavancar os recursos, o apoio institucional e as parcerias necessárias para a implementação de ações mais complexas.

7.4.1.2. Estratégias de financiamentos viáveis

Deverão ser apontadas as estratégias de financiamento viáveis para a implementação do plano, com foco na captação de recursos de curto prazo. Isto deverá incluir estratégias e incentivos para alavancar as contribuições do setor privado, realizar parcerias com municípios, comunidades e empresas locais e outras modalidades, captação internacional através de instituições e organizações.

7.4.1.3. Estratégia institucional e de gestão

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - 4º andar - Ala C - 80.530-140 - Curitiba - Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 - Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 268

A contratada deverá focar nas maiores questões institucionais e de gestão necessárias para abrir o caminho para a implementação do plano no curto, médio e longo prazo.

Com base em consultas com as partes interessadas, a contratada deverá recomendar um quadro institucional apropriado para gerenciar a implementação, revisão e atualização do plano.

Deverá ser modelada proposta de criação ou modernização de uma unidade/comitê de coordenação permanente, e definida o status jurídico, a composição institucional, o escopo de trabalho, a equipe e o orçamento necessário.

A contratada também deverá incorporar a descrição das funções e responsabilidades de cada uma das principais partes interessadas e destacar sinergias e inter-relações entre os seus mandatos. Deverá ainda detalhar ações voltadas à criação de uma base de dados que permita implantar um sistema de monitoramento eficiente para o plano.

7.4.1.4. Indicadores de monitoramento e avaliação

Deverão ser estabelecidos indicadores de monitoramento e avaliação para medir o progresso da implementação do plano durante o mesmo período. Da mesma forma que os itens anteriores, os indicadores de monitoramento e avaliação devem ser acordados entre os principais envolvidos implementadores.

7.4.2. Reunião Técnica 04

A Reunião Técnica 04 celebra a apresentação e entrega, para a Equipe Técnica Intersecretarial – ETI, do **Relatório do Plano de Ação Inicial (R.P.A.I.)** produzido pela empresa consultora.

O Relatório do Plano de Ação Inicial (R.P.A.I.) será analisado e aprovado pela Equipe Técnica Intersecretarial – ETI em até 15 (quinze) dias úteis e retornará, se for o caso, à contratada para devidos ajustes, a qual terá um prazo de 15 (quinze) dias para reapresentá-lo.

Assim que aprovado, a empresa consultora estará autorizada a realizar a próxima sub-etapa e deverá disponibilizar o Relatório do Plano de Ação Inicial (R.P.A.I.) e todo o material elaborado para consulta pública através da internet, 15 (quinze) dias antes da data de realização das Oficinas do Plano de Ação.

7.4.3. Oficinas do Plano de Ação

As Oficinas do Plano de Ação são encontros realizados em 7 (sete) municípios integrantes da área de abrangência do PDS_LITORAL com atores sociais locais de maior representatividade e tem como objetivo, submeter o Relatório do Plano de Ação Inicial (R.P.A.I.) à apreciação dos participantes da Equipe de Acompanhamento – EA. Os locais dos encontros serão sugeridos pela consultora e aprovada pela Equipe Técnica Intersecretarial – ETI, durante o Plano de Trabalho.

O resultado das Oficinas do Plano de Ação será a entrega do **Relatório de Atividade 04: Oficinas do Plano de Ação e Relatório do Plano de Ação Consolidado (RA 04)**. Este relatório deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos:

a) De cada uma das 7 (sete) Oficinas do Plano de Ação:

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - 4º andar – Ala C - 80.530-140 - Curitiba - Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 - Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 269

- Lista de Presença, contendo nomes, instituição e informações de contato;
- Ata da reunião que contenha a transcrição das contribuições de cada oficina;
- Relatórios fotográficos;
- Relatórios e entrevistas em vídeo;
- Lista dos Integrantes das Equipes de Acompanhamento - EA;
- Outras informações pertinentes.

b) Relatório do Plano de Ação Consolidado:

- Relatório do Plano de Ação avaliado e compilado com as contribuições das 7 oficinas.
- Definição do local e listagem prévia dos participantes da Audiência Pública do Plano de Ação.

O Relatório de Atividade 04: Oficinas do Plano de Ação e Relatório do Plano de Ação Consolidado (RA 04) será analisado e aprovado pela Equipe Técnica Intersecretarial – ETI em até 7 (sete) dias úteis e retornará, se for o caso, à contratada para devidos ajustes, a qual terá um prazo de 7 (sete) dias para reapresentá-lo.

Assim que aprovado, a empresa consultora estará autorizada a realizar a próxima sub-etapa e deverá disponibilizar todo o material elaborado para consulta pública através da internet, 15 (quinze) dias antes da data de realização da Audiência Pública de Construção de Cenários e Visão de Futuro.

7.4.4. Audiência Pública do Plano de Ação

A Audiência Pública é a apresentação do Relatório do Plano de Ação Consolidado para a população. Será realizada em três municípios a serem definido e tem como objetivo garantir participação amplificada da população, ouvindo os seus anseios e contribuições para a construção do Plano.

O resultado da 7.4.3. Audiência Pública do Plano de Ação será a entrega do **Relatório do Plano de Ação Final (R.P.A.F.)**, que é o documento resultante da compilação do Relatório do Plano de Ação Inicial (R.P.A.I.), Relatório de Atividade 04: Oficinas do Plano de Ação e Relatório do Plano de Ação Consolidado (RA 04) e contribuições recebidas durante a Audiência Pública do Plano de Ação. Deverá conter um relato das contribuições e das presenças dos participantes durante a audiência pública.

O Relatório do Plano de Ação Final (R.P.A.F.) será analisado e aprovado pela Equipe Técnica Intersecretarial – ETI em até 7 (sete) dias úteis e retornará, se for o caso, à contratada para devidos ajustes, a qual terá um prazo de 7 (sete) dias para reapresentá-lo.

Assim que aprovado, a empresa consultora estará autorizada a realizar a próxima Etapa e deverá disponibilizar todo o material elaborado para consulta pública através da internet.

7.5. ETAPA 5: CONFERÊNCIA REGIONAL

A Conferência Regional celebra o fim dos trabalhos de elaboração do plano e a entrega do **documento final.**

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº – 4º andar – Ala C - 80.530-140 – Curitiba – Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 – Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 270

Os produtos deverão ser apresentados em folha A4, sendo que mapas ou figuras poderão ser impressos em escala adequada e dobrados em formato A4, de acordo com as normas técnicas da ABNT.

Com exceção do documento final, deverão ser entregues, à contratante, 03 cópias impressas e encadernadas em volume único e 01 cópia em meio digital, em formato PDF, além da publicação posterior às aprovações na internet, através de website.

Serão entregues à contratante também 03 cópias em meio digital em formato editável e sem proteção como descrito abaixo:

- Textos: em formato .doc ou .docx, ou similar, desde que não haja desconfiguração da formatação original;
- Tabelas e Gráficos: Em formato .xls ou .xlsx, ou similar, desde que não haja desconfiguração da formatação original;
- Figuras e imagens: em formato TIF, com resolução de 300 dpi. (figuras coloridas devem ser readequadas a esse padrão).
- Mapas: deverão ser georreferenciados e salvos como projetos em extensão MXD, ESRI shapefile SHP e DWG ou DWF, ou similar, atrelados ao sistema de Referência SIRGAS 2000 e com sistema de projeção UTM. Cada camada de informação gerada deverá conter seus metadados armazenados em formato doc. Para divulgação deverão também ser divulgados em formato .PDF.
- Apresentações: em formato .ppt ou .pptx, ou similar, desde que não haja desconfiguração da formatação original;

Todos os dados e informações decorrentes de levantamentos e análises deverão estar convenientemente espacializados em mapas com riquezas de detalhes e deverão estar georreferenciados.

Critérios bibliográficos: as referências devem seguir as normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). As menções a autores, no correr do texto, seguem a forma (Autor, data) ou (Autor, data, página). Se houver mais de um título do mesmo autor no mesmo ano, eles são diferenciados por uma letra após a data. Colocar como notas de rodapé apenas informações complementares e de natureza substantiva, sem ultrapassar três linhas, em fonte Arial, tamanho 9.

Deverão ser entregues à contratante, 20 cópias do Volume Final, editado e impresso, 3 cópias em meio digital, em formato PDF e 3 cópias em meio digital em formato editável e sem proteção (como descrito anteriormente), segundo layout proposto pela empresa consultora e aprovado pela Contratante, através da Equipe Técnica Intersecretarial. Na Conferência Final será entregue, pelo menos, um volume a cada um dos Municípios da área de abrangência do Plano.

9. EQUIPES MÍNIMAS EXIGIDAS DA EMPRESA CONSULTORA

9.1. Equipes

A equipe de trabalho mínima exigida deverá ser composta por profissionais especializados em elaboração de planos de desenvolvimento.

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - 4º andar - Ala C - 80.530-140 - Curitiba - Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 - Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 271

Deverá ser organizada uma equipe multidisciplinar, minimamente constituída por profissionais com capacidade de redigir documentos, apresentar verbalmente os temas, organizar cursos, etc., com a comprovação de experiência pelos respectivos conselhos de classe ou atestados emitidos por contratantes, além das qualificações a seguir definidas:

9.1.1. Equipe Chave

- Coordenação e Macrozoneamento Regional – profissional com, no mínimo, 15 (quinze) anos de graduação e 15 (quinze) anos experiência, devidamente registrado junto ao respectivo órgão de classe (no Brasil ou em seu país de origem, se houver), com experiência multidisciplinar comprovada a partir de atestados em coordenação, de elaboração de planos de desenvolvimento regional, ou planos diretores para cidades com mais de 100.000 habitantes, ou atividades integradas (jurídica, urbanística e social) referentes às leis de uso e ocupação do solo e planos de uso e ocupação do solo. Excelentes relações interpessoais e habilidades de comunicação.
- Direito Urbanístico e Ambiental – profissional com, no mínimo 10 (dez) anos de graduação e 10 (dez) anos de experiência, devidamente registrado junto ao respectivo órgão de classe (no Brasil ou em seu país de origem, se houver), com experiência comprovada em elaboração de legislações na administração pública e elaboração de planos de desenvolvimento sustentável ou de planos diretores para cidades com mais de 100.000 habitantes.
- Infraestrutura – Sistema Viário e Transportes – profissional com, no mínimo, 10 (dez) anos de graduação e 10 (dez) anos de experiência, devidamente registrado junto ao respectivo órgão de classe (no Brasil ou em seu país de origem, se houver), com experiência comprovada na elaboração e/ou execução de atividades pertinentes a planos e obras de mobilidade ou de circulação viária para cidades com mais de 100.000 habitantes.
- Recursos Hídricos e Meio Ambiente – profissional com, no mínimo, 10 (dez) anos de graduação e 10 (dez) anos de experiência, devidamente registrado junto ao respectivo órgão de classe (no Brasil ou em seu país de origem, se houver), com experiência comprovada em diagnóstico ambiental e estudos de impacto ambiental, assim como, análise de disponibilidades hídricas para abastecimento público e de diagnóstico, análise de processos e elaboração de projetos de controle de cheias, de controle de enchentes e de drenagem para cidades com mais de 100.000 habitantes. Experiência em trabalhos realizados em zona costeira, com a capacidade de avaliar os impactos das drenagens nas vegetações naturais e seus efeitos na intrusão salina.
- Estruturação Social – profissional com, no mínimo, 10 (dez) anos de graduação, devidamente registrado junto ao respectivo órgão de classe (no Brasil ou em seu país de origem, se houver), com experiência comprovada em elaboração de diagnóstico social para planos regionais, planos diretores para cidades com mais de 100.000 habitantes de gestão urbana.
- Profissional de nível superior, com experiência comprovada em tratativas com as diversas comunidades e stakeholders envolvidos no projeto; encaminhamento e mediação de conflitos em audiências públicas e oficinas temáticas de trabalho.

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - 4º andar - Ala C - 80.530-140 - Curitiba - Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 - Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 272

9.1.2. Equipe de suporte da consultoria

Equipe responsável pelos trabalhos de suporte à equipe chave, incluindo:

- Geólogo, Geógrafo, Engenheiro Civil, ou áreas afins – Profissional devidamente registrado junto ao respectivo órgão de classe (no Brasil ou em seu país de origem, se houver), com experiência comprovada na elaboração de diagnóstico, análise e elaboração de projetos de estabilidade geotécnica de obras ou para fins de uso e ocupação do solo, geoprocessamento e georrefernciamento;
- Biólogo, ou áreas afins – Profissional devidamente registrado junto ao respectivo órgão de classe (no Brasil ou em seu país de origem, se houver), com experiência comprovada em diagnóstico e análise do meio biológico (fauna e flora) e participação em elaboração de planos de desenvolvimento, ou planos diretores, ou atividades integradas (jurídica, urbanística e social) referente às leis de uso e ocupação do solo, ou ainda de estudos de impactos ambientais e estudos de fauna silvestre e marinha;
- Economia e finanças – Profissional devidamente registrado junto ao respectivo órgão de classe (no Brasil ou em seu país de origem, se houver), com experiência comprovada em finanças públicas para liderar o processo de integração das questões de economia e finanças ao planejamento territorial e regional.
- Profissional de nível superior devidamente registrado junto ao respectivo conselho de classe, com experiência comprovada em diagnóstico e análise de elementos socioeconômicos e em elaboração de planos de desenvolvimento ou planos diretores, ou ainda de estudos de impactos ambientais.
- Profissional de nível superior, devidamente registrado junto ao respectivo órgão de classe (no Brasil ou em seu país de origem, se houver), especialista em turismo, com experiência em realização de planos de gestão de turismo.
- Profissional de nível superior, devidamente registrado junto ao seu conselho de classe, especialista em geoprocessamento de dados para liderar a produção de materiais e bases de dados baseados em mapas.
- Profissional de nível superior, com formação em história, geografia, arquitetura, arqueologia, turismo, ou áreas afins, preferencialmente com especialização em preservação do patrimônio cultural e artístico.
- Profissional de nível superior, especialista em análise e projeções demográficas e estatística.

9.1.3. Equipe de apoio

A equipe de apoio deverá ser dimensionada para atender ao projeto, no que se refere à organização do material produzido e outras atividades de caráter administrativo e operacional necessária ao bom andamento do projeto. Sugere-se que seja composta por profissionais com experiência em organização e secretaria, digitação e edição, motorista e desenhista.

9.2. Qualificação da empresa / consórcio

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº – 4º andar – Ala C - 80.530-140 – Curitiba – Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 – Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 273

A empresa consultora ou consórcio de empresas deverá apresentar atestados de capacidade técnica, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a experiência na execução de serviços, em especial nas áreas de:

- Planejamento e desenvolvimento regional;
- Integração das questões de economia e finanças no planejamento territorial;
- Elaboração de instrumentos legais e econômicos em meio ambiente, uso do solo e gestão urbana;
- Avaliações Ambientais;
- Zoneamentos;
- Mobilidade e Transporte;
- Consultas públicas;
- Levantamentos socioeconômicos e ambientais.

Os Atestados de capacidade técnica deverão ser emitidos em papel timbrado do informante/emissor, com nome, função e telefone de contato de quem os assina.

A empresa ou consórcio de empresas deverá comprovar sua experiência profissional através da apresentação dos trabalhos realizados correspondentes aos atestados apresentados no envelope.

O processo de seleção e contratação, definida no contrato entre o Governo do Paraná e o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), seguirá os termos das Diretrizes para Seleção e Contratação de Consultores Financiados Por Empréstimos do BIRD e Créditos e Doações da AID pelos Mutuários do Banco Mundial, de Janeiro de 2011[36].

10. CRONOGRAMA DE TRABALHOS

Após a assinatura do contrato e emissão da ordem de serviço, os trabalhos contarão com a apresentação do Plano de Trabalho (Produto 1) a ser consolidado após reunião com os representantes das instituições públicas e da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização.

O cronograma dos trabalhos e a apresentação dos produtos são especificados nos quadros a seguir:

36 *Diretrizes para Seleção e Contratação de Consultores Financiados Por Empréstimos do BIRD e Créditos e Doações da AID pelos Mutuários do Banco Mundial, de Janeiro de 2011, pode ser encontrado em : http://siteresources.worldbank.org/BRAZILINPOREXTN/Resources/3817166-1242680408578/Consultant_GLs_2011_PORT.pdf*

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - 4º andar – Ala C - 80.530-140 – Curitiba – Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 – Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 274

Tabela 3: Cronograma das Atividades (PARA MELHOR DEFINIÇÃO E RESOLUÇÃO VERIFICAR A PROPOSTA TÉCNICA DA EMPRESA)

BARCELONAGRASIL GROUP hidria Quanta Mcrit

TEC – 5

CRONOGRAMA DO TRABALHO E PLANEJAMENTO PARA OS PRODUTOS

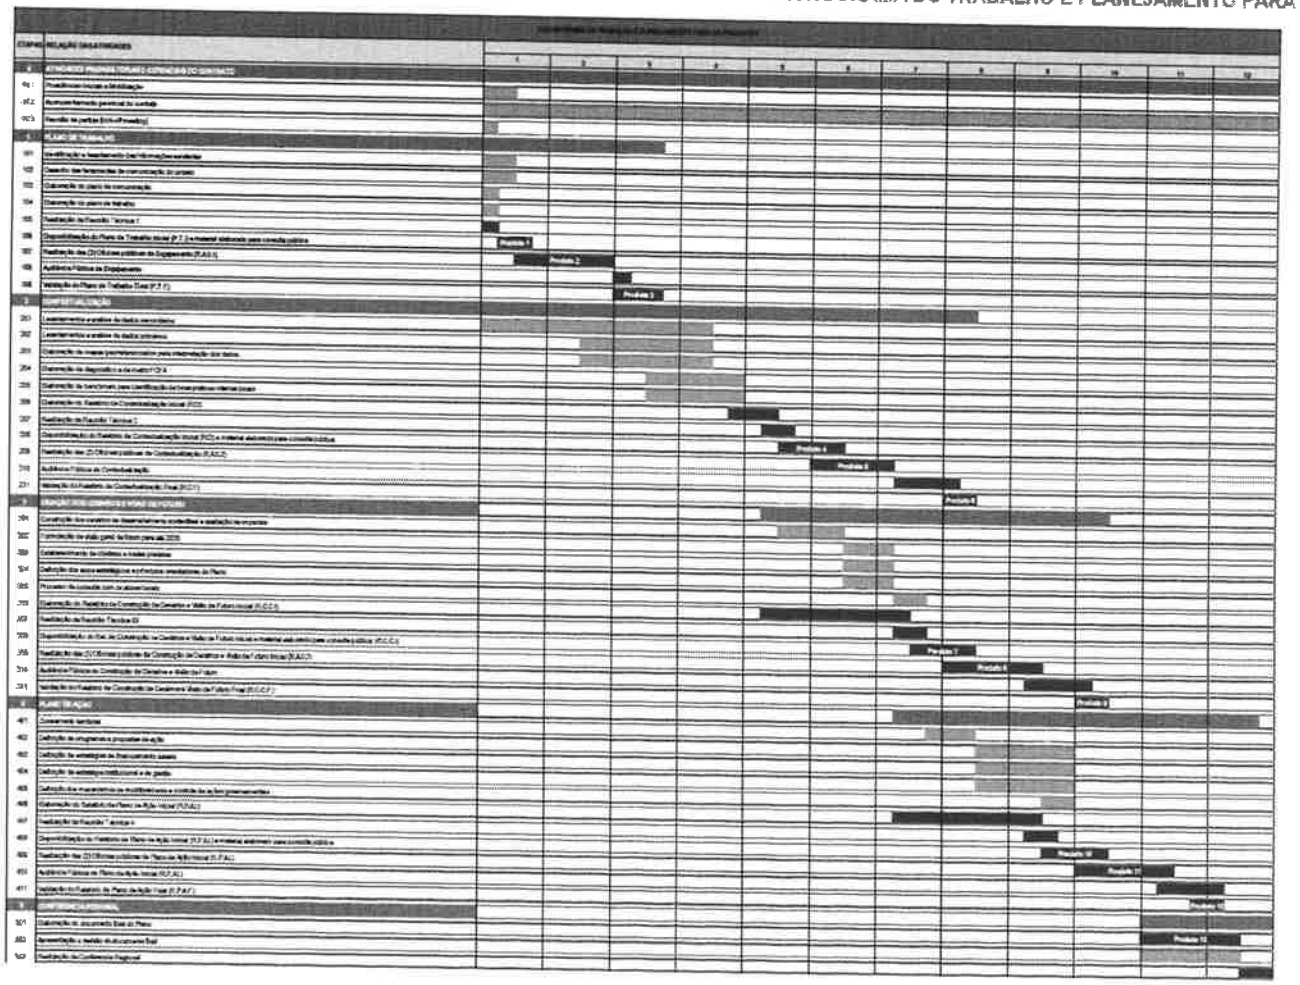

Legenda:

Atividades SDP

Atividades Adicionais propostas pelo Consórcio

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 275

Tabela 4: Cronograma Físico Financeiro

CRONOGRAMA FINANCEIRO

PRODUTO		MOEDA	
		EURO (€)	REAL (R$)
Produto 1	Plano de Trabalho Preliminar (P.T.P.)	2,25%	4,84%
Produto 2	Oficinas de Engajamento e Relatório de Atividades 01 (R.A. 01)	8,17%	7,16%
Produto 3	Audiência Pública 01 e Plano de Trabalho Final (P.T.F.)	7,99%	7,16%
Produto 4	Relatório de Contextualização Inicial (R.C.I)	7,30%	6,85%
Produto 5	Oficinas de Contextualização e Relatório de Atividades 02 (R.A.02)	7,30%	7,44%
Produto 6	Audiência Pública 02 e Relatório de Contextualização Final (R.C.F.)	7,68%	7,99%
Produto 7	Relatório de Construção de Cenário Inicial (R.C.C.I)	7,78%	7,89%
Produto 8	Oficinas de Construção de Cenários e Relatório de Atividades 03 (R.A.03)	7,78%	7,92%
Produto 9	Audiência Pública 03 e Relatório de Construção de Cenário Final (R.C.C.F.)	7,78%	8,42%
Produto 10	Plano de Ação Inicial (R.P.A.I.)	8,08%	8,57%
Produto 11	Oficinas do Plano de Ação e Relatório de Atividades 04 (R.A.04)	9,23%	8,92%
Produto 12	Audiência pública 04 e Relatório de plano de Ação Final (R.P.A.F.)	9,23%	8,92%
Produto 13	Documento Final e Conferência Regional	9,43%	7,92%
	TOTAL	**100%**	**100%**

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - 4º andar - Ala C - 80.530-140 - Curitiba - Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 - Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 276

APÊNDICE A

PROPOSTA TÉCNICA / CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 277

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

PROJETO MULTISSETORIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO PARANÁ

Empréstimo Nº 8201-BR

Solicitação de Proposta Nº: 02/2015
Elaboração Do Plano Para O Desenvolvimento Sustentável Do Litoral Do Estado Do Paraná

PROPOSTA TÉCNICA
(Original)

TEC-4

BARCELONABRASILGROUP

Mcrit hidria ciencia, ambiente y desarrollo Quanta CONSULTORIA

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 278

BARCELONABRASILGROUP hidria Quanta Mcrit

TEC-4

DESCRIÇÃO DA ABORDAGEM, METODOLOGIA E PLANO DE TRABALHO EM RESPOSTA AO TERMO DE REFERÊNCIA.

A – ABORDAGEM TÉCNICA E METODOLOGIA

4.1.1 Conhecimento do Problema e Contexto da Atuação

Marco das políticas de desenvolvimento regional no Brasil

No documento que define a Política Nacional de Desenvolvimento Regional – PNDR, o Ministério da Integração apresenta, após contextualização geral, as premissas, critérios e formas de implementação dessa política.

Na contextualização, o relatório avalia que "desde o pós-guerra, os governos têm enfrentado as desigualdades regionais com políticas compensatórias de desenvolvimento" com resultados frequentemente aquém dos resultados esperados.

Mais adiante cita que "desde a década de 80, no entanto, uma visão diferente de desenvolvimento vem se traduzindo em iniciativas de planejamento voltadas à valorização do potencial endógeno das regiões", inspiradas no sucesso de diversas regiões em todo o mundo, e que mesmo "em regiões periféricas podem ser observadas iniciativas bem-sucedidas de mobilização endógena, dinamismo, inovação e melhoria da renda e das condições de vida da população".

Conclui que "trata-se de um novo horizonte para as políticas de desenvolvimento, em que o objetivo de crescimento econômico necessariamente se associa à mobilização cívica, à cooperação, à valorização das identidades locais e regionais e à inclusão participativa de amplos setores da sociedade", e que "o Brasil, marcado por profundas desigualdades sociais e regionais, tem na Política Nacional de Desenvolvimento Regional - PNDR uma estratégia de desenvolvimento alternativa à guerra fiscal e à fragmentação territorial que predominaram desde a década de 80".

Na análise da realidade regional brasileira atual os dados levantados indicam, entre que:

- Em todas as macrorregiões do país a coexistência de sub-regiões dinâmicas, competitivas, com elevados rendimentos relativos médios e de sub-regiões com precárias condições de vida e traços de estagnação;
- A presença de dinâmicas microrregionais demográficas e de crescimento do PIB que assinalam um perfil territorial disperso, num contexto de baixo crescimento econômico agregado do país, de taxas cadentes de expansão natural da população;
- A persistência de um padrão macrorregional expressivo de diferenciação das principais variáveis, destacando-se a distância básica que ainda divide essencialmente o Norte e o Nordeste do Sul e Sudeste, com o Centro-Oeste aproximando-se destas últimas macrorregiões;

O documento define que "o objeto da PNDR são as profundas desigualdades de nível de vida e de oportunidades de desenvolvimento entre regiões do país. A matéria prima da Política é o imenso potencial de desenvolvimento contido na diversidade econômica, social, cultural e ambiental que caracteriza o Brasil" e, mais adiante, que "ao contrário do que se pode imaginar, o objeto da PNDR não é exatamente o combate à pobreza. Se assim fosse, o mapa de atuação da Política iria privilegiar a periferia das grandes metrópoles, o que cabe às políticas urbanas e à política social. Nesses locais, os bolsões de pobreza se incrustam em contextos ricos e dinâmicos. O objeto da PNDR se expressa na coincidência espacial entre pobreza individual e regional. Visto por uma perspectiva espaço-temporal, a PNDR se concentra nas regiões que, por sua situação de debilidade econômica e estagnação, geram expressivos fluxos migratórios, os quais constituem a maior parte dos bolsões

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 279

de pobreza das grandes metrópoles. Em outras palavras, a PNDR focaliza a causa da desigualdade e da pobreza em sua expressão territorial".

Entre as premissas assumidas, destaca-se que a Política Nacional de Desenvolvimento Regional "exige uma abordagem das desigualdades regionais em múltiplas escalas, que reconheça "a existência de dinâmicas sub-regionais diversas em todas as macrorregiões", bem como "a necessidade de coordenação de ações, com os entes federados e com a sociedade civil, em níveis que vão do intra-urbano ao mesorregional".

A nova Política Nacional de Desenvolvimento Regional – PNDR II consiste na retomada da sua discussão, promovida pelo Ministério da Integração Nacional, com destaque à realização de uma Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional no ano de 2012. O Texto de Referência dessa Conferência Nacional explicita o objetivo do PNDR, que é duplo:

I. Sustentar uma trajetória de reversão das desigualdades inter e intrarregionais, valorizando os recursos endógenos e as especificidades culturais, sociais, econômicas e ambientais;

II. Criar condições de acesso mais justo e equilibrado aos bens e serviços públicos no território brasileiro, reduzindo as desigualdades de oportunidades vinculadas ao local de nascimento e moradia.

Ainda em relação ao texto acima apresentado, ressalta-se que a abordagem atual do desenvolvimento regional trata as questões endógenas e exógenas no seu conjunto, visando a busca de uma ação equilibrada entre as mesmas.

Ainda no item relacionado aos objetivos, o texto menciona que "existe grande afinidade da política regional com a questão social e territorial. A política social enfrenta os desafios de redução da pobreza e da inclusão social no Brasil, que não se limitam aos espaços com déficits de desenvolvimento econômico, aparecendo, igualmente, de forma bastante aguda, nas grandes regiões metropolitanas do Sul e Sudeste e em outros espaços economicamente desenvolvidos em todo o País. Já a política regional promove a dinamização econômica dos espaços que apresentam atraso relativo de desenvolvimento, enfrentando um conjunto de desafios para superar as razões desse atraso, entre os quais se destacam os de natureza social. Do ponto de vista social, o que interessa à PNDR, portanto, é a pobreza e a desigualdade de renda na sua expressão territorial, decorrente da ausência, estagnação ou má distribuição da atividade econômica, bem como da baixa capacidade de oferta de serviços públicos básicos de qualidade. Políticas territoriais, por sua vez, referem-se a diferentes políticas caracterizadas por possuírem estratégias que reconhecem explicitamente o território na definição de sua intervenção. Trata-se de uma política transversal por natureza, possuindo o duplo desafio de responder às demandas de seu objeto, de um lado, com o recurso de instrumentos próprios e específicos e, do outro, ser o fio condutor estratégico da coordenação das diferentes políticas setoriais naqueles territórios".

Na apresentação dos Eixos Temáticos, o Eixo IV – Vetores de Desenvolvimento Regional Sustentável consiste em um tema de especial interesse para o Plano para o Desenvolvimento Sustentável do Litoral do Estado do Paraná. Entre as diretrizes sugeridas para a vertente da estrutura produtiva, temos:

- Explorar a diversidade como ativo para o desenvolvimento territorial e regional;
- Combinar os princípios de equidade e competitividade nas estratégias de desenvolvimento produtivo;
- Promover o desenvolvimento produtivo a partir da identificação e exploração das oportunidades e potencialidades locais e regionais;
- Buscar não somente as oportunidades já reveladas, mas também oportunidades e potencialidades implícitas e não reveladas que possam contribuir para mudar o futuro das regiões;
- Estimular a "economia verde", aproveitando amplamente suas possibilidades como mobilizadora e catalizadora de processos de desenvolvimento local e regional
- Estruturar redes de Arranjos Produtivos Locais (APLs) para o fortalecimento e o adensamento de cadeias produtivas regionais selecionadas.

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 280

Contexto regional do Estado do Paraná

A história de ocupação do Paraná, à exceção da região litorânea e da região onde se situa sua capital, é relativamente recente. Somente no século passado houve, com a expansão da cafeicultura paulista, a ocupação da região norte do estado, seguido da ocupação do sudoeste e oeste paranaenses pelos fluxos migratórios, sobretudo de agricultores familiares, provenientes do Rio Grande do Sul.

De acordo com a OECD – Organization for Economic Co-operation and Development, "o povoamento do estado se deu a partir de três diferentes frentes de ocupação, provenientes de diferentes partes do Brasil, cada qual em seu momento histórico específico. Tal fato gerou um problema complexo para a administração estadual, pois a maneira pela qual a ocupação ocorreu acabou por ser um fator contrário à emergência de uma identificação territorial. Com efeito, a ocupação populacional historicamente se efetivou em oposição à própria coesão e identidade do estado".

Uma síntese do estado do Paraná poderia caracterizá-lo pela coexistência de dois grandes espaços econômicos: um sob a égide do agronegócio e outro sob a égide da economia urbano-industrial (Rolim, 1996). Assim, ainda conforme a OECD, "o Paraná tem sido frequentemente caracterizado como um estado agrícola, e ao longo dos últimos quinze anos, emergiu no estado um dos mais modernos sistemas agrícolas do país.

Por outro lado, o processo de industrialização da cidade de Curitiba, capital do estado - assim como das cidades que constituem sua região metropolitana - ocorreu a partir dos anos setenta. Iniciando-se em setores tradicionais, ligados à produção madeireira e alimentícia, este processo evoluiu para setores mais dinâmicos e modernos, com ênfase na indústria metalomecânica e de materiais elétricos e eletrônicos".

Esse processo de industrialização estendeu-se de forma significativa, nos últimos anos, para outras cidades ou conjuntos urbanos paranaenses, tais como ao longo do eixo Londrina-Maringá, Ponta Grossa e o eixo Cascavel-Toledo, por exemplo. Isso fortaleceu a tendência da concentração populacional e econômica com maior ênfase nesses polos, além de outras cidades importantes como Foz do Iguaçu, Guarapuava e Paranaguá, estabelecendo um contraste com outras regiões menos ocupadas".

O Estado do Paraná encontra-se subdividido em dez Mesorregiões, sendo que o litoral paranaense integra a Mesorregião Metropolitana de Curitiba do Paraná:

1. Mesorregião do Noroeste do Paraná
2. Mesorregião do Centro Ocidental do Paraná
3. Mesorregião do Norte Central do Paraná
4. Mesorregião do Norte Pioneiro do Paraná
5. Mesorregião do Centro Oriental do Paraná
6. Mesorregião do Oeste do Paraná
7. Mesorregião do Sudoeste do Paraná
8. Mesorregião do Centro-Sul do Paraná
9. Mesorregião do Sudeste do Paraná
10. Mesorregião Metropolitana de Curitiba do Paraná

Essas mesorregiões são definidas por três dimensões:

"O processo social, como determinante, o quadro natural, como condicionante e, a rede de comunicação e de lugares, como elemento de articulação espacial. Estas três dimensões possibilitam que o espaço delimitado como mesorregião tenha uma identidade regional. Esta identidade é uma realidade construída pela sociedade que ali se formou" (IBGE, 1990, p.8).

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 281

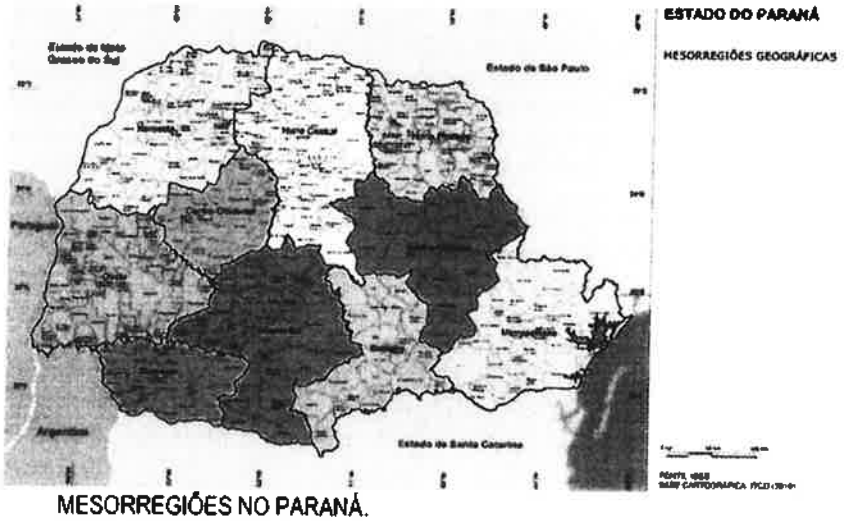

MESORREGIÕES NO PARANÁ.
Fonte: ITCG – Instituto de Terras, Cartografia e Geociências

O documento Os Vários Paranás – Identificação de Espacialidades Socioeconômico-Institucionais como Subsídio a Políticas de Desenvolvimento Regional, elaborado pelo IPARDES – Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, permite, ao analisar as especificidades do território e seus municípios, "identificar a força e as potencialidades econômicas de determinados setores e regiões, e os desafios sociais e sua vinculação territorial, como os marcos reguladores das contradições do processo de desenvolvimento".

Esse estudo identifica uma região de máxima relevância – ou primeiro espaço relevante – composta pela aglomeração metropolitana de Curitiba, pelo entorno de Ponta Grossa e por Paranaguá, e duas espacialidades de elevada relevância, compostas pelas aglomerações de Londrina e Maringá e pela porção oeste, "tendo Cascavel como vértice de vetores para Foz do Iguaçu e para Marechal Cândido Rondon".

Por incluir a cidade de Paranaguá, citaremos a seguir de forma sucinta alguns aspectos da caracterização do primeiro espaço relevante:

> *O principal espaço que se distingue no conjunto dos municípios paranaenses, que se denominou sintética e provisoriamente 1.º espaço, encontra-se configurado como um adensamento central (aglomeração metropolitana de Curitiba) e dois polos e suas respectivas aglomerações (Paranaguá e Ponta Grossa) nas pontas.*
>
> *Sua caracterização nas condições atuais é resultado de uma história de intensos movimentos convergentes de população e de capital. Embora seja fundamentalmente por meio deste espaço que o Paraná se integrou historicamente ao território nacional, sua densidade e concentração populacional, econômica e política se solidificaram a partir de meados do século passado.*
>
> *Desde os anos 1970, essa é a única espacialidade que apresenta saldos migratórios positivos e elevados. Enquanto, por duas décadas consecutivas – anos 1970 e 1980 –, várias porções do Estado sofreram significativas reduções de população, não apenas no meio rural, mas, inclusive, no total, a mesorregião metropolitana de Curitiba, que abrange, além da RMC, a porção litorânea, foi a principal receptora de fluxos migratórios.*
>
> *Mais distante do eixo metropolitano destaca-se Paranaguá, que se articula à dinâmica econômica do Estado pela sua função portuária. O Porto de Paranaguá é especializado na exportação agroindustrial e qualifica-se para responder às novas exigências da produção estadual, mas também de outras unidades de federação e países do Mercosul, especialmente no que se refere à comercialização e escoamento de grãos. Entretanto, ao longo do período, a participação de Paranaguá no VAF total do Estado não foi constante: em 1980, chegou a 3,4%, diminuindo progressivamente até atingir 1,8% em*

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 282

2000; recuperou-se em 2003, quando apresentou sua participação mais elevada, 3,81%, ficando entre os seis municípios com maior participação no VAF total estadual.

No 1.º espaço, outro destaque é Ponta Grossa, que, apesar de, ao longo do período, apresentar queda contínua da participação no VAF do Estado, à exceção de 1983, em 2003 foi responsável pela geração de 3,8% do VAF estadual (7ª posição entre os 399 municípios).

Outro documento importante para a compreensão do contexto regional do Estado do Paraná é o Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Paraná.

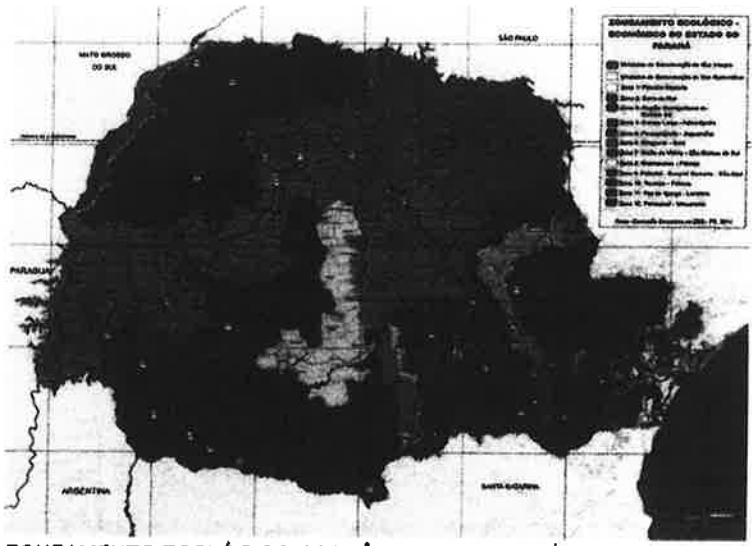

ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO DO PARANÁ
Fonte: ITCG – Instituto de Terras, Cartografia e Geociências

O Zoneamento Ecológico Econômico apresenta diretrizes gerais para duas zonas que envolvem o Litoral do Paraná, que são a Zona Planície Costeira e a Zona Serra do Mar. A seguir, uma síntese dessas recomendações.

Zona Planície Costeira

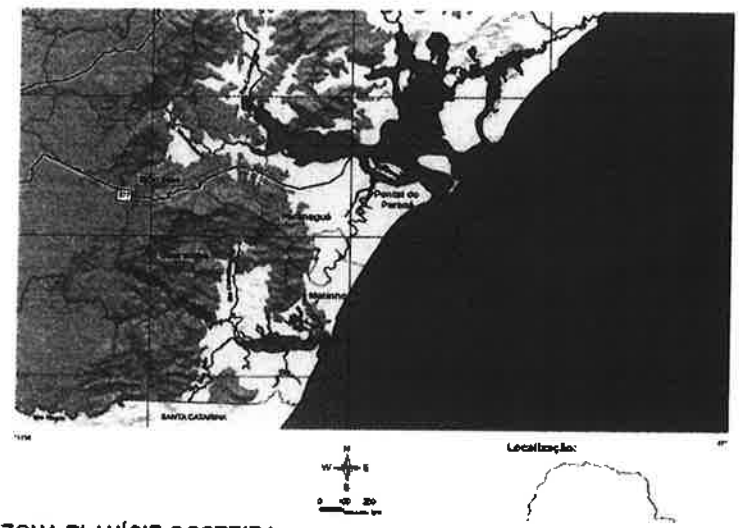

ZONA PLANÍCIE COSTEIRA
Fonte: ITCG – Instituto de Terras, Cartografia e Geociências

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 283

"Caracteriza-se por apresentar fragilidade geoambiental elevada em função de se constituir por relevo plano, com materiais arenosos e orgânicos inconsolidados e instáveis, lençol freático raso e possibilidade de colapsos em fundações e edificações. A zona é também muito suscetível às inundações e alagamentos. Predominam, com poucas exceções, solos inaptos para o uso intensivo com atividade agrícola, pecuária ou florestal.

Apresenta como principal potencialidade atividades portuárias, industriais vinculadas a exploração do petróleo do pré-sal, agroflorestal com base agroecológica, proteção à geobiodiversidade e para o desenvolvimento da aquicultura e pesca, processamento do pescado e atividades turísticas. A biodiversidade preservada refletirá na qualidade ambiental que por sua vez poderá comportar atividades turísticas de mínimo impacto negativo como uma das principais alternativas de trabalho e renda.

As diretrizes preferenciais estão voltadas para a preservação da biodiversidade, sobretudo dos remanescentes florestais, adequação do uso e manejo das áreas com uso agrícola consolidado e investimentos para o desenvolvimento econômico e social baseados na ampliação e melhoramento da infraestrutura existente (sistema de drenagem, sistema rodoferroviário, complexo portuário e atividades industriais vinculadas a exploração do pré-sal) objetivando atender as demandas das atividades econômicas para a importação/exportação e as atividades turísticas".

Zona Serra do Mar

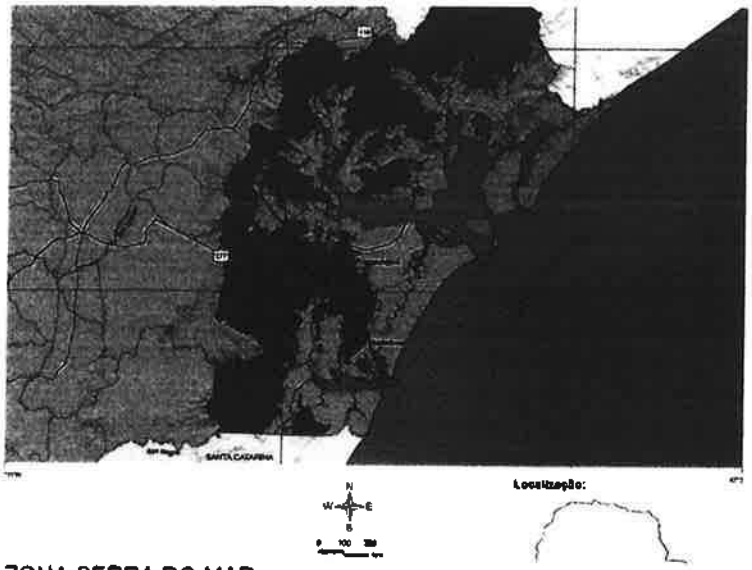

ZONA SERRA DO MAR
Fonte: ITCG – Instituto de Terras, Cartografia e Geociências

"Caracteriza-se por apresentar fragilidade geoambiental elevada em função de relevos com altas declividades, solos rasos e pedregosos; e elevados índices pluviométricos anuais. Em função de tais características, é suscetível a processos erosivos vigorosos e deslizamentos de terra. Apresenta baixa aptidão para agricultura convencional.

Apresenta como principal potencialidade ser recoberta pela Floresta Atlântica, rica em biodiversidade de flora e fauna e grande disponibilidade e qualidade de mananciais hídricos. Alto potencial para proteção da geobiodiversidade; prestação de serviços ambientais, especialmente associada à agricultura familiar não predatória; e atividades turísticas de baixo impacto. As diretrizes preferenciais vinculam-se a prática de atividades turísticas de baixo impacto; preservação da geobiodiversidade, objetivando a proteção dos mananciais hídricos; recuperação espontânea da fauna e flora; e prevenção de desastres naturais".

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 284

Apresentação da região do litoral paranaense

Uma das regiões mais bem preservadas da costa brasileira, a região do litoral paranaense é marcada pela existência de duas baías, a extensa Baía de Paranaguá e a Baía de Guaratuba, por planícies litorâneas com florestas relativamente bem preservadas, e pela imponente presença da Serra do Mar.

De acordo com o CEM – Centro de Estudos Marinhos, da Universidade Federal do Paraná, "a planície costeira tem sua morfologia profundamente recortadas pelos Complexo Estuarino de Paranaguá e o Estuário de Guaratuba, os quais originam um extenso litoral de costas protegidas, caracterizado pela existência de planícies de maré, cobertas principalmente por vegetação de mangue, sendo que, em alguns locais, ocorrem costões rochosos e pequenas praias. Nos estuários estão presentes ecossistemas de grande importância para a costa, servindo de áreas de refúgio, alimentação e reprodução de um grande número de espécies, algumas delas de interesse comercial. Também são importantes como vias aquaviárias para o transporte de mercadorias e pessoas entre as comunidades.

RECORTE DO LITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
Fonte: Centro de Estudos Marinhos - UFPR

Ainda de acordo com o CEM, a Baía de Paranaguá, ou Complexo Estuarino de Paranaguá, "está inserida ao norte da planície litorânea do estado do Paraná, possuindo uma superfície liquida e 601 km2. Geograficamente é considerada uma baía, e oceanograficamente, um estuário. Nela desaguam inúmeros rios, formando estuários menores, por isso considerada um complexo. Está dividida então em: Baía de Antonina e Baía de Paranaguá propriamente dita no eixo leste-oeste, e Baías das Laranjeiras, de Guaraqueçaba e Pinheiros, no eixo norte-sul. Entre as muitas ilhas, destacam-se as Ilhas do Mel, um dos principais centros de visitação do estado, e as de Superaguí e da Cotinga, locais por onde deu-se início a colonização do Paraná.

O Complexo faz parte do Complexo-Estuarino Lagunar Paranaguá-Cananéia-Iguape, considerado o 3º maior estuário do mundo em termos de produção primária. Junto com a Serra do Mar, esta região foi tombada pela Unesco em 1995, como Patrimônio da Humanidade, pois abriga os últimos remanescentes da Floresta Tropical Pluvial Atlântica do Brasil".

A preocupação com a conservação da região litorânea paranaense levou à criação de diversas Unidades de Conservação, que atualmente cobrem mais de 80% da área do Litoral.

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 285

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO LITORAL DO PARANÁ

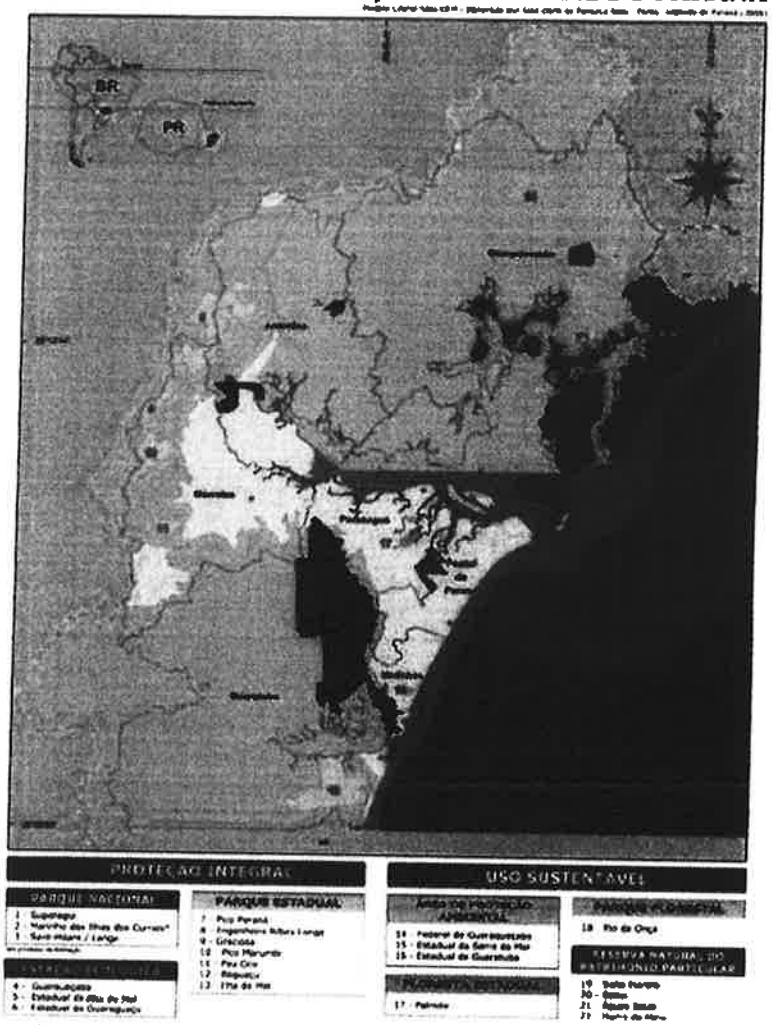

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO LITORAL DO PARANÁ
Fonte: Centro de Estudos Marinhos - UFPR

O Litoral do Paraná apresenta uma linha de costa de aproximadamente 100km, e é composto por sete municípios – Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná, Paranaguá, Morretes, Antonina e Guaraqueçaba – que no seu conjunto representam aproximadamente 3% do território paranaense. A população total é de 265.362 habitantes (IBGE 2010), sendo que mais da metade são habitantes do município de Paranaguá.

O Termo de Referência para a elaboração do Plano para o Desenvolvimento Sustentável do Litoral do Estado do Paraná menciona que "a dinâmica populacional dos municípios do litoral apresenta situações distintas", citando como exemplos o município de Matinhos, onde a implantação da Universidade Federal do Paraná – UFPR Litoral gerou um significativo incremento populacional, em contraste com o município de Guaraqueçaba, cuja população permaneceu praticamente estável nas últimas duas décadas.

As cidades de Paranaguá, Antonina e Guaraqueçaba localizam-se de frente à Baía de Paranaguá, sendo que Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba se desenvolvem em uma faixa contínua de ocupação urbana ao longo da costa. A cidade de Morretes localiza-se junto ao rio Nhundiaquara, ao longo do caminho histórico que interliga a planície litorânea com o primeiro planalto paranaense.

O estabelecimento do atual cenário de ocupação do território deu-se através do crescimento populacional em duas vertentes convergentes, a primeira devido aos imigrantes em busca de oportunidades de emprego na

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 286

cidade portuária de Paranaguá e nas atividades relacionadas ao turismo nos municípios praianos. A outra vertente deu-se pela aquisição de residências de veraneio, sobretudo na faixa de ocupação contínua acima mencionada, que se estende desde Pontal do Sul, no norte do município de Pontal do Paraná, até a divisa com o Estado de Santa Catarina, ao sul.

Centro econômico da região, a cidade de Paranaguá destaca-se sobretudo pelo porto, principal elemento dinamizador da sua economia, bem como por atividades industriais, comerciais e de serviços. O Porto de Paranaguá é o maior porto exportador de produtos agrícolas do Brasil, além de movimentar fertilizantes, contêineres, líquidos, automóveis, madeira, papel e açúcar, entre outros. A atividade portuária estende-se, embora em menor escala, à cidade de Antonina. A proximidade com a capital paranaense, Curitiba e as boas condições de acessibilidade, aliados à existência de um conjunto diversificado de atrativos turísticos, fazem com que o turismo seja uma atividade econômica importante em todos os municípios do Litoral.

Segundo o PDITS – Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (2010), "o espaço turístico natural do litoral é formado, principalmente, por elementos da paisagem reconhecidos como as praias, baias, serra e cachoeiras. Esses ambientes configuram a paisagem natural rica em diversidade biológica, nos diferentes ecossistemas que a compõem, destacando-se que a região possui o maior remanescente contínuo de floresta atlântica do país. A diversidade ambiental característica da região permite a provisão de mercado ampliada em relação aos segmentos turísticos reais e potenciais".

A Serra do Mar, as baías de Paranaguá e Guaratuba, a gastronomia, o patrimônio e caminhos históricos, o folclore e manifestações culturais, a natureza exuberante, as praias e as ilhas formam um conjunto de atrativos que oferece suporte à atividade turística, que em 2010 atraiu mais de 1.800.000 visitantes. Ainda segundo o PDITS, "em Paranaguá o atrativo natural de maior relevância, movimentando um fluxo significativo de turistas de diversas procedências, é a Ilha do Mel. Esse atrativo foi fundamental na definição de Paranaguá como destino indutor do estado do Paraná".

ILHA DO MEL

Outras atividades econômicas no Litoral do Paraná são a pesca, agricultura e pecuária em pequena escala, comércio e construção civil.

Os diversos indicadores econômicos e sociais situam os municípios do litoral paranaense abaixo ou próximo às médias estaduais, evidenciando a fragilidade econômica da região em relação ao Estado, à exceção do município de Paranaguá, que apresenta um quadro menos crítico, em razão, especialmente, da atividade portuária.

4.1.2 Principais problemas/desafios do projeto

Talvez o principal desafio do projeto esteja na proposição de uma dosagem equilibrada dos diversos componentes econômicos, sociais e ambientais existentes no Litoral do Paraná. Ou seja, no desafio de conciliar

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 287

a necessária preservação ambiental, que assume uma dimensão maior nessa região, com a busca de melhores condições socioeconômicas e com a pressão decorrente do crescimento das cidades, das atividades portuárias, da ampliação da infraestrutura e das rodovias, entre outros.

Outro desafio está na consolidação de um processo de planejamento das políticas regionais que, a nosso ver, deve buscar o equilíbrio entre os movimentos do 'fora para dentro' com os de 'dentro para fora', conforme Bacelar (2008):

> *[...] estamos numa terceira geração de políticas regionais. Passamos por uma primeira geração – muito ligada à visão de que o desenvolvimento de certos lugares dependia sempre de agentes de fora, mas muitas avaliações mostraram os limites dessa abordagem. Com a crise mundial e a onda neoliberal, verificou-se uma recuada dessa visão e [...] a teoria do desenvolvimento endógeno ganhou espaço, alcançou, mesmo, supremacia. Hoje estamos chegando a um meio termo. Tende-se, cada vez mais, a considerar que o que vem de dentro para fora e o que vem de baixo para cima seja muito importante, mas ficam cada vez mais claros os limites desse tipo de processo, especialmente num país como o Brasil. Passa-se, assim, a propor a construção de estratégias que combinem os dois movimentos: o de fora para dentro com o de dentro para fora. É isso que eu chamo de terceira geração de políticas regionais. Valoriza-se a iniciativa local, mas reconhece-se a importância de políticas nacionais.*

O Litoral Paranaense é, como mencionado, um dos trechos mais bem preservados da costa brasileira, graças às condições que lhe são peculiares – como o fato de não ter acompanhado o desenvolvimento verificado em outras regiões costeiras – e o esforço de entidades e organizações que zelam pela conservação ambiental dessa região. Atualmente cerca de 83% do território é protegido por unidades de conservação ambiental.

Mesmo assim, vários estudos indicam que ocorrem problemas socioambientais de diversas ordens, com avanços da ocupação sobre ecossistemas e áreas de maior fragilidade do ponto de vista físico e natural.

O Zoneamento Ecológico e Econômico do Litoral – ZEE do Paraná relaciona fragilidades nesse sentido, mas também aponta para potencialidades e faz recomendações, tanto para a Planície Costeira como para a Serra do Mar, conforme mostrado em uma apresentação resumida do ZEE, das quais transcrevemos alguns aspectos.

Planície Costeira

Fragilidades Específicas

- Unidades de conservação com planos de manejo desatualizados ou inexistentes, comprometendo a proteção da biodiversidade.
- As Formações Pioneiras de Influência Marinha (vegetação de dunas e restingas) e as de Influência Flúvio-Marinha (manguezais), praticamente desapareceram pela urbanização em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná.
- A Floresta Ombrófila Densa (Floresta Atlântica) foi parcialmente convertida para agricultura, pastagem ou outros usos. Há risco de extinção do palmito (*Euterpe edulis*), pela extração predatória e indiscriminada.
- Má qualidade da água do Aquífero da Planície Costeira (água salobra) para abastecimento público.
- Insuficiente oferta de água potável e de rede de coleta e tratamento de esgoto nas ilhas de maior fluxo turístico.
- A rede de coleta e tratamento de esgoto não abrange a totalidade da população urbana, podendo provocar a poluição das águas superficiais e subterrâneas, bem como a redução da balneabilidade.
- Predomínio de solos inaptos ou com aptidão agrícola restrita (Gleissolos sálicos, Espodossolos, Organossolos Cambissolos lépticos). Ocorrência de solos com elevada concentração de enxofre (tiomórficos) inaptos para qualquer atividade agrícola, pecuária ou florestal devido ao pH muito baixo (elevada acidez) quando drenados.
- No complexo das Baías de Paranaguá e Guaraqueçaba e nas formações de manguezais é forte a pressão com a captura e pesca predatória, principalmente na alta temporada.

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 288

- Integração deficitária entre as vias de transporte terrestres e náuticas para atender as atividades socioeconômicas.
- Acelerada expansão de loteamentos voltada a moradias de veraneio sem o adequado acompanhamento de infraestrutura urbana. Frente à sazonalidade turística, a infraestrutura pública é insuficiente, gerando discrepâncias entre demanda e oferta dos serviços.
- Região litorânea sujeita à dinâmica costeira (erosões e deposição marinha).

Potencialidades Específicas

- Possibilidade de criação de novas Unidades de Conservação de Proteção Integral.
- Estágios secundários da Floresta Atlântica nas Terras Baixas apresentam continuidade com as florestas das encostas, melhor conservadas, mantendo uma matriz florestal ainda extensa.
- Possibilidade de ganhos ambientais, econômicos e sociais com a exploração de fontes alternativas de energia, sobretudo as renováveis, como da biomassa, solar, eólica e das ondas.
- Fomento da produção do palmito juçara (*Euterpe edulis*), a partir do estímulo à produção por grupos cooperados de produtores, na forma de "produto agrícola".
- Adoção de sistemas de produção agroflorestais em base agroecológica compatíveis com a fragilidade ambiental da zona.
- Produção local e comercialização de produtos orgânicos.
- Expansão da atividade de aquicultura e pesca, e processamento da produção, principalmente no entorno dos complexos estuarinos.
- Expansão das atividades portuárias e indústrias associadas.
- Possibilidade de expansão para as atividades de logística rodo-ferro-portuária, promovendo o crescimento das atividades econômicas de serviços e empreendimentos diversos.
- Expansão da atividade turística nos segmentos de turismo de aventura, ecoturismo, turismo cultural, turismo de sol e mar, turismo náutico, turismo de negócio e eventos, turismo de pesca, turismo religioso, turismo histórico-cultural e gastronômico.

Recomendações específicas

- Consolidar e ampliar áreas com atividades urbanas, empresariais, agropecuárias e de infraestrutura, conforme os planos diretores municipais, salvaguardando obrigatoriamente os remanescentes florestais e as demais áreas protegidas por leis ambientais.
- Viabilizar planos e programas de políticas públicas que visem ao desenvolvimento das cidades portuárias e balneárias, de forma integrada, com uma perspectiva de crescimento mais harmoniosa e com sustentabilidade socioambiental para gerar emprego, renda e preservação ambiental.
- Ampliar o número e as categorias de Unidades de Conservação de Proteção Integral, de modo a proteger as Formações Pioneiras e florestais remanescentes, visando manter os solos, a estabilidade do relevo, a biodiversidade, a produtividade pesqueira e as possibilidades de usos pela população.
- Ampliar a cobertura da rede de coleta e tratamento de esgotos (efluentes domésticos), tendo como meta a universalização do atendimento da população urbana e áreas industriais.
- Incentivo aos cultivos agroflorestais em base agroecológica nas áreas de concentração de comunidades tradicionais para a produção comercial do palmito de Juçara (*Euterpe edulis*).
- Nas áreas agrícolas com uso consolidado incentivar a conversão da agricultura convencional para agricultura agroecológica ou orgânica com manejo e conservação de solos adequados.
- Exploração monitorada do potencial pesqueiro nos estuários e baías com base em estudo técnico específico.
- Expandir, por meio da exploração monitorada e de estudos com base técnica específica, a atividade de aquicultura, principalmente no entorno dos complexos estuarinos.
- Os investimentos devem priorizar obras de infraestrutura multimodal para atender as atividades portuárias, definindo com critérios adequados para a instalação de novas vias de transporte terrestre e atividades de retroporto, como armazéns gerais e terminais de carga e descarga, depósitos de contêineres e estacionamentos de caminhões e vagões.

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 289

- Ampliar as vias terrestres existentes para melhorar a mobilidade entre as cidades balneárias e as portuárias e a área metropolitana de Curitiba.
- Incentivar e valorizar a atividade turística, e a qualificação dos equipamentos e serviços de apoio a este segmento, por meio de regulamentos e monitoramento ambiental.
- Incentivar a exploração do turismo rural, turismo ecológico e outras atividades turísticas e de recreação de baixo impacto ambiental.
- Implantar áreas residenciais de interesse social, com prioridade às populações já residentes.
- Estimular a identificação dos bens que compõem o patrimônio cultural material e imaterial, visando protegê-los, conservá-los, restaurá-los e simultaneamente incentivar seu aproveitamento turístico.

Serra do Mar

Fragilidades Específicas

- Unidades de conservação com planos de manejo desatualizados ou inexistentes, comprometendo a proteção da Floresta Atlântica de encosta e Campos de Altitude.
- Alta fragilidade ambiental no Bioma da Mata Atlântica potencializado pela crescente pressão das atividades turísticas.
- Predomínio de solos de aptidão restrita e inaptos, que associados a terrenos com alto declive apresentam suscetibilidade à erosão, problemas com fertilidade e dificuldade de motomecanização.
- Uso irregular de agrotóxicos, atividades de caça e mineração, em muitos casos ilegais.
- Elevado risco ambiental e social frente instalação de plantas industriais e urbanas.
- Expansão das atividades turísticas de forma desordenada, com baixa qualidade nos serviços e equipamentos que se inserem neste setor econômico, apesar do enorme potencial para os segmentos do ecoturismo, turismo cultural e turismo rural.
- Atendimento deficiente das demandas sociais (moradia, saúde, emprego, educação, etc.), principalmente voltadas para as populações de baixa renda e populações tradicionais.
- Altos índices pluviométricos e grande amplitude topográfica que favorecem a ocorrência de deslizamentos nas áreas com maiores declividades, e inundações nos fundos de vales.

Potencialidades Específicas

- Possibilidade de criação de novas Unidades de Conservação de Proteção Integral.
- Alta biodiversidade (remanescentes da Mata Atlântica), habitats importantes para a conservação da diversidade genética.
- A cobertura vegetal gera benefícios indiretos como proteção de solos e manutenção de recursos hídricos.
- Potencial para pesquisa da biodiversidade em todos os níveis (genética, específica, ecossistêmica) com aplicações na economia.
- Alta disponibilidade hídrica de qualidade e quantidade.
- Extrativismo sob manejo sustentável.
- Produção de não madeiráveis de baixo impacto ambiental e artesanato.
- Atividades turísticas e de recreação de baixo impacto ambiental. Turismo em áreas naturais com programas de educação ambiental e com o envolvimento das comunidades locais.
- Significativa beleza cênica das paisagens naturais.

Recomendações específicas

- Preservação dos remanescentes florestais e as demais áreas protegidas por leis ambientais.
- Estimular a ampliação do número de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) e de Áreas de Proteção Ambiental (APA).
- Atualização dos planos de manejo ou elaboração destes nas Unidades de Conservação que ainda não os possuem.

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 290

- Preservação rigorosa da qualidade da água dos mananciais hídricos de abastecimento público.
- As áreas inexploradas, na perspectiva das práticas agropecuárias, com solos com aptidão restrita e inaptos, devem permanecer sob condições naturais.
- Nas áreas agrícolas com uso consolidado incentivar a conversão da agricultura convencional para agricultura agroecológica ou orgânica com manejo e conservação de solos adequados, respeitando a aptidão agrícola dos solos.
- Incentivo aos cultivos agroflorestais em base agroecológica nas áreas de concentração de comunidades tradicionais para a produção comercial do palmito de Juçara (*Euterpe edulis*).
- Desenvolvimento de estudos para identificar traçados adequados para a ampliação da infraestrutura viária.
- Geração de trabalho e renda para a população local, com o comércio de artesanato e produtos alimentícios caseiros, além de atividades de condutores/guias locais.
- Incentivar a exploração do turismo rural, turismo ecológico e outros segmentos e atividades turísticas e de recreação de baixo impacto ambiental.
- Desenvolver o Turismo de Base Comunitária, por meio de atividades de baixo impacto ambiental.
- Restringir a expansão populacional em áreas de risco fornecendo alternativas ambiental e socialmente adequadas.

O Termo de Referência do Plano traz um elenco de desafios e condicionantes relacionados ao Litoral do Paraná, alguns dos quais coincidentes com as fragilidades, potencialidades e recomendações identificadas pelo ZEE e acima apresentadas.

Recomenda ainda que "devem ser levados em consideração diversos elementos vinculados às mudanças ocorridas do ponto de vista socioeconômico e aqueles relacionados à preservação e conservação do patrimônio ambiental, histórico e cultural da região". Esses elementos incluem, além dos aspectos ambientais, econômicos e sociais, aspectos legais – como a necessária compatibilização e atualização da legislação existente – e aspectos de gestão, enfatizando "a necessidade de uma gestão compartilhada eficiente, participativa e atuante, que tenha como objetivo o planejamento e gestão integrada da região".

De modo resumido é possível compreender que deverá ser levado em consideração a necessidade de:

- Promover a preservação ambiental, sobretudo através do fortalecimento e valorização das unidades de conservação ambiental;
- Valorizar o patrimônio histórico e cultural, como os centros históricos das cidades mais antigas e os caminhos históricos que ligavam a planície litorânea com o primeiro planalto;
- Fortalecer as atividades características do turismo, em suas diversas modalidades;
- Considerar o crescimento da atividade portuária em Paranaguá e Antonina e a possível expansão dessa atividade em Pontal do Paraná;
- Considerar a possibilidade da reativação de dois antigos estaleiros em Pontal do Paraná;
- Considerar a possibilidade de fortalecimento e/ou expansão das redes de infraestrutura logística e urbana;
- Prever ações relacionadas às áreas de risco, sejam ambientais – como as onde ocorrem enchentes, inundações e deslizamentos – como as sociais, especialmente as decorrentes de ocupações irregulares;
- Prever a necessidade de identificação, compatibilização e atualização da legislação existente nas três esferas governamentais;
- Prever a necessidade de uma gestão compartilhada eficiente, participativa e atuante.

O Termo de Referência também relaciona os planos, programas, projetos e estudos a serem considerados na elaboração do Plano, enfatizando a necessidade do detalhamento do Zoneamento Ecológico e Econômico – ZEE do Litoral do Paraná:

- Zoneamento Ecológico e Econômico – ZEE do Litoral do Paraná (2013)
- Zona Costeira do Paraná – Zoneamento Marinho do Paraná

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 281

- Avaliações Ambientais Integradas e Estratégicas da Bacia Litorânea (2010)
- Plano Aeroviário Estadual do Paraná (2015)
- Projetos Contra Risco e Desastre Naturais no Litoral do Paraná (2013)
- Projeto Executivo de Proteção da Orla de Matinhos (2013)
- Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Paranaguá (2012)
- Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo – PDITS (2010)
- Projeto básico integrado de micro drenagem, macrodrenagem e controle de erosão marinha (2006)
- Planos Regionais de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Paraná – PRDE (2006)

Os diversos trabalhos relacionados, que em razão de suas especificidades eventualmente podem conter orientações de natureza diversa, ou mesmo conflitantes, implicarão em um desafio adicional, o de conciliar tais orientações durante a elaboração do Plano para o Desenvolvimento Sustentável do Litoral do Estado do Paraná.

4.1.3 Objetivos do Trabalho

A elaboração do Plano para o Desenvolvimento Sustentável do Litoral do Paraná – PDS_LITORAL visa sintonizar as ações dos três níveis de governo e da sociedade local, de forma a concentrar esforços na definição de ações que permitam o desenvolvimento sustentável da região.

Para tanto, o objetivo geral do projeto é traçar diretrizes e ações estratégicas para o desenvolvimento sustentável do Litoral do Paraná, respeitando as peculiaridades de cada município e fragilidade ambiental da região, protegendo o patrimônio natural, histórico e cultural, e garantindo o protagonismo dos atores locais no processo de elaboração e implementação do PDS_LITORAL.

Nesse marco serão considerados os seguintes elementos como objetivos específicos do projeto:

I. **Contextualizar a região,** através do levantamento, análise, compilação e diagnóstico de trabalhos existentes.

II. **Complementar a contextualização** da região com a elaboração de dados primários e pesquisas, aproveitando as contribuições coletadas nos eventos (reuniões, oficinas e audiências) a serem realizados.

III. Identificar, contextualizar, compatibilizar e propor um **ordenamento territorial da área de abrangência do projeto e no escopo estabelecido no edital.**

IV. **Identificar e contextualizar a relação da região de estudo** com o Estado do Paraná, outros estados, regiões vizinhas e com o litoral brasileiro e as relações do custo-benefício econômico-social-ambiental para o Litoral.

V. Identificar, contextualizar, compatibilizar e propor as principais **funções públicas de interesse comum** entre os municípios, com a finalidade de subsidiar a criação uma governança interfederativa de cada tema levantado.

VI. Identificar e contextualizar os principais arcabouços institucionais da região, rever e propor a modernização dos **instrumentos legais e institucionais** de gestão urbana, ambiental e territorial, estabelecendo as bases para a modernização/criação de instância de gestão interfederativa compartilhada.

VII. **Elaborar cenários prospectivos** econômicos, sociais, ambientais, de infraestrutura logística e urbana e do uso e ocupação do território, baseadas em projeções demográficas e de crescimento industrial / turística a serem desenvolvidas.

VIII. Propostas de **modelos de ocupação** para implantação e ampliação de grandes equipamentos logísticos, estruturas viárias, instalações industriais, grandes empreendimentos imobiliários, hidrelétricos, minerários, dentre outros, com a construção de cenários possíveis, considerando e

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 291

avaliando os impactos ambientais, sanitários, social e urbanístico resultantes, identificando biodiversidade e as comunidades direta e indiretamente atingidas e os custos de mitigação, compensação, restauração e recuperação ambiental.

IX. **Avaliar sinergicamente os impactos ambientais**, sanitários, sociais e urbanísticos resultantes dos cenários e modelos de ocupação propostos

X. Propostas de metas para a adaptação dos territórios municipais aos possíveis **impactos das mudanças climáticas**, já prognosticados a partir de pesquisas e estudos já realizados, incluindo ações de adaptação baseada em ecossistemas fomentadas pelos governos Federal, Estadual e Municipal;

XI. Integrar políticas, planos e ações do Plano de Desenvolvimento Sustentável ao **conhecimento científico e tradicional** existente;

XII. Integrar o mandamento de **preservação, proteção e conservação ambiental** com os desafios do desenvolvimento econômico e social sustentável;

XIII. Proposta de um **plano de ação, com diretrizes, propostas e metas** que visem ações de curto, médio e longo prazo dos poderes público federal, estadual e municipal, iniciativa privada e sociedade em geral, que promovam o desenvolvimento econômico e social sustentável.

XIV. Garantir a **participação de instituições** governamentais, sociedade civil, academia, terceiro setor e empresas da região para a colaboração, construção e implementação do plano, formalizando os compromissos firmados e consolidando o processo de planejamento participativo contínuo.

4.1.4 Vantagens competitivas adicionadas pelo Consórcio

A seguir são apresentadas as credenciais que atestam a capacidade do Consorcio na prestação do serviço a partir da experiência adquirida em projetos similares no nível nacional e internacional.

4.1.4.1 Atestada experiência em projetos de planejamento territorial com abrangência metropolitana ou regional, incluindo ações de comunicação e participação local

O Consórcio já desenvolveu projetos de planejamento territorial com abrangência metropolitana ou regional, como os que são apresentados a seguir:

Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana do Rio de Janeiro

O Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana do Rio de Janeiro é uma iniciativa do Governo do Estado, através da Câmara Metropolitana, financiado pelo Banco Mundial.

O mesmo visa construir uma visão de futuro e projetos estratégicos para a metrópole por meio de um processo técnico e participativo, ancorado nos múltiplos ativos sociais, ambientais, econômicos, históricos, culturais e de infraestrutura da região. Sempre com claros rebatimentos físico-territoriais e institucionais/gestão. O trabalho aborda os temas de estruturação espacial e centralidades, expansão econômica, valorização do patrimônio natural e cultural, mobilidade, habitação e equipamentos sociais, saneamento e resiliência ambiental e instrumentos de implementação (institucionais, participação, financeiros, jurídicos e informacionais).

No desenvolvimento do plano são incorporados aos seus produtos os subsídios colhidos nas oficinas realizadas regularmente em vários municípios. Nesses encontros, o diálogo com representantes dos poderes públicos municipais e de integrantes da sociedade civil, instituições acadêmicas, empresariado e organizações de classe produz insumos para a elaboração do Diagnóstico e da Visão de Futuro para a região metropolitana.

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 293

Neste contexto está sendo elaborado um conjunto de cenários, estratégias e instrumentos que orientem decisões governamentais nos anos futuros e sejam referências para a sociedade fluminense, ou seja, o Plano será um legado para a construção de uma metrópole sustentável e menos desigual.

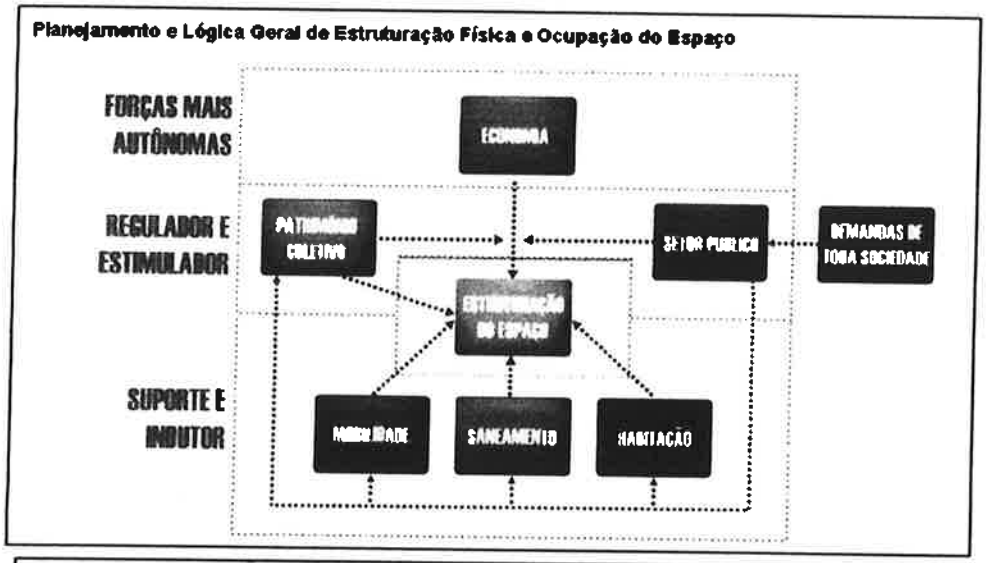

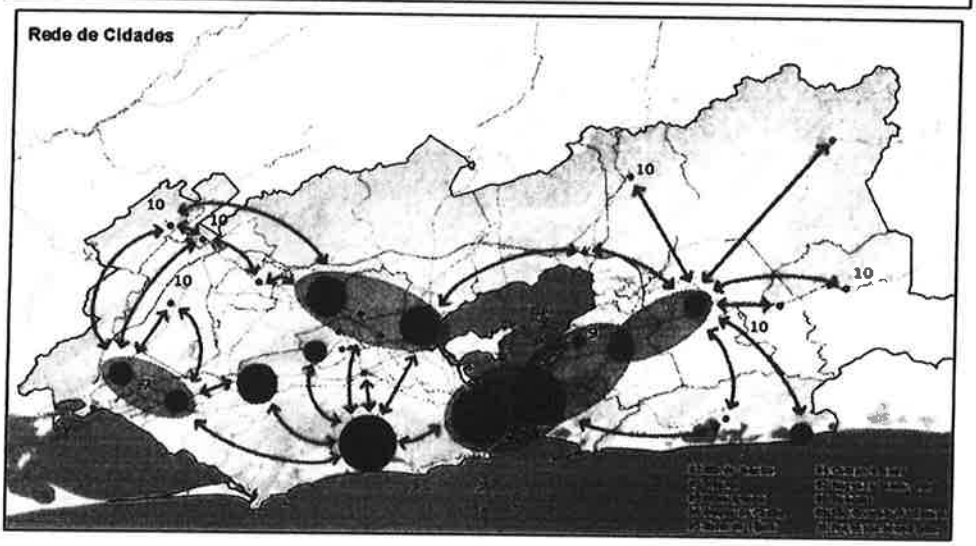

Plano de Desenvolvimento da Região Centro Sul do Estado do Ceará

O PDR Centro Sul como elo integrante da política de reestruturação espacial do Ceará teve por ponto de partida o amparo nas seguintes diretrizes estaduais que devem se traduzir em políticas e ações voltadas para: Promover a atividade econômica, gerando emprego e renda para a força de trabalho excedente do meio rural; Tornar a produção agrícola mais eficiente, com a adoção de novas tecnologias; Fortalecer os centros urbanos do interior além de suprir a área rural com serviços de apoio e demanda para a sua produção.

Análise Estratégica dos Projetos de Infraestruturas na Área Metropolitana de Barcelona

O projeto visa à análise dos projetos estratégicos de infraestruturas e desenvolvimento econômico previstos na área de abrangência metropolitana, identificando propostas alternativas e estabelecendo a análise de viabilidade técnica e socioeconômica dos projetos. Os relatórios contem esquemas e cartografia, além de uma síntese da informação quantitativa em relação aos custos dos projetos, benefícios diretos e indiretos e os impactos

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 294

macroeconômicos, sociais e ambientais associados que foram aprovadas em oficinas de participação local. Avaliação técnica e socioeconômica das alternativas identificadas

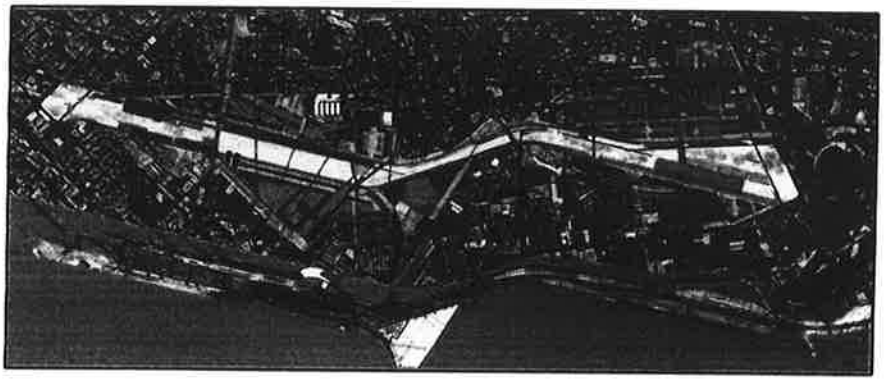

4.1.4.2 Vasta experiência em projetos de desenvolvimento de faixas litorâneas

O Consórcio possui intensa e importante atividade em projetos de desenvolvimento de regiões litorâneas, envolvendo: (i) análise das dinâmicas socioculturais, econômicas, urbanísticas, evolução e previsão da mobilidade; e dos impactos no meio ambiente e paisagem em geral, além da identificação dos projetos que podem ter incidência no território em curto e médio prazo; (ii) estudos de prospetiva e desenvolvimento de modelos de previsão e criação de cenários para avaliação de tendências futuras; (iii) definição das ações estratégicas a ser avaliadas pelos agentes locais; (iv) elaboração do Plano de Ação pelo desenvolvimento das ações estratégicas avaliadas; (v) desenvolvimento de ferramentas tecnológicas e aplicações SIG de cartografia temática para visualização gráfica das análises e propostas do projeto como ferramentas de apoio aos processos de decisão local; (vi) coordenação de planos de comunicação e participação local.

Plano estratégico e ordenamento territorial do Litoral Metropolitano de Barcelona (Espanha)

O Litoral Metropolitano de Barcelona abrange 27 (vinte e sete) municípios da área metropolitana de Barcelona. O projeto teve como objetivo a definição de um sistema de gestão integrada da costa, afetada pela urbanização do litoral e as mudanças na paisagem marítima. O Plano estabeleceu as diretrizes e propostas de ação no curto e médio prazo definindo os grandes projetos de infraestruturas no território, a partir de um processo de debate participativo com os agentes locais.



Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 295

Plano estratégico e ordenamento territorial da faixa litorânea de Maresme

O Maresme é uma região costeira da Catalunha na Espanha, composta por um total de 30 municípios. O Plano Estratégico Maresme 2015 visa o planejamento integrado do território unificando os objetivos socioeconômicos tradicionais nas estratégias de desenvolvimento econômico com base nos critérios urbanísticos e socioambientais que permita uma **transformação ativa do território, em vez de aceitação passiva das consequências do seu desenvolvimento.** O processo teve uma grande participação dos agentes locais na definição de ações de desenvolvimento econômico e social.

4.1.4.3 Experiência em estudos de prospectiva e criação de cenários

Cenários territoriais e perspectivas para Europa - ESPON ET2050 - (Territorial Scenarios and Visions for Europe)

ESPON ET2050 visa desenvolver ferramentas de apoio aos responsáveis públicos na **definição de uma perspectiva coerente e integrada em longo prazo em relação ao desenvolvimento territorial Europeu, incluindo os países da área de abrangência da União Europeia.** Os resultados do projeto deverão apoiar o processo de **construção de perspectivas territoriais** através da atualização, extensão e adequação dos cenários estabelecidos no marco do Programa ESPON.

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 296

FLAGSHIP – Análise prospectiva de desafios sociais e políticas inovadoras

FLAGSHIP visa desenvolver **cenários futuros** e de referência alternativa – com base em critérios **demográficos, econômicos, sociais e políticos na Europa** -, em relação ao contexto geopolítico global. O resultado deste exercício de previsão será um **conjunto de recomendações políticas específicas para as instituições europeias** para responder adequadamente aos novos desafios territoriais, sociais e problemas econômicos que a Europa enfrenta em longo prazo.

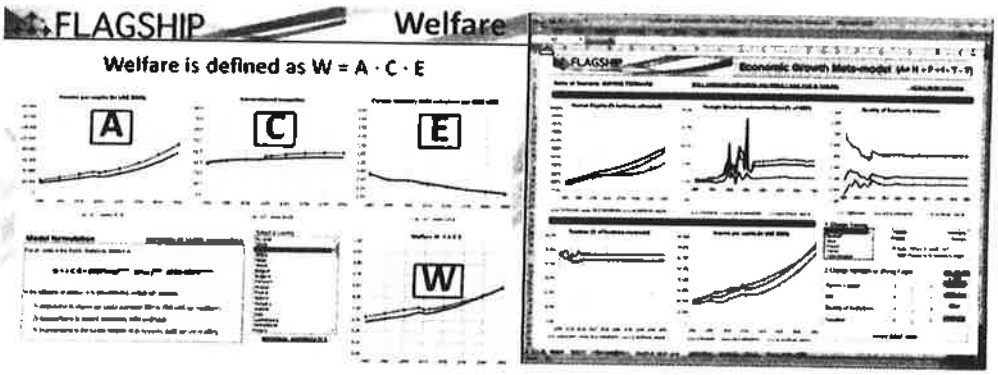

4.1.4.4 Envolvimento de especialistas locais e internacionais

A equipe profissional alocada ao projeto envolve especialistas paranaenses, nacionais e internacionais visando a transferência de boas práticas internacionais e o conhecimento profundo da realidade e idiossincrasia local da região de abrangência do projeto. O detalhe dos perfis da equipe profissional do projeto é indicado no item 4.3. da presente proposta.

4.1.5 Enfoque dos Serviços

Atendendo ao edital, o desenvolvimento não pode ser resumido apenas ao crescimento econômico, mas sim visto como um processo complexo, valorativo e carregado de vicissitudes. Compreender o desenvolvimento como transformação de mentalidade significa que todos os agentes assumirão responsabilidades no processo. Neste sentido, imprescindível o empoderamento da população e a apropriação do processo através da participação ativa e eficaz.

Para isto, o ponto de convergência de todo o esforço da sociedade e do Estado, deve ser o desenvolvimento regional e local integrados e sustentados. Ao buscar um crescimento global, sustentável e produtivo, a cidade ou região estimula a competitividade saudável e instala um ecossistema de inovação e cooperações, fomenta a economia criativa, resgata a identidade sociocultural do território e a integração social com a consciência de grupo e a construção de uma comunidade.

O enfoque dos serviços adotado pelo Consorcio visa garantir que o Plano para o Desenvolvimento Sustentável do Litoral do Estado do Paraná estabeleça condições especificas para a construção do desenvolvimento regional sustentável e ao mesmo tempo adote a metodologia do planejamento estratégico de forma a garantir a ampliação da capacidade competitiva regional, sem comprometer os processos ecossistêmicos e a biodiversidade associada, numa metodologia baseada em consensos entre os atores envolvidos baseados nos princípios apresentados na introdução do termo de referência.

Para tanto, como principal contribuição à metodologia proposta pelo edital, e com base nas lições aprendidas nos projetos de desenvolvimento regional já realizados, o Consorcio aponta a metodologia do **Design Thinking**

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 297

(DT), complementando os lineamentos metodológicos estabelecidos pelo Ministério de Integração para Elaboração de Planos de Desenvolvimento Regionais.

A metodologia de Design Thinking abrange não somente as áreas do conhecimento técnico, mas o componente da cooperação humana, fundamental para que o maior número de pessoas possa se apropriar e se beneficiar dos bens comuns de forma sustentável.

Nesse sentido, o ideal de cidades e regiões hoje vai além de ser cidades ou regiões digitais, instrumentadas e conectadas para captar e fluir a informação: devem ser inteligentes e promover a inovação aberta. As cidades e regiões inteligentes transcendem a tecnologia e dão feedbacks o tempo todo, se organizando em redes e não hierarquicamente. É o momento da convivência e do uso dos espaços públicos, onde tudo acontece no mesmo lugar, do networking e do compartilhamento de experiências no planejamento urbano e territorial. Essa mudança em larga escala somente pode ser promovida através da ação coordenada entre os três poderes que definem o processo urbano: político, econômico e social.

De forma resumida, uma cidade inteligente é aquela que gera melhor qualidade de vida e melhor aproveitamento dos orçamentos públicos através da melhoria dos processos da própria cidade e daqueles que vivem nela, investindo em capital humano e social. As cidades e regiões inteligentes facilitam a interseção desses três níveis, conectando os diversos centros de convergência acadêmicos e aproximando áreas de conhecimento.

O Design Thinking surge da essência "mão na massa" que permeia o processo, onde a experiência proporciona a compreensão dos valores imbuídos nos princípios para a gestão de bens comuns. Em especial, no contexto de transição para cidades e territórios mais humanos e inteligentes, uma prática desequilibrada da gestão do bem comum prejudica o desenvolvimento econômico e sustentável voltado para a produção de riqueza e qualidade de vida das pessoas que nela residem. Além disso, ao compreender que o conhecimento é um bem comum, a sua gestão também impacta no acesso à informação, na codificação do conhecimento, bem como na sua disseminação, armazenagem e aplicação em inovações tecnológicas e sociais. Nesse sentido, é possível entender o Design Thinking como ferramenta para expandir esses padrões mentais de colaboração, de forma que o indivíduo desenvolva um comportamento e uma atitude em prol do bem comum.

Para tanto, os conceitos principais (mindsets) do Design Thinking são indicados a seguir:

i. **Clareza**: Clareza na construção da visão para os problemas e na comunicação, de forma impactante; bem como sobre os aspectos que limitam o uso do bem comum.

ii. **Experimentação**: As pessoas afetadas pelo arranjo podem mudar as regras; experimentação como essência para a construção de mecanismos para resolução de conflitos.

iii. **Empatia**: No desenvolvimento de soluções para os usuários em relação ao uso do bem comum e no monitoramento do comportamento daqueles que se apropriam dele.

iv. **Mindfulness**: Autoconhecimento como mecanismo de resolução de conflitos e maior consciência do processo de desenvolvimento da solução.

Tudo isso, em um processo em que todos possam observar, participar e compartilhar, ou seja – acesso aberto e compartilhado.

Os princípios da metodologia do Design Thinking nortearão o processo de planejamento estratégico do projeto atendendo ao esquema de trabalho apresentado a seguir:

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 298

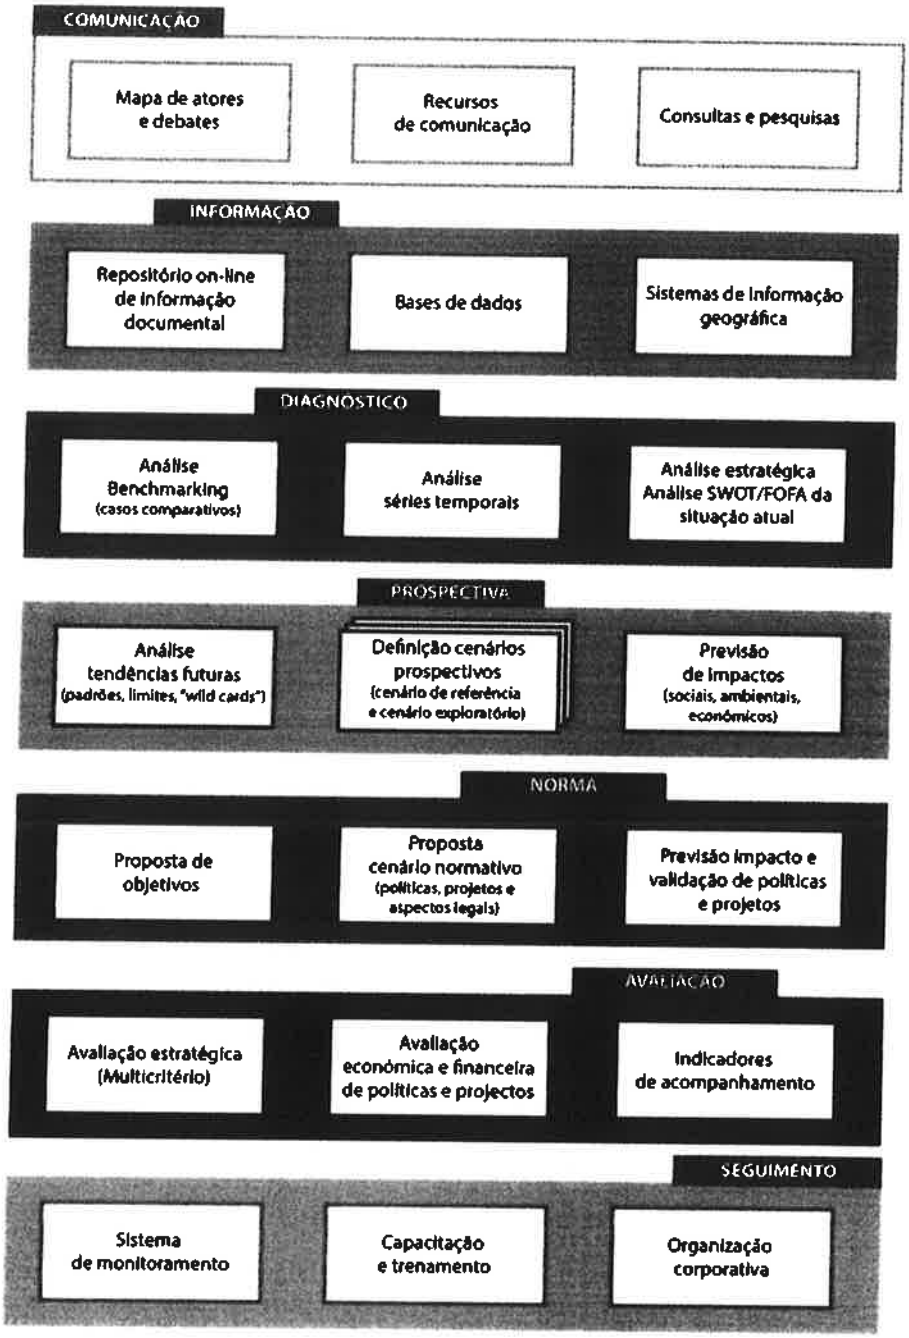

4.1.6 Metodologia para executar as atividades

Neste item, o CONSÓRCIO apresenta os principais procedimentos metodológicos adotados que permitem a execução dos serviços que devem compor a elaboração do PDS_LITORAL.

Todas as atividades serão executadas pelo CONSÓRCIO observando-se o exigido nesta Concorrência Pública, em especial seu Termo de Referência, bem como os regulamentos referentes aos órgãos de fiscalização e controle e as normas em vigor. A elaboração do PDS_LITORAL atenderá o preconizado pelo Ministério da Integração Nacional atendendo à elaboração de planos regionais, além das indicações contidas no Zoneamento

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 299

Ecológico e Econômico – ZEE do Litoral do Paraná (2013), contendo informações ambientais e socioeconômicas planejar a ocupação racional e o uso sustentável dos recursos naturais.

No que concerne as audiências públicas, devem seguir a regulamentação federal, estadual e municipal, inclusive do Estatuto da Cidade (Lei no 10.527/2001)e do Conselho Nacional das Cidades, da Lei no 8.666/1993, Lei no 9.427/1996 e Lei no 9.478/1997, preservando-se o princípio da publicidade, com divulgação de todos os atos e documentos e da participação, com possibilidade de intervenção dos participantes, por intermédio de questionamentos ou colaborações orais e escritas, bem como a apresentação de pareceres, manifestações, moções, etc, anteriores, durante ou posteriores as audiências. Em todas as oficinas e audiências públicas deve necessariamente haver a participação de gestores e representantes de unidades de conservação estadual e federal. A metodologia de participação deverá respeitar também a Resolução nº25, de 18 de março de 2005, do Conselho Nacional das Cidades, que emite orientações e recomendações sobre a garantia do processo participativo.

A seguir são detalhadas as diretrizes metodológicas das fases de trabalho do projeto, considerando mais uma etapa de mobilização das equipes e coordenação gerencial visando ao estabelecimento das questões relativas à logística e organização dos trabalhos.

4.1.6.1 Fase de mobilização inicial e coordenação gerencial do projeto

O CONSÓRCIO está habituado a enfrentar desafios como o desenvolvimento de estudos e projetos em prazos com escopo previamente definidos. Para tanto, costuma planejar cuidadosamente as ações necessárias antes do início das atividades, evitando desencontros ou descontinuidades no nível de esforço alocado, bem como evitando e corrigindo prontamente ações que possam afetar o equilíbrio entre o escopo a ser executado, o prazo a ser cumprido, e os recursos acordados para a execução dos serviços.

O pleno êxito da implantação dos serviços de Consultoria previstos, requer uma organização coordenada, racional e sistemática de todas as funções executivas, de tal forma que as condicionantes contratuais de qualidade, prazo e custo sejam alcançadas. Neste sentido, a prática tem demonstrado como solução mais eficaz a adoção de sistemas gerenciais baseados nos fundamentos da administração por objetivos.

Dessa forma, o modelo gerencial proposto baseia-se na larga experiência do CONSÓRCIO adquirida na prestação de serviços como o pretendido na PDS_LITORAL, sendo este definido à luz dos mecanismos de gestão preconizados pelo PMI (Project Management Institute). Todos os procedimentos gerenciais a serem adotados visam à otimização do processo de implementação das principais atividades a serem executadas, propiciando:

- Antecipação de eventuais problemas (proatividade);
- Verificação e acompanhamento das tendências de desvio de custo, prazo e qualidade;
- Implementação de medidas corretivas de forma a eliminar ou atenuar os desvios, evitando atrasos nos elementos básicos do Plano de Mobilidade Urbana de Salvador; e
- Procedimentos que assegurem a entrega dos relatórios e produtos dentro dos prazos, atendendo aos padrões de qualidade pré-estabelecidos.

Nesta fase também será mantida a reunião inicial do projeto (kick-off meeting), visando ao estabelecimento das bases de trabalho e alinhamento nos itens da metodologia proposta com a equipe do Governo e Equipe Técnica Intersecretarial - ETI.

Considerando que as informações a serem fornecidas pelo Governo são essenciais para a execução com sucesso do projeto, a reunião inicial com a equipe do órgão envolvida diretamente na estruturação do projeto, com o propósito de ratificar os objetivos pretendidos. A identificação e clarificação de tais metas desde o início são essenciais ao desenvolvimento adequado dos serviços. Assim, no início do desenvolvimento dos trabalhos serão obtidas junto à equipe do Governo as informações existentes, necessárias para a execução dos serviços. Referimo-nos às informações financeiras, técnicas e jurídicas, de forma aprofundada àquela disponibilizada no

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 300

Termo de Referência, sem prejuízo de futuras solicitações de dados adicionais. Desta forma, poderão ser identificados os riscos e os elementos chave que possam existir na hora de implementar o Projeto e que deverão ser levados em conta na definição do Plano de Trabalho da etapa seguinte.

4.1.6.2 Elaboração do Plano de Trabalho

Trata-se da formulação dos planos iniciais de atuação do Consórcio e estabelecimento das bases organizacionais que regerão os serviços dos estudos para a elaboração do PDS_LITORAL, onde serão definidas as linhas gerais de configuração do Plano de Trabalho, incluindo as ferramentas e plano de comunicação do projeto como indicados a seguir:

LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇAO DAS INFORMAÇOES E PLANOS EXISTENTESO levantamento das informações existentes em relação aos planos, pesquisas, estudos e projetos na área de abrangência do Projeto permitem identificar lições aprendidas decorrentes de iniciativas anteriores que serão tomadas em conta na definição de projetos pelos programas operacionais do PDS_LITORAL. A atividade de levantamento e organização de informações sobre iniciativas já existentes ou propostas na região visa garantir a coordenação do Projeto em relação aos demais planos e programas de desenvolvimento regional e local estabelecidos pelas instituições competentes na região Litoral, evitando a duplicação de esforços e assegurando o alinhamento dos resultados do Projeto com as iniciativas de planejamento e desenvolvimento já realizados ou existentes na área de abrangência. Além disso, o levantamento de informações também visa orientar o escopo e conteúdo das pesquisas primarias que deverão ser consideradas para complementar as análises e estudos existentes que deverão ser consideradas na elaboração do Plano de Trabalho do projeto.

ELABORAÇAO DO PLANO DE COMUNICAÇAO DO PROJETO

A comunicação/ participação social trata-se de um instrumento democrático que estimula o exercício da cidadania participativa e tem como objetivo aumentar a efetividade das políticas de governo e diminuir a ineficiência da administração pública, ou seja, por meio de medidas de descentralização de opiniões, de compartilhamento de responsabilidades, de criação e ampliação dos canais que favoreçam a transparência e a disponibilização de informações, tem-se garantia de que as políticas públicas que serão empregadas de fato atenderão às demandas prioritárias da sociedade.

A dimensão da Comunicação é essencial na construção do Plano para o Desenvolvimento Sustentável do Litoral do Estado do Paraná.

A mobilização dos diversos públicos envolvidos no processo participativo, a ampliação do debate público sobre as suas propostas, a divulgação do documento resultante e a valorização do planejamento a partir da perspectiva regional exigirão um esforço continuado e amplo de comunicação.

A comunicação do PDS_Litoral vai enfatizar os seguintes valores:

Figura 4.1.6.6.D: Plano de Comunicação

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 301

- **Participação:** será preciso mobilizar e motivar os diferentes grupos e instituições convidadas a contribuir para a formulação do plano;
- **Transparência** na gestão pública, através da difusão de forma clara e acessível as etapas e resultados;
- **Construção da memória e identidade da Região**, tanto pela difusão de informações e ampliação o debate sobre desafios, práticas e objetivos comuns desta região, quanto pela escuta dos seus cidadãos;
- **A importância do planejamento integrado**, essencial para o desenvolvimento harmônico da região.

Desafios

- Mobilizar, em parceria com a equipe de participação, os vários públicos envolvidos em reuniões técnicas, oficinas, audiências públicas e conferência regional;
- Garantir que as várias instituições, órgãos, especialistas e participantes envolvidos nos debates do Plano acompanhem as suas atividades e recebam suas conclusões de forma clara e regular;
- Comunicar à população a existência do plano e suas principais conclusões, enfatizando a sua dimensão participativa;
- Produzir, organizar e disponibilizar documentos, vídeos, fotos e textos que formarão a memória do Plano;
- Difundir perspectivas variadas sobre a metrópole, através da gravação e divulgação de depoimentos de participantes do Plano e de cidadãos metropolitanos.

Estratégia

A Comunicação do Plano será um esforço integrado em várias frentes, a saber:

Elementos da Estratégia para o Plano de Comunicação e Participação Social	
Veículos	Mídias sociais (*facebook, instagran, twitter, youtube* – importante dar destaque especial para equipamentos móveis de comunicação), meios de comunicação de massa tradicionais (rádio, jornal e YV), centros de informação, mecanismos de consulta (urnas), e jornais e rádios locais, ouvidoria, quiosques, encontro com públicos específicos (gestores municipais, jornalistas, redes de cooperação, etc) , audiências públicas, site institucional; b*log interativos, webdoc* (vídeos curtos com linguagem de difusão e visibilidade, inclusive, com participação e elaboração de pessoas das comunidades retratando seus temas mais caros dentro das possibilidades de atuação regional); dentre outros
Foco Geral dos Conteúdos	Mapeamento e sistematização das recomendações reunidas dos eventos promovidos no âmbito do Plano e de documentos existentes e disponíveis
Princípios e Diretrizes	Fortalecimento da cultura regional, sistematização das contribuições recolhidas e promoção de canais de interação
Públicos-alvo	Prioritariamente: Gestores públicos (municipais da metrópole e estaduais); Acadêmicos, Sociedade civil e organizações privadas. Complementarmente: população em geral
Tipologia de Temas Prioritários	Os temas debatidos devem seguir uma estratégia propositiva orientada pelos temas prioritários apontados pelo TR, mas com a flexibilidade necessária para assimilar as demandas dos atores locais

Mídia Digital

O atual contexto em que a informação é pulverizada e consumida prioritariamente através de redes sociais exige que o projeto dê ênfase aos meios digitais, como forma mais eficiente de divulgação, especialmente para públicos segmentados e organizados territorialmente. A estratégia digital será baseada na **organização e**

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 302

difusão das informações através de website e produção intensa de conteúdo especialmente desenvolvido para redes sociais.
Mais do que apenas um site institucional, o site será um canal de informação sobre a Região do Litoral Paranaense, agregando dados e pesquisas sobre este território. Também serão disponibilizados textos dos consultores, atas de reuniões e depoimentos em vídeo dos participantes do Plano e de cidadãos.

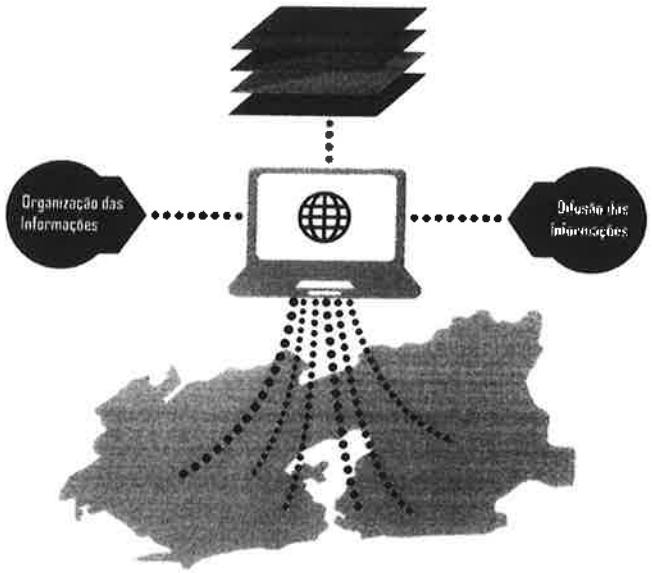

Figura 4.1.6.6.E: Plano de Comunicação.

Já os perfis do Plano nas redes sociais – a princípio, Facebook, Twitter e Youtube, inicialmente – serão canais de difusão de eventos e de informações, capazes de estimular a conversa entre os internautas. Gráficos apresentados de forma atraente, vídeos, fotografias, enquetes, links para reportagens serão alguns desses conteúdos.

Mídia Convencional

A estratégia de imprensa incluirá um esforço para sensibilizar iniciativas locais de comunicação nos 7 municípios: **rádios e TVs comunitárias, jornais locais, sites, páginas em redes sociais**, tanto através do envio regular de informações como de encontros destes comunicadores alternativos com a equipe do Plano.
Os grandes jornais, emissoras de rádio e TV também receberão um fluxo regular de informações e, de acordo com o calendário de eventos e o desenvolvimento do Plano, serão acionados para cobertura de eventos, pautas exclusivas sobre temas da região, artigos e entrevistas. As demandas de assessoria de imprensa serão atendidas em parceria com a equipe do Contratante.

Newsletter

Divulgação dos conteúdos postados no site e nas redes sociais através de newsletters enviadas regularmente para mailing qualificado. Também serão pensados informes para mobilização especial dos diversos grupos envolvidos no processo de discussão do plano. Estes terão reforçado o seu compromisso com o debate metropolitano através do envio de textos e informações exclusivas.

Outras Ferramentas

Investimento, de acordo com a agenda de eventos, em ferramentas de divulgação adequadas a cada território, como faixas e carros de som.

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 303

Produtos e Ferramentas

- **Nome fantasia e identidade visual**, capazes de comunicar de maneira direta e instigante os principais conteúdos do Plano;
- Apresentação institucional dinâmica e motivacional;
- **Backdrop** desmontável para eventos e atividades itinerantes;
- **Website**: concentrará as informações do processo – notícias, eventos, relatoria de reuniões, além de dar acesso aos perfis nas redes sociais e dar visibilidade ao caráter participativo, com depoimentos de integrantes dos debates do plano e da população. Também terá uma área com todos os documentos de referência – estudos, pesquisas, mapas etc – sobre a região do Litoral Paranaense, tornando-se assim fonte de informação para a imprensa e público em geral;
- **Desenvolvimento de plataforma adequada para acesso do site por celular;**
- **Páginas em redes sociais**: páginas e perfis no Facebook, Twitter, Instagram e Youtube, com conteúdo especialmente formatado para essas plataformas, atraente e acessível. Infográficos, vídeos, fotos sobre o Plano e sobre a Região. A partir dessas páginas, será feito esforço de mobilização e interação com o público em geral e, especialmente, com organizações, formadores de opinião e articuladores comunitários atuantes;
- **Mapeamento** dos seguintes públicos, para organização de iniciativas de comunicação: iniciativas locais de comunicação; comunicadores dos órgãos, grupos e instituições integrantes do processo de formulação do Plano; perfis de redes sociais relacionados aos municípios da Região Litorânea;
- **Newsletter**, convites e avisos especiais, enviados regularmente para grupos como jornalistas, comunicadores e integrantes de órgãos do setor público, sociedade civil, setor privado, órgãos internacionais, academia e coletivos;
- **Folder** com apresentação sintética do plano, dados sobre a região e canais de difusão (site, redes) para distribuição nos eventos;
- Série de **vídeos com depoimento** dos participantes das reuniões do Plano e de cidadão;
- **Relatórios** Visão de Futuro e relatório final do Plano.

Atividades Estruturais

- Seleção e contratação de equipe;
- Criação de nome fantasia e identidade visual;
- Entrevistas/encontros com consultores e equipe do Plano para reunião de subsídios e referências;
- Identificação de públicos-alvo, com base na estratégia de participação;
- Mapeamento de iniciativas de comunicação locais;
- Levantamento de perfis e páginas relacionadas a territórios no Facebook e em outras redes para elaboração de estratégia detalhada de comunicação digital;
- Levantamento de perfis e páginas relacionadas a organizações regionais e órgãos relacionados aos eixos do Plano no Facebook e em outras redes para elaboração de estratégia detalhada de comunicação digital;
- Criação de perfis nas principais redes sociais e implantação de estratégia digital
- Produção de banco de dados para email marketing;
- Arquitetura, desenvolvimento, produção de conteúdo e publicação de website
- Produção de folder sobre projeto;
- Produção de layouts básicos para apresentações, convites e relatórios, de acordo com identidade visual;
- Produção de relatórios finais.

Atividades Regulares

- Encontros de formuladores do Plano com comunicadores dos municípios da região litorânea, visando o estabelecimento de parceria para difusão regular de informações sobre iniciativa no território;

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 304

- Sensibilização de comunicadores de órgãos do setor público, sociedade civil, setor privado, órgãos internacionais, academia e coletivos para a troca de informações e sensibilização sobre a importância da difusão do plano nas suas plataformas de comunicação;
- Atividades em praças e escolas para escuta dos cidadãos sobre desafios da metrópole e gravação de vídeos;
- Produção de releases sobre os eventos;
- Divulgação de eventos para veículos de comunicação;
- Cobertura de texto, vídeo e foto de eventos e encontros;
- Produção de vídeos para difusão em redes sociais;
- Produção de fotos, gráficos e outros conteúdos exclusivos para postagem nas redes sociais;
- Mobilização dos diversos públicos para participação através das redes sociais, com enquetes e postagens incentivando a livre manifestação da população;
- Monitoramento dos comentários nas redes sociais e relacionamento com o público através desses canais; melhores contribuições podem ser copiadas no site;
- Alimentação do site com o conteúdo produzido pela equipe de comunicação e pelas demais equipes envolvidas no Plano;
- Envio de newsletters com os conteúdos relacionados ao Plano para mailing qualificado;
- Envio de convites;
- Suporte ao Contratante no atendimento a demandas da imprensa.

DESENHO DAS FERRAMENTAS DE COMUNICAÇAO DO PROJETO

O processo de desenvolvimento regional é a soma de um conjunto de investimentos e esforços da administração pública, do setor privado e da sociedade civil organizada. Isso exige uma articulação entre todos os atores participantes do projeto. Para isso, é necessário que as pessoas da comunidade local e das instituições de referência tenham conhecimento sobre o que está acontecendo e da importância do Plano, com o intuito do seu envolvimento nas atividades de planejamento e participação local previstas.

A imagem possui uma grande influência na sociedade atual. Tudo que passa pela visão (formas, cores, texturas) tem a função de comunicar algo. É uma comunicação sensível que vai além, muitas vezes, da própria capacidade racional de decodificação de mensagens. Traz em si uma série de elementos cognitivos que são processados instantaneamente na mente das pessoas, fazendo associações imediatas entre formas e "sentimentos". Para tanto, o Consorcio propõe a criação de duas ferramentas de comunicação: o **site do projeto** e a **logomarca** ou imagem do projeto

A Identidade Visual do PROMOB deve informar imediatamente, estabelecer uma comunicação imediata, fazendo que o receptor da imagem consiga sentir a informação, antes mesmo de percebê-la racionalmente. A Identidade Visual deve possuir quatro elementos que caracterizam sua composição:

- Principais: Logotipo e Símbolo;

- Secundários: Cores padrão e Alfabeto/ Tipologia.

A identidade visual deve trazer um traço moderno, com uma proposta de imagem mais clara, arrojada, atrativa e marcante, como por exemplo, as cores da bandeira do Rio de Janeiro. Outros elementos que apontem para uma cidade jovem, enérgica e cosmopolita, tanto para a população quanto para os turistas. Será fundamental identificar os aspectos socioculturais, técnicos e estéticos pertinentes ao desenvolvimento do PDS_LITORAL para que se possa criar um projeto de identidade visual que retrate a grandeza e a importância do empreendimento.

Algumas das logomarcas que já foram criadas pelo consorcio no marco de processos de planejamento participativo regional são mostradas a seguir.

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 305

Figura 4.1.6.2.A: Exemplo de logomarcas de projetos criadas em projetos similares
Fonte: Elaboração própria

A segunda ferramenta de comunicação que será desenvolvida pelo Consórcio é o site do projeto, em um sistema repositório on-line (em formato Joomla, plataforma livre de restrições comerciais). O site atende a um objetivo comunicativo e participativo, garantindo a transparência em todo o processo e colocando à disposição dos agentes interessados e beneficiários as informações necessárias pela participação no processo de forma informada e construtiva, permitindo a comunicação em modo virtual visando estabelecer uma plataforma de participação direta dos agentes no desenvolvimento do Projeto.

Além das informações para as consultas e audiências locais previstas no marco do projeto, o site conterá as informações, relatórios e pesquisas que sejam consideradas relevantes ou estratégicas para o Projeto, sendo um ponto de informação de referência sobre o Litoral do Paraná.

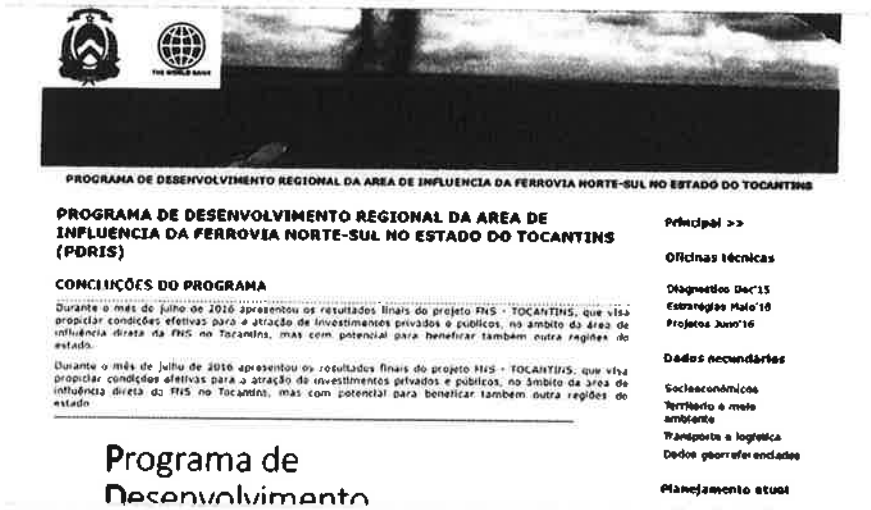

Figura 4.1.6.2.B: Exemplo de repositório on-line criado no marco de outros projetos similares
Fonte: http://www.mcrit.com/pdris/ (PDRIS, WB-SEPLAN TO, 2016)

O Plano de Trabalho será apresentado na **Reunião Técnica 01** com e Equipe Técnica Intersecretarial – ETI para obtenção do Plano de Trabalho Inicial (P.T.I) que deverá ser validado e aprovado nas Oficinas Locais e Audiência Pública como detalhado adiante. O resultado após as aprovações locais será o Plano de Trabalho Final (P.T.F) do projeto.

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 306

4.1.6.3 Contextualização e Diagnóstico

A través da coleta e análise sistematizada da informação, esta etapa visa a elaboração de um diagnóstico orientado ao conhecimento e definição da situação de partida e as **necessidades de desenvolvimento** da área costeira, bem como a identificação das **prioridades estratégicas** definidas pelos instrumentos de planificação existentes.

Por tanto, este segundo componente do Plano de Trabalho consta das seguintes ações:

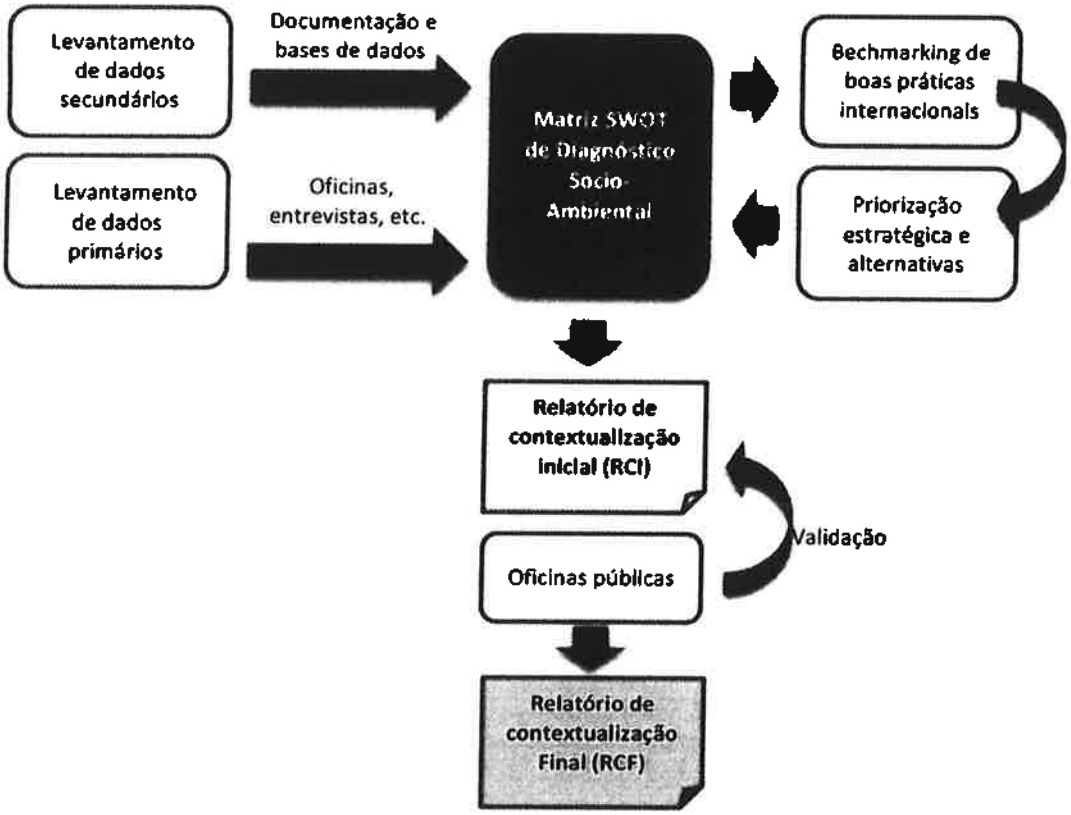

LEVANTAMENTO E ANALISE DE INFORMAÇOES

Para a realização do PDS_LITORAL, o Consórcio precisa de informações da atual situação territorial e de conhecimento para criar informações sobre a situação futura, e assim, estimar de modo verossímil os impactos que terão as decisões, planos e projetos na área de abrangência do projeto. As informações podem ser quantitativas ou qualitativas, e em qualquer caso, um sistema de informação deve contar com um conjunto de dados a princípio dispersos. Isto permitirá conhecer as problemáticas, os riscos, as ameaças, as vulnerabilidades, como também os valores e as oportunidades atualmente existentes para o desenvolvimento sustentável da costa da região do Paraná e desenhar medidas adequadas para garantir o desenvolvimento de forma compatível com a conservação e a qualidade de vida das populações locais e elaborar os cenários prospectivos de evolução da situação.

Coleta de dados secundários

A consulta de fontes de dados secundários será a principal fonte de informações que sustentarão a contextualização da Região Litorânea do Paraná. A compilação de dados secundários compreende a obtenção

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 307

de dados primários que tenham sido transformados de forma que se encontram acessíveis através de **bases de dados bibliográficas escritas ou digitais do âmbito acadêmico, científico, governamental ou de caráter privado**, bem como projetos, planos e programas de desenvolvimento e gestão do território e dos recursos naturais e culturais aplicáveis ao âmbito do projeto.

Realizar-se-á o **levantamento, a recolha, a atualização, a sistematização e a análise** dos dados secundários (informações bibliográficas, normativas, iconográficas e cartográficas existentes) sobre a dinâmica ambiental e socioeconômica da área costeira. O diagrama a seguir mostra a diversidade de fontes de consulta de dados para este primeiro levantamento de informações.

Figura 4.1.6.3.A: Fontes secundárias de consulta de dados e informação para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Sustentável do Litoral do Estado do Paraná.

Deste modo, caberá inicialmente a pesquisa secundária das fontes disponibilizadas pelos parceiros já identificados no edital além de outros documentos que poderão dar suporte ao diagnóstico de Contextualização da Região Litoral do Paraná, como detalhado a seguir:

a) <u>O Meio Socioterritorial e Cultural</u>

A coleta de informação sobre o meio socioterritorial se fará com base na literatura científica e informes técnicos existentes sobre a área de interesse, complementando-a com fotografias aéreas/satélite, ou sobre a base cartográfica disponível. Os aspectos sobre os quais se procurará **informações no âmbito sócioterritorial** incluem: os padrões de uso e de ocupação do solo, a demografia e fluxos migratórios, as funções públicas de interesse comum, as demandas de habitação, qualidade do uso e infraestruturas associadas, regulação da ocupação e questões fundiárias como as caraterísticas e diagnósticos das diferentes categorias das áreas de ocupação e as ocupações irregulares, o nível de saúde, segurança e educação detalhada da população em cada um dos municípios da área de abrangência do planejamento, as atividades de esporte e lazer, bem como as atividades tradicionais, o patrimônio histórico, cultural e imaterial que caracteriza a região e as suas gentes .

O estado de Paraná tem um vasto **patrimônio cultural, histórico e arqueológico**. Dentro dos 7 municípios que compõem a Região do Litoral Paranaense, as cidades de Paranaguá, Morretes, Antonina e Guaraqueçaba, se

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 308

destacam pelo conjunto de casario histórico, comunidades tradicionais, gastronomia, folclore e manifestações culturais.

O **IPHAN (Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional)**, que depende do Ministério de Cultura tem uma base de dados no que aparecem uma série de bens tombados e que estão regidos pelo Decreto-Lei nº 25 de 30 de novembro de 1937. Aqui aparecem registrados todos os bens patrimoniais da Região Litoral do Paraná segundo as formas de preservação desse patrimônio: registro, inventário ou tombamento.

Na classificação do IPHAN aparece diferenciados o Patrimônio Material e o Imaterial, assim como o arqueológico.

É importante destacar, pela sua fragilidade, dentro do **Patrimônio cultural o Imaterial ou Intangível**, e ter em conta que muitos elementos de Patrimônio cultural, histórico ou arqueológico (Patrimônio Material) têm uma parte de Patrimônio Imaterial ligada a eles. A UNESCO define este tipo de bens como:

O Patrimônio Cultural Imaterial ou Intangível compreende as expressões de vida e tradições que comunidades, grupos e indivíduos em todas as partes do mundo recebem de seus ancestrais e passam seus conhecimentos a seus descendentes.

Exemplos do patrimônio cultural da Região Litoral do Paraná; esquerda: Barreado, prato típico da região litorânea do Paraná (Imagem: Joel Rocha); direita: Fandango do Paraná, manifestação folclórica do Paraná.

Uma prova disso é o **Museu Vivo do Fandango**, inscrito em 2011 na lista de Melhores Práticas de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial da Humanidade, da Unesco. Esta iniciativa promove atividades para a salvaguarda do Fandango e este tipo de prática se baseia na cooperação pelo que pode ser aplicado a outros tipos de elementos patrimoniais.

Alguns dos elementos patrimoniais a ter em conta do Litoral do Paraná são:

Centro Histórico de Antonina (inclui o Complexo e arquitetura industrial de Matarazzo)	Patrimônio Material-Conjunto Histórico Tombado-IPHAN
Centro Histórico de Paranaguá	Patrimônio Material-Conjunto Histórico Tombado-IPHAN
Fandango Caiçara	Patrimônio Imaterial-IPHAN
O Caminho de Itupava e a sua área de influência.	Patrimônio arqueológico-IPHAN

Também serão consultados os seguintes listados:

- Bens culturais brasileiros inscritos na Lista do Patrimônio Mundial
- Lista do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 309

As informações coletadas serão organizadas numa base de dados digitalizada e analisada, identificando todos os aspetos a ser levados em conta na elaboração do Plano de Desenvolvimento Sustentável do Litoral do Paraná.

As instituições consultadas para a aquisição de informação relacionada com o Desenvolvimento Sustentável do litoral paranaense, sobre o patrimônio cultural, histórico e arqueológico, de forma preliminar são:

- Ministério de Cultura do Brasil
- Ministério de Turismo do Brasil
- Secretaria do Estado (áreas de Turismo, Patrimônio e Cultura)
- Programa de Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR Nacional
- IPHAN -Superintendência Estadual-Escritório Técnico de Paranaguá
- IPHAN- Superintendência Estadual-Escritório Técnico de Antonina
- Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular
- Centro Nacional de Arqueologia
- Governo do Estado de Paraná
- Órgãos municipais dos sete municípios envolvidos na área litoral do Paraná.
- Outras instituições, autoridades e entidades com competências legislativas e de gerenciamento sobre a área de interesse.
- Associações de comunidades relacionadas com a preservação e valorização do Patrimônio na área de interesse.
- Associação Brasileira de Cidades Históricas

b) O Meio Ambiental e Físico

Na coleta de dados sobre o meio ambiental e físico se prestará especial atenção à **biodiversidade de espécies ameaçadas**, bem como espécies bioindicadoras da qualidade ambiental.

Também será analisada, do ponto de vista físico, a **influência de áreas protegidas** na dinâmica costeira e as mudanças observadas. As caraterísticas da geologia, a geomorfologia, a dinâmica costeira, a topografia, o clima, a edafologia, a batimetria, o estado e a evolução da cobertura dos diferentes ecossistemas marinhos e litorais no tempo, etc.

Se tentará localizar e documentar os **fatores de fragmentação** presentes derivados da ocupação costeira e usos turísticos, agropecuários e industriais nas áreas costeiras, e aspectos vinculados à qualidade da paisagem.

A rede de **Áreas Protegidas da Região do Paraná** inclui: 3 Florestas Nacionais, 23 Parques Estaduais e 7 Parques Nacionais.

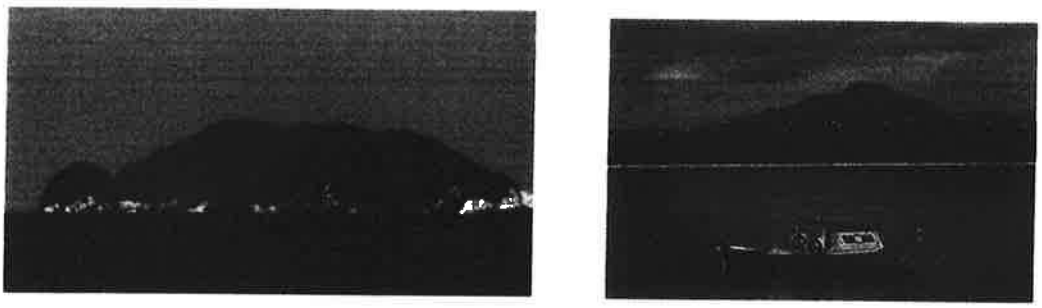

Parques Nacionais do Estado do Paraná. Esquerda: parque Nacional Marinho das Ilhas dos Currais; direita: Parque Nacional de Superagüi

Também se atenderá à **evolução das populações de espécies e recursos marinhos** que são fonte de sustento e meio de vida para as comunidades locais e as relações existentes entre a abundância dos recursos e a conservação dos ecossistemas costeiros e marinhos. Os dados serão obtidos fundamentalmente de fontes

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 310

secundárias e poderão ser determinados indiretamente pela presença de ambientes ou ecossistemas que sustentam os diferentes grupos faunísticos. Além disso, a informação poderá ser verificada e atualizada através de amostragens diretas concretas e limitadas às áreas menos estudadas ou documentadas, podendo realizar amostragens com sistemas de pesca de baixo impacto.

Fora destes grupos serão avaliadas a presença de **espécies emblemáticas** de todos os grupos faunísticos (mastofauna, anurofauna, herpetofauna, avifauna, etc), identificando as espécies presentes. Se atenderá especialmente as "espécies bandeira" que além do seu valor intrínseco têm um valor social, já que são capazes de estimular a sensibilização dos atores sociais com vistas à conservação.

Atender-se-á especificamente aos distintos tipos de **ecossistemas marinhos e costeiros**: manguezais, recifes, dunas, praias, ilhas, brejos, estuários e outros ambientes importantes do ponto de vista ecológico, as diferentes espécies de animais e vegetais presentes, e recursos naturais importantes ligados à sua conservação.

Prestar-se-á especial atenção aos aspectos ou critérios de referência a seguir:

- Realizar e sistematizar **inventários de biodiversidade** de flora e fauna que permitam ser atualizados no futuro e georeferenciados quando possível.
- Identificar o **estado de conservação atual** das espécies e ecossistemas mais relevantes.
- Documentar a existência de **espécies ameaçadas, raras, singulares, endemismos e espécies exóticas potencialmente invasoras.**
- Complementar os inventários, **incluindo fotografias** e o nome popular das espécies.
- Descrever e **caracterizar os ecossistemas costeiros** presentes na área de abrangência e identificar **as principais ameaças** para a sua conservação e os câmbios observados nos últimos anos, se for o caso.
- Documentar os aspectos relativos à biodiversidade e estado de conservação das **áreas protegidas existentes na faixa costeira** e a sua influência nas áreas adjacentes.
- Identificar os **corredores ecológicos e potenciais áreas de expansão da proteção** como áreas de amortecimento que sustentam os serviços dos ecossistemas e melhoram a conectividade do território.

Figura 4.1.6.3.A:Funcionalidade dos corredores ecológicos e áreas de amortecimento.
Fonte: USDA

c) As Infraestruturas

A coleta e análise de informação sobre as infraestruturas compreende a identificação e contextualização da **infraestrutura logística e de mobilidade** na região costeira do Paraná, incluindo: as infraestruturas de ferrovias, portos, aeroportos, rodovias, etc.), a **infraestrutura urbana** (saneamento, energia, equipamentos, serviços públicos, etc.), as áreas de risco, a proteção ambiental com relação ao impacto das infraestruturas, a proteção ambiental, social e urbanística).

A contextualização das infraestruturas visará especificamente a **identificação das demandas e necessidades de novas infraestruturas que garantam a conectividade e fomentem o equilíbrio territorial**. Especialmente analisar-se-ão as necessidades de infraestruturas para a melhora da movimentação das cargas, a

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 311

comercialização de produtos (importações e exportações) e o estado de conservação e melhoras necessárias das vias, ferrovias, portos, aeroportos, rotas logísticas, mobilidade urbana e modernização e sustentabilidade do transporte e a integração com as novas tecnologias. A análise incluirá a identificação de oportunidades de cooperação público-privada para a modernização das infraestruturas e a aplicação das novas tecnologias para a optimização dos transportes e da mobilidade (*smart cities*).

A determinação das necessidades de infraestruturas terá em conta as previsões de crescimento demográfico e cenários futuros de risco e aumento da vulnerabilidade e necessidades de resposta ante emergências.

d) O Meio Socioeconômico

Serão compilados dados relativos à **dinâmica socioeconômica** abrangendo os usos do solo e dos recursos naturais costeiros, a identificação de conflitos de uso e tipos de atividades desenvolvidas (turismo, petroquímica, pesca, atividade agropecuária, transportes marítimos e infraestruturas ligadas, desenvolvimento urbano, etc.).

Entre os diferentes aspectos relativos ao meio socioeconômico, serão identificadas e analisadas todas as **atividades e usos de tipo humano e industrial mais relevantes** para a conservação dos municípios da área costeira do Paraná. Entre outras atividades serão analisados os usos da terra na faixa costeira, as atividades agropecuárias, a ocupação do solo, a urbanização, e a atividade industrial. Na parte marinha serão especialmente relevantes as atividades pesqueiras, o turismo aquático e a atividade dos estaleiros.

Outros aspectos a documentar e avaliar incluirão dados relativos as populações e a evolução (crescimento) da população na costa, padrões de distribuição e densidade, etc.

Além disso serão analisados os **conflitos existentes com a conservação** e o uso do solo e dos recursos marinho-costeiros e o estado da fiscalização e seu cumprimento, determinando as ameaças existentes de tipo socioeconômico para o logro dos objetivos do Plano de Desenvolvimento Sustentável.

Esta análise será realizada fundamentalmente por **via documental e bibliográfica**, empregando bases de dados e relatórios dos organismos oficiais, que poderão ser **complementadas com entrevistas** nas instituições, entidades locais, proprietários das terras e trabalhadores vinculados ao uso dos recursos naturais na área costeira e outras atividades de interesse. Serão detectadas as principais preocupações, carências de informação e necessidades de gestão.

As entrevistas permitem conhecer as problemáticas e os conflitos existentes de primeira mão, e recolher propostas de melhora. As consultas públicas servirão ainda para ter uma informação mais precisa e completa. Com um todo, a realização de entrevistas é custosa em termos de tempo e econômicos, pelo qual estas serão restringidas a áreas e aspectos sobre os quais existe pouca informação ou a existente esteja muito desatualizada.

Na coleta de dados sobre o meio antrópico atendera-se os seguintes aspectos:

- Registro de usos e **atividades econômicas** e análise das relações com a conservação e os recursos naturais costeiros.
- Levantamento de dados sobre os **valores patrimoniais e culturais** importantes para a conservação e a relação existente entre o património natural e cultural.
- Os dados serão referidos aos 7 **municípios da região do Litoral Paranaense**, que definem a faixa costeira do estado, e a sua área de influência.
- Identificação e registro de dados sobre a **organização institucional** e a presença de associações sociais, com a presença de lideranças, movimentos comunitários, organizações de trabalhadores e outros de interesse.
- Documentação da influência **da questão de gênero**, o papel das mulheres nas atividades desenvolvidas na área costeira e as oportunidades para o envolvimento da mulher na conservação e no desenvolvimento sustentável.
- **Conhecimento local sobre a conservação e os recursos naturais** e as percepções sobre as áreas protegidas e as medidas levadas a cabo para a regulação dos usos atualmente existentes.

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 312

e) O Meio Institucional

Serão compilados dados relativos à **dinâmica socioeconômica** abrangendo os usos do solo e dos recursos naturais

A coleta de dados e documentação sobre os aspectos mencionados será completada com a consulta à bases de dados legais, incluindo uma pesquisa legal relativa ao gerenciamento costeiro a nível municipal, estadual e nacional, identificando os planos, programas e projetos que se encontram em execução e os previstos, ligados ao litoral paranaense.

Serão revisados, entre outros, os seguintes **instrumentos de planejamento**:

- Planos Regionais de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Paraná (PRDE).
- Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima (Projeto Orla) dos municípios balneários, Ministério de Meio Ambiente (MMA).
- Projeto básico integrado de micro drenagem, macro drenagem e controle da erosão marinha (2007).
- Planos Locais de Desenvolvimento da Maricultura, do Ministério de Pesca (2010)
- Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável do Polo Turístico do Litoral do Paraná (2010).
- Estudos de Impacto Ambiental (EIA) dos diferentes empreendimentos instalados na região (2011)
- Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do porto de Paranaguá (PDZPO) (2012).
- Resultados do Grupo de Trabalho para o Decreto 2647/2011 sobre o Plano de Desenvolvimento Sustentável do Litoral do Paraná (2012)
- Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) do Litoral do Paraná (2013)
- Projetos Contra Risco e Desastres Naturais do Litoral do Paraná (2013) para o cumprimento do duto OLAPA, do Ministério Público Federal e Estadual, bem como os Projetos e Medidas sócios ambientais no Litoral do Parará enviados pelos Municípios e pelo Estado.
- Projeto Executivo de Proteção da Orla de Matinhos (2013)
- Política Nacional para os Recursos do Mar (PNRM)
- Avaliações Ambientais Integrada e Estratégica da Bacia Litorânea.
- Zona Costeira do Paraná, Zoneamento Marinho do Paraná, dentro da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA II)
- Plano Setorial Nacional para os Recursos do Mar (PSRM), 2012-2015.
- Plano Hidroviário Estadual
- Plano de Ação Federal (PAF) para a zona Costeira, 2004

Estas informações serão complementadas com a investigação da **base legal relativa ao gerenciamento costeiro** aos níveis estadual e municipal, identificando os planos, programas e projetos que se encontram em execução e previstos pelo Estado, ligados à zona costeira.Serão revisados, entre outros, os instrumentos legais mencionados no item 4.5 do Marco Legal, dos TDR do projeto.

Cabe verificar, ademais, as lições aprendidas (positivas ou negativas) em relação aos processos decorrentes das práticas identificadas através do levantamento de informações, visando à observação dos motivos que porventura tenham provocado o não aproveitamento de oportunidades e outros que ensejaram iniciativas de sucesso. Tais aprendizados decorrentes das práticas identificadas podem referir-se a aspectos tais como:

I. Resultados obtidos, em termos de contribuição com objetivos ou estratégias de desenvolvimento turístico no destino;

II. Processos relacionados às instituições e atores locais, em termos de nível de participação, comunicação entre instituições e atores locais, e fortalecimento institucional;

III. Aspectos de âmbito operacional, conforme a viabilidade, rentabilidade, transparência em critérios de atuação, retroalimentação, etc.

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 313

Coleta de dados primários

A coleta de dados primários consiste na recopilação de diversos tipos de dados originais das variáveis de interesse sócio territoriais, ambientais, econômicas e institucionais relativas à região costeira do Paraná, mediante técnicas de amostragem diretas realizadas no terreno. Para a recopilação de dados primários serão empregadas diferentes técnicas, entre as quais se incluem as seguintes:

TÉCNICA DE COLETA DE DADOS	DESCRIÇÃO
CARTOGRAFIA DIRETA	Registro espacial das caraterísticas visíveis do terreno e da paisagem, normalmente codificadas e georeferenciadas mediante o uso do GPS.
FOTOGRAFIAS	Captura de imagens sobre o terreno ou aéreas, com objeto de ilustrar aspectos concretos do ambiente natural e humano da área de interesse.
CROQUIS DO TERRENO	Desenhos realizados manualmente ou digitalmente, que permitem anotar e ilustrar características concretas de determinadas zonas.
MEDIÇÕES	Integram o registro de dados numéricos medidos em distintas escalas graduadas utilizando diferentes instrumentos de medida segundo o tipo de dados, para obter dimensões espaciais para a elaboração de planos de detalhe, cartografado, e outras utilidades.
ENTREVISTAS E CONSULTAS	Normalmente utilizadas para a pesquisa e coleta de dados de tipo socioeconômico, as entrevistas podem ser efetuadas total ou parcialmente a distância através do telefone, o Skype, o e-mail e outros meios com os atores e membros da sociedade civil afetados ou envolvidos na realização de atividades ligadas ao meio costeiro bem como ao planejamento dos recursos costeiros e marinhos na área de interesse.
QUESTIONÁRIOS	Especialmente úteis para a coleta de dados de tipo socioeconômico, os questionários podem integrar diferentes técnicas, pudendo realizar-se verbalmente de forma direta ou por correio e e-mail.

Para a maioria das técnicas mencionadas existem diversos **protocolos técnicos** amplamente aceitos e desenvolvidos pela comunidade científica no âmbito das pesquisas e o trabalho técnico no âmbito do meio ambiente. Estas técnicas serão empregadas como referência para realizar a coleta de dados primários, naqueles casos em que se estime necessário. Para a seleção de protocolos de coleta de dados a nossa equipe levará em conta as necessidades da consultoria e a disponibilidade de recursos, de forma a escolher os métodos mais atualizados e efetivos em relação ao tempo, custo e qualidade dos dados obtidos.

Os dados obtidos mediante técnicas de amostragem direta têm um alto nível de precisão. Não obstante, a maior parte destas técnicas são dispendiosas em termos de tempo e custos, e exigem uma preparação importante para que as metas estejam claras e a equipe disponível para cumprir o calendário de atividades previsto, é por isso que a coleta de dados primários focará em **localizações muito concretas** para dar resposta às **carências**

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 314

detectadas na análise das informações secundarias realizadas na atividade anterior e quando não se disponha de outros dados melhores que já tenham sido coletados e tratados (dados secundários).

Coleta de dados geográficos

A elaboração do PDS_LITORAL tem uma **dimensão espacial.** A estruturação da BDE inicia-se com a seleção dos dados espaciais que serão representados nos documentos cartográficos e descritivos dos cinco RVS.

Os dados selecionados devem ser compatibilizados mediante o uso de ferramentas SIG, empregando o Sistema de Referência Geocêntrico para a América do Sul (SIRGAS 2000) em projeção cartográfica pelo sistema de UTM (Universal Transversa de Mercator). Entre os organismos que se consultará para o levantamento de informação geográfica encontram-se:

- Instituto Ambiental do Paraná (IAP)
- Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado de Paraná.
- Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA)
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
- Comissão Nacional de Cartografia (CONCAR).
- Infraestrutura de Dados Espaciais do Brasil (INDE).
- Ministério de Meio Ambiente do Brasil (MMA).
- Ministério de Pesca e Aquicultura (MPA)
- Registro Geral da Atividade Pesqueira no Brasil (RGP)
- Serviço Geológico do Brasil (CPRM).
- Sistema de Observação e Monitoramento da Agricultura no Brasil (SOMABRASIL-EMBRAPA)
- Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (INPE).
- Sistema Ibero-americano de informação sobre o Água (SIAGUA)
- Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS2000).

ELABORAÇAO DE MAPAS GEORREFERENCIADOS

As informações do diagnóstico serão vinculadas à contextualização das diferentes regiões e áreas que constituem a faixa litoral de abrangência do projeto, a fim de determinar áreas de características ambientais e socioeconômicas relativamente homogêneas e propor um zoneamento para a implementação de ações e medidas que permitam o logro dos objetivos propostos.

Os mapeamentos dos dados levantados serão analisados espaço-temporalmente, para que seja possível a compreensão cronológica das dinâmicas observadas. Todas as informações e documentos colhidos para a análise e compreensão de condições peculiares à região estudada serão integrados em uma base de dados e em plataforma tecnológica integrada, mapeada e georreferenciada, permitindo o geoprocessamento das informações, o melhor conhecimento e gestão inteligente do território, com a colaboração de todas as secretarias e instituições envolvidas, tendo em vista o princípio da eficiência e a maximização da utilização das informações colhidas.

Para tanto, o Consórcio criará uma base de dados estatísticos, com indicadores-chave e tendências básicas, a partir das informações quantitativas disponíveis em uma plataforma SIG compatível com os sistemas de comunicação existentes nas áreas prioritárias do Projeto. O SIG facilitará a análise urbana e de geração de viagens por zonas, a representação das matrizes de mobilidade urbana interna e externa do município por tipologia (relaciona origem/destino da mobilidade por motivos: trabalho ou estudos), cálculo de indicadores de acessibilidade e de oferta de transporte, indicadores de sustentável, etc.

O próprio SIG permite apresentar as informações por zonas, mediante consultas espaciais de interseção e agregação e obter resultados sobre mapas temáticos em escala adequada para a demonstração da informação gradativa ano a ano, visando avaliar as dinâmicas municipais existentes no território sob um enfoque espaço-temporal.

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 315

Figura 4.1.6.3.B: Exemplo de mapas em sistemas SIG elaborados pelas empresas do Consórcio no marco da elaboração de projetos de planejamento e inventários territoriais.

ELABORAÇAO DO DIAGNOSTICO E MATRIZ FOFA

A equipe consultora reunirá todas as informações, na escala estadual e municipal, sobre as características físico-naturais e socioeconômicas da zona costeira, com a finalidade de orientar ações de preservação, conservação, regulamentação e fiscalização, se for o caso, a incluir no Plano de Desenvolvimento Sustentável do Paraná.

O diagnóstico conterá uma matriz de interrelação das contextualizações por âmbitos de analise realizadas, apontando os pontos fortes e fracos, oportunidades e desafios. Portanto, o diagnóstico destacará as **vulnerabilidades ambientais e sociais** que influenciam na conservação da biodiversidade e ameaçam os bens de uso comum das comunidades locais, o acesso aos serviços básicos e a exposição da população aos contaminantes ambientais e às mudanças climáticas e demográficas projetadas. Estas informações serão combinadas de forma a gerarem os cenários futuros, seguindo a metodologia detalhada no ponto seguinte.
Como complemento e resumo do processo de diagnóstico, a nossa equipe propõe a elaboração de uma **matriz FOFA** para a identificação de **Potencialidades e Vulnerabilidades** da área costeira de abrangência.

A matriz FOFA é uma **ferramenta analítica** que permitirá identificar de maneira estruturada os diversos fatores que interagem entre si no espaço e que, por isso, são capazes de indicar as necessidades mais urgentes de gestão, baseadas em situações de ameaças ao bom estado ambiental das regiões que integram o Polo Costa dos Coqueirais, bem como o bom estado de desenvolvimento e qualidade de vida das comunidades locais e as perspectivas de desenvolvimento sustentável futuro. Assim, a Matriz FOFA colocará em relevância as potencialidades para, através do desenho e implementação de ações estratégicas de gerenciamento, contribuir para um equilíbrio ecológico e social no desenvolvimento futuro do Litoral Paranaense.

As potencialidades estarão definidas pelas **Forças (intrínsecas)** e as **Oportunidades (externas)** identificadas, enquanto que as vulnerabilidades são definidas pelas **Fraquezas (intrínsecas)** e as **Ameaças (externas).** Este cenário apoiará a definição das ações a serem contempladas no Plano de Gerenciamento e reforçadas mediante o Projeto de Lei, que que estarão orientadas a:

- Potenciar as forças.
- Reduzir as fraquezas.
- Aumentar as oportunidades.
- Minimizar ou cancelar as ameaças.

O diagrama a seguir sintetiza os quatro componentes da análise FOFA:

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 316

Figura 4.1.6.3.C: Exemplo sintético de matriz FOFA para projeto de conservação

A seguir é apresentado um **exemplo de matriz FOFA** realizada pela nossa equipe para outro projeto de planificação em unidades de conservação marino-costeiras de âmbito municipal:

AMEAÇAS	OPORTUNIDADES
• *Projetos programados no entorno dos UCs.* • *Trilhas com influência negativa às UCs.* • *O favorecimento de grupos de interesse em detrimento dos valores-chave de conservação.* • *Atrasos ou cancelamentos de recursos para a conservação.* • *A burocracia em diferentes esferas governamentais.* • *Pequena participação de INGs e outras entidades estratégicas.* • *O crescimento urbano desordenado e acelerado.* • *A poluição e interferências como canalização e retificação dos recursos hídricos.* • *A ausência de mão de obra qualificada para serviços de recuperação ambiental.*	• *Aportes de novos recursos para o gerenciamento das UCs municipais.* • *Diálogo sistemático entre as instituições.* • *Comunicação mais efetiva dos resultados das ações governamentais atraindo parceiros para a conservação.* • *Sociedade mobilizada a partir de ações de educação ambiental.* • *Políticas públicas aplicadas para diminuir vetores de pressão.* • *Existência de áreas de reflorestamento como limitadores da expansão urbana sobre as UCs.* • *Estratégias de pagamento por serviços ambientais.* • *Criação de novos corredores verdes.* • *Turismo sustentável.*

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 317

FORÇAS	FRAQUEZAS
• *Investimento público para a conservação ambiental.* • *Investimento público para a recuperação ambiental.* • *Existência de áreas recuperadas.* • *Autonomia das instituições.* • *Elaboração técnica das políticas de conservação e recuperação ambiental.* • *Interação e colaboração entre Secretarias.* • *Interação entre os órgãos ambientais.* • *Divulgação das Unidades de Conservação.* • *Existência de Sistemas de Informação Geográfica e banco de dados consistente.*	• *Baixa eficiência das UCs municipais à proteção do ecossistema de Mata Atlântica.* • *Pequenos remanescentes florestais desconsiderados nas categorias de UCs.* • *Capacitação técnica e administrativa de funcionários inadequada para a gestão das UCs.* • *Legislação insuficiente para o bom funcionamento e proteção das UCs.* • *Falta de atualizações nas legislações sobre espécies ameaçadas.* • *Sobreposição de instituições na tomada de decisões.* • *Ausência de programas de controle de incêndios.* • *Baixa efetividade da educação ambiental.* • *Pouca integração dos projetos de conservação e recuperação ambiental ao licenciamento.*

BENCHMARKING DE BOAS PRATICAS INTERNACIONAIS

O estudo do *benchmarking* pretende comparar os resultados obtidos no diagnóstico anterior com as melhores práticas nacionais e internacionais - tendo sempre como referência a América Latina - na área de planejamento regional sustentável. Para isso, serão considerados especialmente as **estratégias e lições aprendidas** nos seguintes âmbitos do desenvolvimento litoral e regional:

- O desenvolvimento de formas alternativas de **turismo sustentável**, como o ecoturismo.
- A harmonização de aplicações industriais e de infraestrutura, com a **conservação dos serviços dos ecossistemas**.
- A promoção de atividades alternativas que geram **múltiplos benefícios** para as comunidades locais.
- A **correção dos desequilíbrios territoriais** entre as zonas costeiras de alta carga turística e zonas costeiras da área de influência do caráter rural.
- A **igualdade de gênero** em todos os âmbitos de atividade.
- A **inclusão das populações locais** nos órgãos de tomada de decisão e de formação e instituições envolvidas na gestão dos recursos costeiros.
- A detecção precoce de **riscos e impactos**.
- Promoção do turismo e **marketing orientado à valorização** dos recursos naturais e culturais.

A nossa equipe elaborará uma análise abrangente das informações encontradas, projetando **fichas de resumo de boas práticas e estratégias** bem-sucedidas no planejamento do desenvolvimento sustentável aplicadas em diferentes países, estados ou regiões, com foco nos benefícios de abordagens alternativas para recomendar a adoção de novos instrumentos, ferramentas, plataformas e metodologias. As fichas especificarão, pelo menos, as seguintes informações:

- País ou região em que se aplica.
- Setor ou âmbito do desenvolvimento ao que aplica.
- Público objetivo da prática ou estratégia.
- Entidade, agente ou agência responsável pela sua implementação.
- Descrição e aplicabilidade no contexto do Paraná.

Como resultado do diagnóstico atualizado, a nossa equipe identificará as **prioridades de ação** que deverão ser contempladas no Plano de Desenvolvimento Sustentável do Litoral do Paraná, considerando as tendências

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 318

observadas na expansão urbana, no crescimento do uso e disfrute dos recursos naturais (pesca, aquicultura, refinarias, turismo, etc.). Serão definidos os principais **vetores de risco** aos que fará frente o Estado nos próximos anos e que servirão para orientar as *linhas de ações prioritárias* do PDS_LITORAL previstas na etapa seguinte.

A seguir apresentamos a proposta de conteúdos gerais para o Relatório do Diagnóstico:

1. **INTRODUÇÃO**
2. **ANTECEDENTES E ÂMBITO GEOGRÁFICO**
3. **CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA LITORAL**
   - 3.1. Caracterização do meio físico e da paisagem
   - 3.2. Caracterização do meio biótico
     - *3.2.1. Meio terrestre e litoral*
     - *3.2.2. Meio marinho*
   - 3.3. Caracterização do meio antrópico (usos e ocupação do solo, caracterização socioeconômica e das populações)
   - 3.4. Políticas, planos e programas de relevância
4. **DIAGNÓSTICO DO ESTADO DA ÁREA LITORAL**
   - 4.1. Identificação de problemáticas e inter-relações entre fatores
   - 4.2. Identificação de oportunidades
   - 4.3. Prioridades de ação
   - 4.4. Estado de conservação dos valores naturais e culturais
   - 4.5. Previsões e tendências
   - 4.6. Conclusões do diagnóstico
   - 4.7. Análise FOFA e matriz
5. **DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES DE DESENVOLVIMENTO**
   - 5.1. Benchmarking e análise de boas práticas internacionais
   - 5.2. Detecção de pontos de melhora
   - 5.3. Definição das prioridades de ação
6. **CARTOGRAFÍA E ANEXOS**

O Relatório de Contextualização será apresentado na **Reunião Técnica 02** com a Equipe Técnica Intersecretarial – ETI para obtenção do Relatório de Contextualização Inicial (R.C.I) que deverá ser validado e aprovado nas Oficinas Locais e Audiência Pública como detalhado adiante.

As oficinas e reuniões técnicas serão organizadas seguindo a metodologia detalhada na seção correspondente à Comunicação e Audiências Públicas. Segue um exemplo de **matriz de coleta de contribuições públicas** para a elaboração de Planos de Gerenciamento de Áreas Protegidas Terrestres e Marinho-Costeiras nas Ilhas Baleares (Espanha) elaborada pela equipe consultora.

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 319

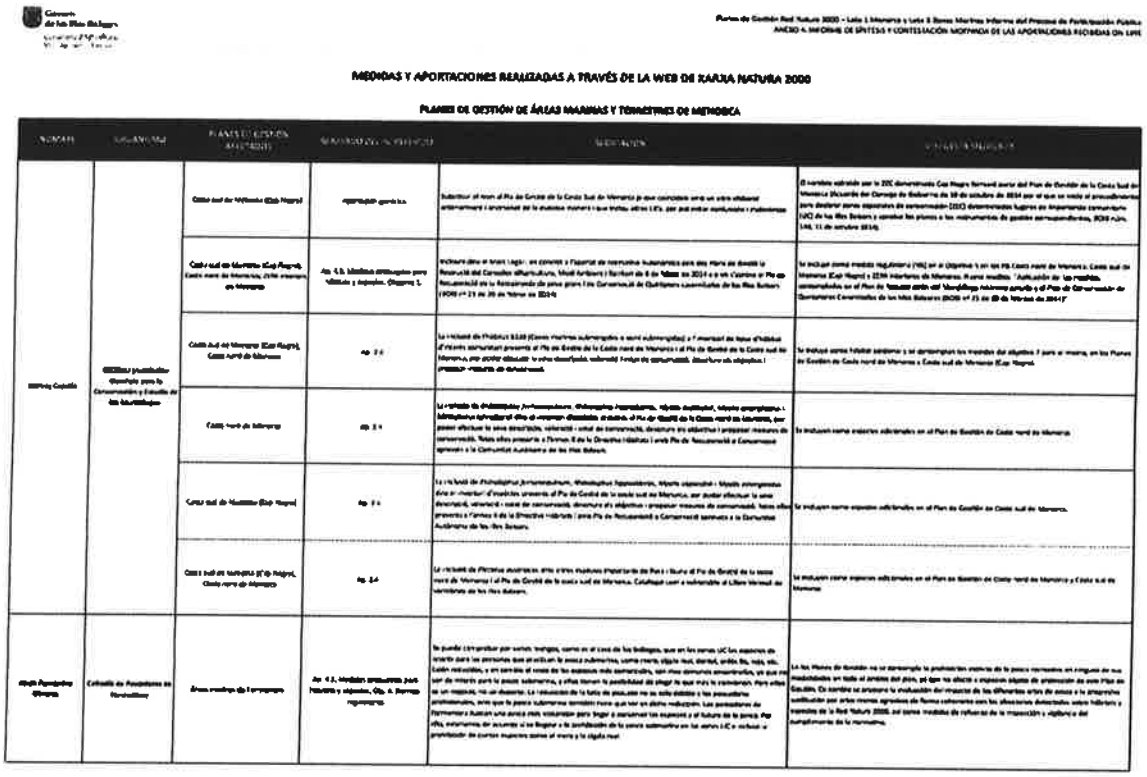

Exemplo de base de dados de registro de contribuições dos atores locais e respostas motivadas, para projeto de elaboração de Planos de Gerenciamento de Áreas Protegidas na Reserva da Biosfera de Menorca (Espanha), elaborado pela equipe consultora.

4.1.6.4 Criação de cenários e visão de futuro

O desenvolvimento de cenários auxilia na adoção de uma visão de longo prazo, em um mundo onde a incerteza é constante. Assim, o Planejamento por Cenários tem por propósito auxiliar os gestores na mudança de sua visão em relação à realidade. A intenção é combinar a visão da realidade atual com a realidade futura, buscando dessa síntese um conjunto de ações robustas tanto hoje e que tenham repercussões no futuro.

Cabe aqui a técnica dos cenários como visões parciais do futuro, facilitando pensar na limitação das circunstâncias que podem vir a surgir, atendendo a figura apresentada a seguir:

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 320

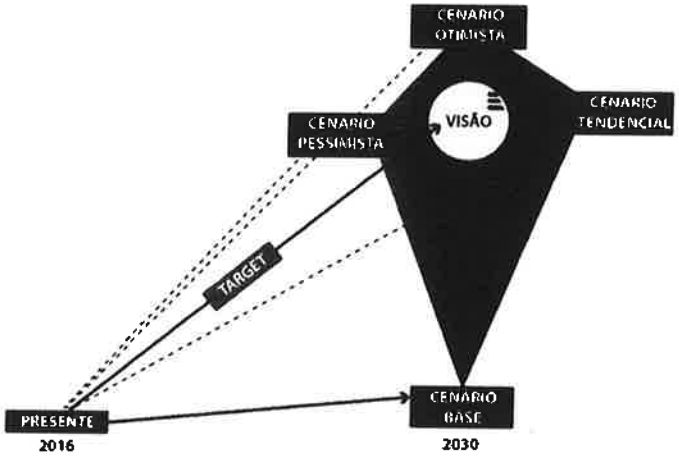

Figura 4.1.6.4.A: Diagrama representando o processo de definição de potenciais cenários e normativos baseado no estudo "Europa 2050 (www.et2050.eu) (Comissão Europeia, MCRIT, 2016)

Portanto, com base na análise das informações coletadas na etapa anterior, a equipe elaborará os documentos de síntese dos dados e tendências, cenários e visões de futuro que permitam coordenar os debates públicos previstos nesta etapa, estabelecendo um processo de reflexão estratégica local/regional e a avaliação rigorosa das linhas de ação que serão estabelecidas na etapa seguinte.

O Consórcio adotará o uso da tecnologia na criação dos modelos de previsão, permitindo a posterior avaliação dos cenários para apresentação dos resultados nas Oficinas Locais e Audiências Públicas. Os modelos de previsão informatizados não substituem o conhecimento que procede da experiência, mas são indispensáveis como ferramentas de apoio que contribuem objetividade e rigor científico na análise de problemas e soluções.

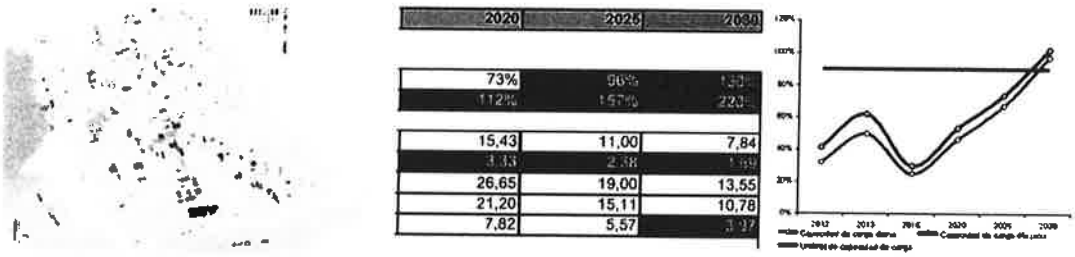

Figura 4.1.6.4.B: Exemplo de modelos de previsão desenvolvidos pelo Consórcio no marco de outros projetos. Fonte: MCRIT/BBG – Desenho e implantação do sistema de capacidade de carga turística na Cidade Colonial de Santo Domingo, República Dominicana.

O "exercício de visão" deverá se concentrar na identificação do cenário geral desejado e os resultados/objetivos para cada uma das áreas principais incluídas no plano, e políticas e estratégias mais amplas para alcançar esses resultados/objetivos no horizonte de 2035. A visão constitui as ideias e necessidades dos demandantes locais e se formula sobre a base do diagnóstico e prognóstico realizado nas etapas anteriores, sobre o que posteriormente se apresentarão as metas e estratégias de desenvolvimento e o plano de ação.

ESTABELECIMENTO DE OBJETIVOS E METAS

A fase seguinte do planejamento estratégico refere-se ao tratamento dos instrumentos prescritivos que explicitarão os desafios a serem enfrentados, assim como os objetivos e as metas que se pretende alcançar,

momento em que devem ser, ainda, definidas as estratégias e as políticas funcionais, bem como os projetos e os planos de ação necessários. Os objetivos são os resultados, os alvos, os focos a serem alcançados, e as metas são os objetivos quantificados (tempo, quantidade, outros).

DEFINIÇAO DOS EIXOS ESTRATÉGICOS

A definição dos eixos estratégicos norteará a construção do plano para formulação de diversos cenários prospectivos desejáveis, alternando as prioridades de cada dimensão analisada. Para tanto, será aplicado a metodologia do pensamento sistémico e do Design Thinking como princípios orientadores do Plano.
Os cenários proporcionam subsídios para lidar com a incerteza, através da visualização de múltiplos futuros. O pensamento sistêmico fornece subsídios para lidar com a complexidade dinâmica, trazendo à tona às relações entre as variáveis e demonstrando seu comportamento do passado até o presente. Juntos, geram uma visão do passado, presente e do futuro, complementando-se para prover aos tomadores de decisão, uma plataforma para a comunicação, um veículo para a aprendizagem, questionamento dos modelos mentais e uma visão compartilhada do assunto em questão, ou seja, uma ferramenta para lidar com a complexidade dinâmica.

Finalmente, a metodologia do Design Thinking (DT) proposta visa perceber e utilizar o design thinking como ferramenta na identificação dos desafios a serem superados pela região do Litoral do Paraná, no entendimento dos sentimentos e preocupações dos indivíduos que se relacionam com a região (moram, frequentam, visitam) e na busca por soluções colaborativas.

Para tanto, o consórcio acompanhará um processo de consulta visando ao planejamento participativo do PDS_LITORAL a partir da metodologia de Avaliação Multicritério. Esta metodologia é uma técnica de análise para planejamento que se baseia no princípio de que, para a tomada de decisão, a experiência e o conhecimento das pessoas é tão valioso quanto os dados utilizados. A análise multicritério permitirá, através do debate, hierarquizar os resultados do diagnostico, as diretrizes e os projetos a serem incluídos no PDS_LITORAL como apresentado na figura a seguir:

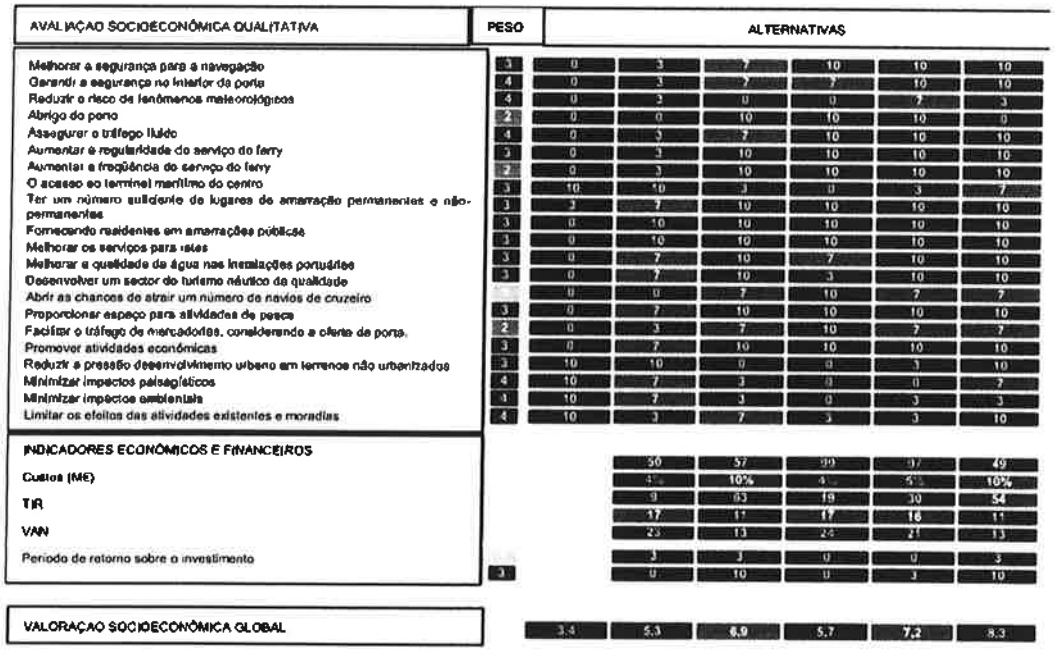

Figura 4.2.2.4.C:Exemplo de tabela de avaliação multicritério. Fonte: Elaboração própria, no marco do Estudo de Avaliação do Porto de Ciutadella em Menorca (Ilhas Baleares, Espanha).

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 322

Os critérios são apresentados na primeira coluna e incluem questões de segurança (5 indicadores), eficiência (12 indicadores), qualidade urbana e ambiental (4 indicadores) e financeiros (2 indicadores). Os pesos relativos dos indicadores são estabelecidos de comum acordo com os participantes nas Audiências Públicas. As avaliações parciais de cada projeto alternativo para 23 indicadores são normalizadas de 0 a 10 em alguns casos, de valores quantitativos anteriores e em outros casos com base na opinião de especialistas.

4.1.6.5 Elaboração do Plano de Ação

O passo das reflexões às propostas de intervenção específicas no curto prazo é uma condição essencial para o sucesso do PDS_LITORAL. Para a elaboração das estratégias de ação, com base na caracterização da área costeira e na **identificação de potencialidades e vulnerabilidades** realizadas durante a fase de contextualização, e de acordo com as diretrizes dos diversos **projetos, planos e programas desenvolvidos na região**, serão identificados os objetivos e metas de desenvolvimento sustentável do Paraná, **atendendo ao seu zoneamento e segundo as prioridades estabelecidas.** As atividades previstas são indicadas na figura a seguir:

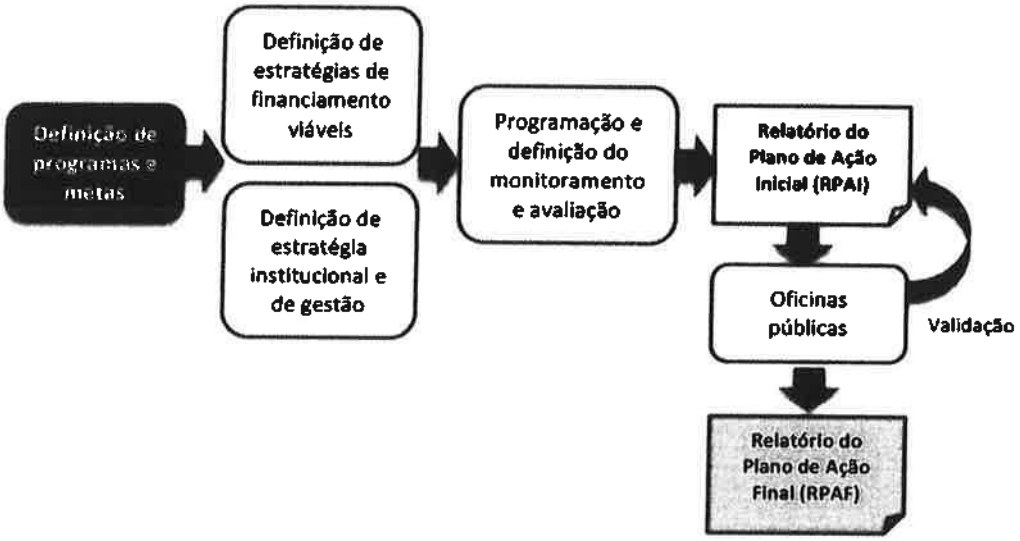

As ações estratégicas contempladas no Plano de Desenvolvimento do Litoral estarão vinculadas à **delimitação de zonas funcionais** que permitirão o ordenamento territorial do planejamento e da gestão, e orientar, distribuir e regular os usos e as atividades com base nos valores e usos atuais descritos no componente de Contextualização e na construção dos Cenários futuros. O zoneamento incluirá como mínimo, a distinção entre as seguintes **áreas funcionais**, de acordo com os TDR:

- **Zonas funcionais** (existentes e propostas) necessárias para acomodar o crescimento demográfico e econômico projetado pela análise de Cenários Futuros: áreas urbanas, industriais/logísticas, turísticas, de uso público, de preservação natural, de educação ambiental, de esporte e segurança e áreas reguladas.
- **Zonas ambientais ou ecológicas** (existentes e propostas), tais como parques naturais, reservas ambientais, reservas marinhas, florestas, áreas agrícolas, de aquicultura, áreas úmidas, áreas de ecossistemas importantes para as espécies ameaçadas, etc.

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 323

- **Áreas vulneráveis às mudanças climáticas**, segundo os cenários futuros planejados (existentes e futuros) incluindo áreas de risco de inundação ou deslizamento, e outros riscos naturais, os sistemas de regulação e salvaguarda, bem como áreas destinadas à implementação de ações de mitigação e adaptação as mudanças climáticas.
- **Zonas históricas, culturais e arqueológicas** (existentes e propostas) destinadas à preservação e salvaguarda de valores culturais e patrimoniais e à implementação de estratégias de valorização.
- **Zonas de importância para a melhora da conectividade e sustentabilidade da rede de transporte** (existentes e futuras) para a implementação de instrumentos regulatórios para garantir a comunicação e articulação da área litorânea a longo prazo mitigando ou evitando os impactos ambientais e compensando aqueles que não seja possível evitar.
- **Zonas destinadas ao investimento em infraestruturas chave**, nas que se localizarão as infraestruturas que precisam de investimentos para a melhora e a implantação de sistemas de drenagem, tratamento de efluentes, coleta de aguas, tratamento e distribuição, descarte de resíduos sólidos, logística, telecomunicação, saúde, segurança, linhas de energia e outros.
- **Zonas marginais** de baixa renda que precisam de ações de compensação, melhoria dos serviços básicos e investimento para equilibrar as desigualdades.
- **Zonas municipais** que deverão ser tratadas do ponto de vista das suas particularidades ligadas às características do município, no que diz respeito à implementação de áreas verdes, serviços púbicos, mobilidade e conservação.
- **Zonas de conservação e aumento da conectividade (corredores ecológicos)**, áreas de amortecimento que permitem assegurar a proteção de áreas naturais de alto valor, proporcionando maior conectividade, aumentando a resiliência, reduzindo o "efeito borde" e contribuindo para a comunicação e riqueza paisagística.
- **Outras zonas** ou iniciativas localizadas em pontos concretos.

Assim, o zoneamento visa alcançar os seguintes objetivos:

- **Proteger** os habitats, ecossistemas, espécies e processos de interesse particular para o desenvolvimento sustentável da área costeira.
- **Separar e ordenar** os usos e atividades humanas no espaço de forma a reduzir as ameaças para a conservação de valores chave e garantir a compatibilidade dos usos com a conservação.
- **Regular e potenciar** as atividades humanas que põem em valor os recursos naturais e culturais ligados à área costeira.
- **Garantir o sucesso** das ações e medidas contempladas no Plano de Gerenciamento melhorando a qualidade de vida das comunidades locais e gerando oportunidades de crescimento e desenvolvimento baseadas na conservação.

A definição de programas e propostas de ação atenderá os objetivos e metas estabelecidos na etapa anterior, fundamentados em uma série de **princípios**, dos quais detalhamos na continuação os aspectos fundamentais a considerar:

1. A **proteção dos ecossistemas** de forma a garantir as funções ecológicas, a proteção da diversidade biológica e uso dos recursos conforme a sua capacidade de suporte.
2. A **melhora das condições de vida** das populações costeiras, estimulando os usos tradicionais sustentáveis.
3. A **integração da Zona Costeira com as demais regiões** que a influenciam ou que são influenciadas por ela.

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 324

4. O **reforço das capacidades institucionais a nível municipal**, tendo em consideração as competências que afetam as questões de maior interesse para os Municípios.
5. A **regulação das atividades com vistas a minimizar o impacto** sobre a Zona Costeira e os ecossistemas de alto valor.
6. A **recuperação ambiental com critérios ecológicos**, das áreas degradadas, adequando o desenho das atuações às diretrizes estabelecidas no zoneamento.

As ações propostas devem ser agrupadas nos eixos de intervenção estabelecidos, preparando-se uma descrição do seu conjunto, com as seguintes indicações:

a) Descrição do produto;
b) Objetivo;
c) Justificativa;
d) Descrição da ação;
e) Prazo de execução estimado (ou previsão de continuidade);
f) Previsão de custos;
g) Análise legal (arcabouço jurídico) quanto aos aspectos ambientais, culturais, sociais, administrativo, financeiro;
h) Fontes de Investimentos (nacional e internacional);
i) Modelo de gestão (público, privado, concessão, parceria público-privado);
j) Impactos econômicos e sociais esperados na Região;
k) Impactos na geração de empregos e qualificação;
l) Análise de viabilidade físico-financeira quanto à sua execução;
m) Principais atores privados e públicos envolvidos.

O conjunto dos Planos Operacionais deverá gerar um **caderno de aplicação**, onde estarão detalhados os elementos acima relacionados e outros que se mostrem necessários à prática das recomendações estratégicas, à elaboração de projetos específicos e à implementação de ações que ensejem, em seu conjunto, alcançar os resultados do Projeto.

Ademais, deverão constar de tais orientações as parcerias fundamentais e potenciais necessárias ao sucesso desses empreendimentos, apontando-se ali as responsabilidades e seus níveis de execução, tanto quanto os modos de se buscar a formalização dos comprometimentos institucionais que viabilizem a execução do PDS_LITORAL.

DEFINIÇAO DE ESTRATÉGIAS DE FINANCIAMENTO VIAVEIS

Para poder implementar as estratégias e ações do Plano de Desenvolvimento Sustentável para a Região Costeira do Paraná será fundamental ter uma **estratégia de aquisição adequada e dimensionada** para o custo das diferentes ações, tentando otimizar os recursos disponíveis, mas assegurando uma cobertura adequada dos custos estimados da sua aplicação durante o tempo em que as ações estão programadas.

Portanto, para lograr a consecução dos objetivos previstos através destas ações, serão definidas aquelas **estratégias de financiamento viáveis** para a implementação do Plano. O foco estará especialmente centrado na captação de recursos de curto prazo, mas também de médio prazo. Estas são algumas das que poderão ser utilizadas para o financiamento das ações previstas:

- **Parcerias público-privadas** entre diversos municípios, empresas, comunidades locais, etc.
- Procura de possíveis **colaborações**, tanto públicas como privadas, por parte de fundações e mecenas.

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 325

- Linhas de financiamento de **projetos relacionados**, de forma direta ou indireta, com o Desenvolvimento Sustentável (em todas ou alguma das suas dimensões: sociais, económicas e ambientais) por parte da administração a diferentes níveis: nacional, federal, estadual, municipal, etc.
- **Linhas de financiamento**, tanto públicas como privadas, para associações, cooperativas, produtores ou empresas.
- Consulta de linhas de **financiamento multilaterais** a nível internacional para instituições e organizações.
- **Recursos públicos** oriundos dos Bancos de Desenvolvimento do Brasil e de América Latina (CAF).

DEFINIÇAO DA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL E DE GESTAO

A atividade visa a elaboração de estatutos e **um protocolo de atuação** no qual sejam definidos o seu *status* jurídico, a composição institucional, o escopo de trabalho, a equipe e o orçamento preciso para o seu funcionamento de forma anual. Além disso, serão definidas as **funções principais**, de forma que exista uma divisão equilibrada entre elas. Igualmente deverão ser potenciadas as sinergias e relações entre as diferentes entidades ou instituições, para levar a cabo, de forma otimizada, o cumprimento das ações e objetivos propostos.

Dentro desta equipe, além da equipe que forma parte desta proposta, deverão estar representados os distintos agentes implicados do território, para a implementação do PDL. De forma preliminar a sua composição será:

- Cada um dos 7 municípios deverá estar representado nas distintas áreas, tendo em conta as dimensões do Desenvolvimento Sustentável: social, econômica e ecológica.
- Representantes Estaduais das áreas que abrange o projeto: Turismo, Ecologia, Unidades de Conservação, Território, Cultura, Arqueologia, Zonas rurais e urbanas, Transportes, etc.
- Representantes das comunidades locais do litoral paranaense.
- Representantes de associações de empresariado turístico do litoral paranaense.
- Associações culturais, ambientalistas, ou implicadas no desenvolvimento do território do litoral paranaense.

Com os contatos de todas as pessoas que formam parte deste Comitê de Gerenciamento será criada uma base de dados. A comunicação por médio do e-mail e telefone será constante para manter abertos em todo momento os canais de comunicação e serão realizadas reuniões presenciais periódicas.

Todas estas medidas facilitarão a gestão do projeto e a estratégia institucional de trabalho dentro do mesmo, de forma que o funcionamento da equipe seja mais fluida e organizada.

INDICADORES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇAO

O mecanismo de acompanhamento e avaliação deverá ser de fácil compreensão tanto para que as informações possam ser visualizadas no site do Projeto, quanto para haver meios de atualizá-las ao longo da aplicação do Plano de Ação.

No marco da elaboração do Sistema de Monitoramento do PDS_LITORAL serão consideradas as diretrizes estabelecidas pelo Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC) como parte integrante da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) e da Política Nacional para os Recursos do Mar (PNRM). Atendendo ao PNGC II, Resolução CIRM 005/97, além dos instrumentos de gerenciamento ambiental previstos no artigo 9º. da Lei 6938/81, que trata da Política Nacional do Meio Ambiente, entre outros instrumentos deverá ser considerado um ***Sistema de Monitoramento Ambiental da Zona Costeira - SMA-ZC*** que se constitui na estrutura operacional de coleta de dados e informações, de forma contínua, de modo a acompanhar os indicadores de qualidade socioambiental da Zona Costeira e propiciar o suporte permanente dos Planos de Gestão. No entanto,

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 326

este sistema presenta ainda lacunas importantes no seu desenvolvimento, pelo que a equipe consultora desenvolverá um sistema para o monitoramento e avaliação empregando indicadores de sustentabilidade e unidades de medição.

Os indicadores estarão relacionados a todos os aspectos que definem a sustentabilidade da área costeira:

- **Capacitação institucional e governança local** (integração das políticas e planos, melhora das ferramentas de gestão e monitorização, recursos humanos, implementação de boas práticas, participação da povoação na tomada de decisões)
- **Crescimento econômico e correção dos desequilíbrios territoriais** (oportunidades, empreendimento, uso do solo, melhoria da eficiência, pesca e aquicultura, turismo sustentável)
- **Qualidade ambiental e de vida** (seguridade, saúde e proteção dos recursos)
- **Bem-estar social** (igualdade, demografia, educação, saúde, cultura e identidade)

Cada um dos indicadores selecionado para a avaliação do cumprimento dos critérios mencionados será avaliado numa escala de acordo com a sua variabilidade e importância (peso), de modo que eles podem ser quantificados. Em qualquer caso, ele garante que os indicadores sejam mensuráveis, alcançáveis, relevantes e monitoráveis ("SMART").

Para a seleção serão empregadas fontes de consulta disponíveis que poderão ser adaptadas ao contexto do litoral do Paraná. Entre as fontes disponíveis, a *Sustainable Development Solutions Network* (SDSN), rede criada pela ONU (Organização das Nações Unidas) para mobilizar a sociedade civil, a Academia e o setor privado para apoiar o desenvolvimento sustentável, criou uma lista dos **100 Indicadores Globais de Monitoramento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) mencionados no TDR:**

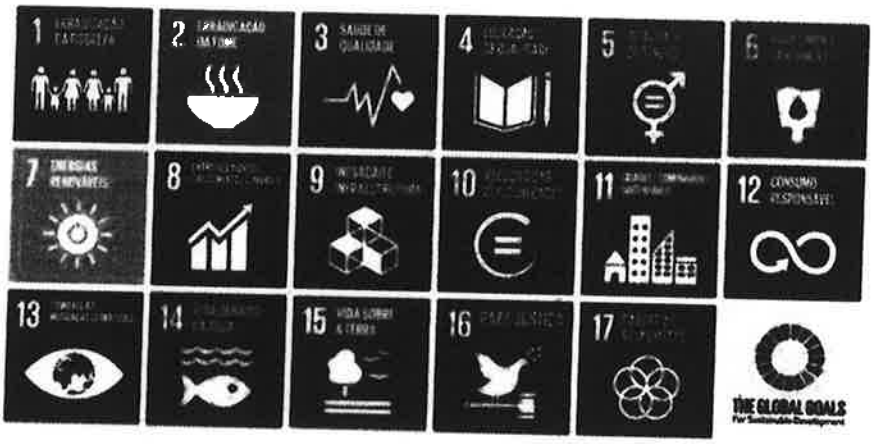

A lista será atualizada sempre que os especialistas concordarem em novos indicadores e métricas para preencher as lacunas identificadas, pelo que o sistema de monitoramento aplicado no Paraná poderá servir para retroalimentar esta base de dados internacional.

O resultado das avaliações periódicas realizadas permitirá corrigir aqueles aspectos que sejam necessários para caminhar rumo aos objetivos e visão estratégica de desenvolvimento sustentável para o litoral do Paraná, garantido a **gestão adaptativa e a capacidade de resposta** ante mudanças acontecidas e a melhoria continua da gestão. A definição da estratégia de coordenação institucional detalhará os responsáveis para o monitoramento e avaliação e a periodicidade e custo associados a essas ações de seguimento.

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 327

4.1.6.6 Ações de participação local

Os mecanismos de participação para elaboração do Plano precisam ser capazes de superar três obstáculos acentuados:

Identificar / sensibilizar parceiros – As organizações da sociedade civil têm acompanhado muito pouco o debate no âmbito regional, boa parte das organizações decorrem de uma cultura municipalista e territorializada, onde o debate político e intermunicipal não está colocado de maneira regular e consistente.

Superar a cultura assistencialista e de interesses partidários – O Plano poderá atravessar períodos eleitorais repletos de interinfluencias nas ações públicas em curso. O forte histórico do controle efetuado por grupos políticos locais traz uma ameaça para a efetiva e franca participação social.

Fragmentação temática e fragilidade institucional das organizações civis – Boa parte das organizações trabalha temas segmentados e de maneira isolada. Poucas associações se arvoram em um debate articulado e institucionalizado. Além disso, há um enfraquecimento do modelo tradicional de participação por antigas organizações civis, em substituição de novos padrões de ingerência e comunicação (democracia virtual).

Neste sentido a participação almejada demandará um trabalho intenso e contínuo de identificação, sensibilização e mobilização de atores plurais, que se disponha a formular o debate de uma cidadania regionalizada.

Por outro lado, há uma forte demanda por espaços de diálogo e de interação qualificada junto ao Estado. A compreensão predominante no campo civil entende como natural sua interação com a política pública como horizonte fundamental para processos de escala e sustentação. A oportunidade deste espaço e a agenda de impacto cotidiano na qualidade de vida das pessoas, muito provavelmente, servirá de atrativo para um conjunto significativo de interessados, de distintas localidades e temas.

Deste modo, o desafio será dar consequência ao processo e efetividade ao dialogo formulado, de maneira que mantenha aquecido o espaço participativo, que se obtenham contribuições qualificadas e onde o elemento participativo seja um pilar do processo de implementação do Plano a ser desenvolvido.

Em situação semelhante, com alguma distinção de estrutura, se encontram as organizações de caráter econômico privado e organizações coorporativas, que mantém relevante presença municipal, mas tímida reflexão regional. Uma distinção importante é que estes segmentos assegurem uma estrutura capilarizada e conectada.

Neste cenário temos como desafio, incorporando o risco e oportunidade, gerar um novo formato de participação do debate público, mais consequente e concreto, colocando ênfase nas ações regionais, diminuindo a distância da ambiência estadual e ampliando a visão estritamente local. A participação precisa ser estimulada, enquanto o modelo de participação público precisa ser refundado.

Nos últimos anos, múltiplos esforços têm sido conduzidos em todo o mundo, e também no Brasil, para promover cidades mais sustentáveis. Alguns dos elementos essenciais, entre outros, devem ser destacados como fatores chaves: lideranças, conhecimento e parcerias.

Lideranças com vontade política e coragem para superar obstáculos são essenciais na reformulação da política regional – estejam elas nos governos municipais, nas empresas, em associações de bairro ou organizações da sociedade civil. A dimensão regional permite o acolhimento de expressões originadas por lideranças comunitárias, empresariais, juvenis, temáticas, etc. Manter um foco na participação de "condutores" de processos é uma estratégia a ser adotada.

Informação e conhecimento também são centrais para que a transformação do espaço urbano aconteça. Promover o debate em torno de estudos e pesquisas, lidar com métricas e cruzamentos de dados, por exemplo, permitem formar um retrato da realidade urbana – suas oportunidades e lacunas – e propor soluções que podem ter maior impacto na promoção da qualidade de vida. Além disso, garantir a transparência e o acesso das pessoas às informações públicas é fundamental para a democracia.

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 328

Em diversos países, entre eles o Brasil, experiências de trabalho articulado entre os setores público, privado e social têm mostrado um jeito moderno e inovador de criar soluções para as cidades. **Mobilizar parcerias e conexões** permite potencializar os esforços empregados e aproveitar debates já coletivizados por segmentos.

Assim, a metodologia de participação no Plano para o Desenvolvimento Sustentável do Litoral do Estado do Paraná deve estar em consonância com a demanda por novos modelos de governança, canais e espaços de participação social inclusivos, com ampliação da democracia direta, possibilitando ao cidadão e sua institucionalidade influenciar nas discussões e nos processos de tomada de decisão. Neste sentido, seguem algumas informações a cerca das premissas, estratégias, público chave, mapa de participação, atividades relacionados especificamente ao Plano de Participação.

Premissas

- A distribuição das atividades deverá estar em consonância com as etapas do Plano em foco (Plano de Trabalho, Contextualização da Região, Construção de Cenários e Visão de Futuro, Plano de Ação e Conferência Regional);
- Deverá ainda estar em estreita relação com as atividades de capacitação, comunicação, monitoramento e avaliação, promovendo uma visão sistêmica e articulada;
- As instâncias de participação deverão ser acompanhadas e validadas regularmente pela equipe do Contratante para ajustes e aprimoramento;
- O contexto não é favorável a participação, pois o ambiente é de desestimulo e descrença na agenda pública. A crise econômica tem colocado obstáculos na mobilização de agendas coletivas, tanto de segmentos governamentais, quanto da sociedade civil. A mobilização deve ser capaz de superar este cenário adverso; e
- Um dos desafios adotados é ampliar a percepção dos ganhos com o avanço de uma governança integrada dos municípios.

Estratégia

- Estabelecer as instâncias formais de participação permeadas e dinâmicas;
- Incluir mecanismos de participação virtual para membros das instâncias formais de participação e também para público geral;
- Harmonizar o recorte de segmentos, territoriais e temáticos ao longo do desenvolvimento do Plano, combinando espaços de participação com referência nos três elementos;
- Promover iniciativas localizadas nos municípios e simbólicas, visando estimular uma cidadania regional, sem perder a referência municipal;
- Estar atento ao calendário impactante aos processos de mobilização, tais como periodos festivos e eleitorais;
- Estimular ações relacionadas aos temas de destaque regional, entre eles: acidentes naturais, porto de Paranaguá e turismo de praia sazonal;
- Desenvolver ferramenta tecnológica mostrando a distribuição da participação da sociedade civil na região, indicando seu perfil, área e abrangência de atuação (Mapa de Participação).

Público Chave

- Identificar pontos chaves de cooperação com segmento privado – Priorizar instituições com capilaridade regional;
- Identificar pontos chaves de cooperação com agências reguladoras estaduais e concessionárias. Articular com organismos vinculados aos eixos centrais do Plano e de amplo impacto na vida cotidiana das populações;
- Identificar pontos chaves de cooperação com agencias e órgãos federais – promover o diálogo com instituições nacionais relevantes para o desenvolvimento da região (BNDES, Caixa, Porto, etc);

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 329

- Identificar organizações prioritárias acadêmicas – relacionar instituições de cunho acadêmico cujo foco concentre-se em ações envolvendo reflexões regionais;
- Identificar atores da sociedade civil de atuação local e regional – mapear atores da sociedade civil, com atuação local, espalhados nos distintos municípios, bem como de organizações com foco e dialogo regional;
- Identificar atores chaves das organizações de classe – articular instituições de reconhecida relevância para intervenções urbanas.
- Identificar mídia local – relacionar os distintos segmentos de comunicação comunitária de forma a cativar estes atores para uma difusão do Plano;
- Identificar pontos focais de participação dos municípios – buscar interlocutores qualificados, nas prefeituras, sobre o tema da participação/gestão, visando um canal direto para participação em eventos/ reuniões/ dialogo;
- Identificar pontos focais em secretarias e órgãos do governo estadual – estabelecer rede de contatos com órgãos governamentais estaduais para contribuições na reflexão e intervenção no Plano;
- Identificar pontos de referência com legislativo estadual e municipais – estabelecer canal de participação do legislativo para temáticas que envolvam os debates regionais; e
- Identificar atores chaves nas agências internacionais – estabelecer canal de diálogo com agências internacionais para acompanhamento do Plano (ONU Habitat, PNUD, Banco Mundial, etc).

A figura a seguir traz uma representação da estrutura geral de participação dos agentes do território no Plano. Este elemento articulador, além de respaldo legitimador, dá aderência à dinâmica das problemáticas a serem enfrentadas, e ao potencial das sinergias a serem efetivadas em escala regional. A participação terá inicio já na fase de plano de trabalho e, dentro dos processos de elaboração do Plano, se pretende estabelece-la como locus da consolidação de uma cultura regional permanente, participativa e propositiva; e indutora de ações que resultem em melhoria na qualidade de vida e competitividade sistêmica de um território em articulação.

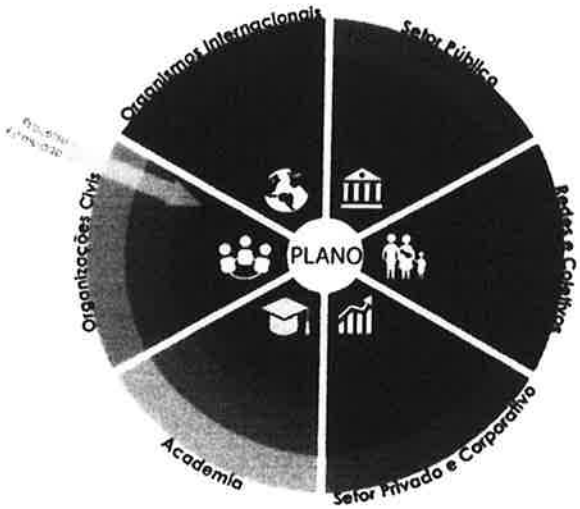

Figura 4.1.6.6.A: Estrutura geral de participação dos agentes do território

Mapa de Participação

Elaborar e desenvolver um mapa georreferenciado da participação da sociedade civil na região em estudo, estabelecendo para isso uma tipologia de acordo com perfil associativo, temas prioritários de atuação, marco

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 330

legal e grau de envolvimento com temas regionais. Espera-se contribuir para visibilidade da atuação comunitária, expansão da participação virtual e acréscimo da mobilização local.

Exemplos de Atividades Locais que podem ser inseridas (Expansão Geográfica)

Figura 4.1.6.6.B: Atividades Locais.

- Café com mídia local – Espfoto?aço itinerante com mídia comunitária (blogueiros e rádios) sobre temas afeitos a região. Uma espécie de informativo e detalhamento sobre o cenário do município;
- Atividade em escolas – Mobilização de professores de ensino médio para criação de uma rede de difusão e reflexão, construindo nas escolas murais com conteúdo regional;
- Atividades na praça/espaços públicos – Ação espontânea de mobilização em pontos de concentração populacional com enquetes e consultas em relação aos temas regionais. Ação articulada à estratégia de comunicação;
- Aula na rua/trem/mar – estimulo a criação de atividades pedagógicas através de visitação guiada e reflexiva sobre os equipamentos regionais, destinado ao público diretamente afetado, acadêmicos e curiosos em geral;
- Atividades formativas – estruturação de atividades formativas direcionadas a gestores municipais e estaduais diretamente envolvidos com o tema regional.

Distribuição das Atividades Previstas (Eventos):

- **Fase de Engajamento**
  - 01 Reunião Técnica;
  - 01 Oficina Regional; e
  - 01 Audiência Pública.
- **Fase de Contextualização da Região**
  - 01 Reunião Técnica;
  - 01 Oficina Regional; e
  - 01 Audiência Pública.
- **Fase de Construção de Cenários e Visão de Futuro**
  - 01 Reunião Técnica;
  - 01 Oficina Regional; e
  - 01 Audiência Pública.
- **Fase do Plano de Ação**

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 181

- 01 Reunião Técnica;
- 01 Conferência Regional.

Para realização dos eventos, serão definidos em conjunto com o Contratante o local, o tema, a duração, a programação, os objetivos e a dinâmica.

No que diz respeito à dinâmica, dentre as alternativas possíveis, deve-se ter como premissa para a escolha que a mesma seja estimuladora de comportamento colaborativo através de atividades e metodologias participativas. A seguir apresenta-se uma possível estrutura para a dinâmica:

- Explicar dinâmica *"World Café" inspired;*
- Dividir a plenária em grupos menores (por exemplo, até 5 participantes).

1ª ETAPA: Brainstorming

1) Responder à pergunta (com o número de ideias que quiser), exemplo: "O que é indispensável (o que não pode faltar) na região que desejamos em 2040? (Visão de Futuro)

Registro: post it no flip chart

- Trocar de grupos;
- Clusterização e Identificação.

2) Clusterizar as "visões" dentro dos de eixos estruturantes (mobilidade, saneamento, habitação, meio ambiente...)

Registro: post it no flip chart

- Permanecer nos grupos;
- Cada grupo escolhe 2 (dois) eixos/grupos de visões e vai desenvolver o "framework" de 2 (duas) visões daquele eixo.

2ª ETAPA: Desenvolvimento | FRAMEWORK

3) "O que precisa acontecer para essa visão se tornar realidade?" (Como podemos alcançar essas "visões"? Que medidas ou ações deveriam ser realizadas para alcançar essa "visão"?)

4) Como eu posso colaborar para essa solução e/ou quem eu indico para a ação?

(Elencar ainda sugestões livres de iniciativas, cidades inspiradoras ou estudos)

Registro: Framework

3ª ETAPA: Compartilhar os resultados

Registro: Plenária

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 332

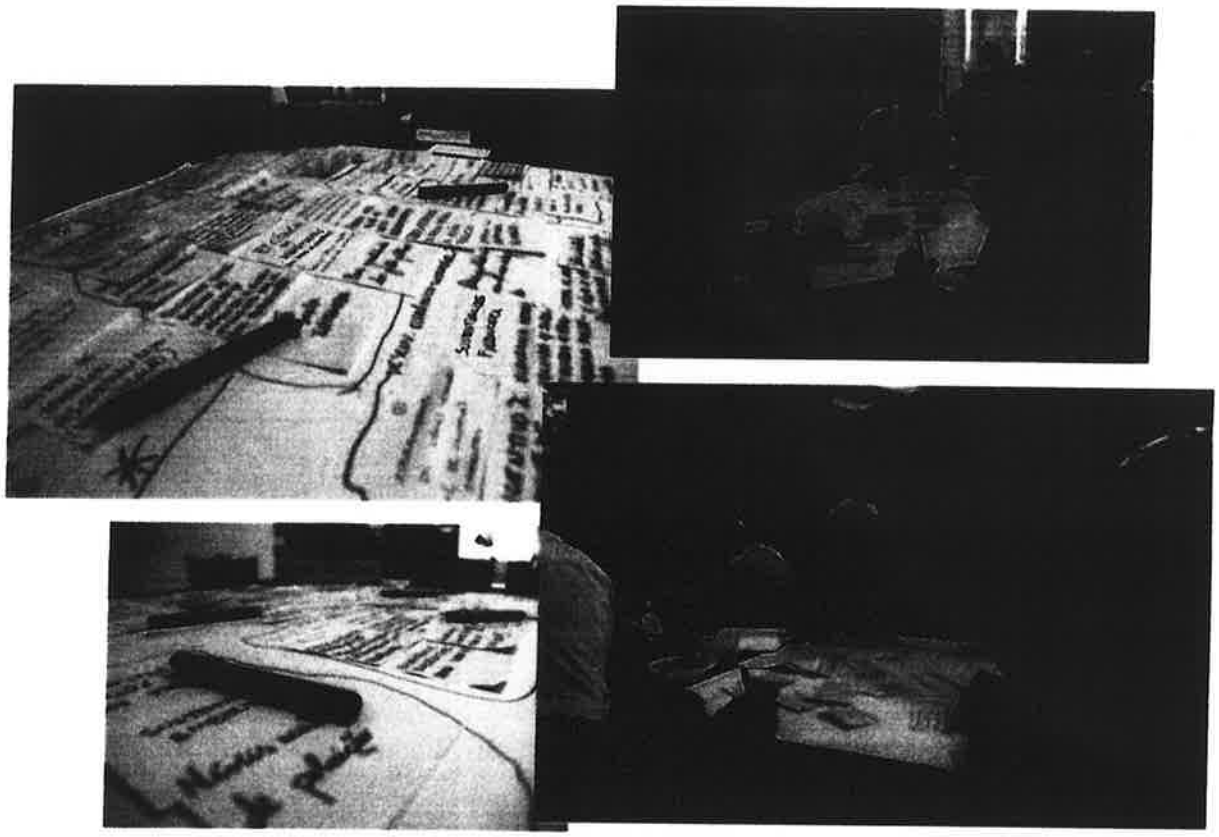

Figura 4.1.6.6.C: PDUI RMRJ – Maio/2016

4.1.6.7 Transferência de conhecimento

Nas últimas décadas tem-se assistido a uma revolução nas tecnologias da informação. O aparecimento da Internet, trouxe uma dimensão totalmente nova de entender a realidade e a informação. Segundo alguns artigos, hoje o mundo produz cerca de 2.8 zetabytes (1021 bytes) de informação, o próprio vocábulo "zetabits" era inexistente há alguns anos atrás. Esta espiral produção de informação tem conduzido profundas mudanças em todos os campos da sociedade, o que tem suscitado por parte de alguns autores a designação de era do conhecimento. No entanto, esta era do conhecimento, parece trazer um paradoxo implícito: grandes quantidades de informação gerada e uma dificuldade em transformar esta informação em conhecimento em sentido lato e em conhecimento aplicado em sentido mais restrito. O paradoxo reside no fato que a geração de grandes quantidades de informação não pressupõe a criação de conhecimento, é necessário um tratamento, uma análise e uma visão crítica à informação recolhida, para que seja possível passar da informação ao conhecimento.

É neste contexto, que a transferência de conhecimento e programas de treinamento no âmbito do Plano para o Desenvolvimento Sustentável do Litoral do Estado do Paraná ganham uma importância redobrada dada a multiplicidade do Tema Regional. São estes programas que vão permitir que se consolide o processo de transferência de conhecimento e que sejam efetivos ao longo do tempo tanto para a equipe do Contratante quanto para os diversos atores/stackholders envolvidos nas diversas instâncias participativas, ou seja, dado ao paradoxo explicitado no parágrafo anterior será dado o treinamento necessário à transferência de conhecimento da equipe da consultora aos envolvidos de forma clara, concisa e adequada no seu volume, com profissionais qualificados permitindo sua perfeita assimilação contando ainda com as melhores tecnologias utilizadas.

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 333

Atendendo ao edital, o Plano PDS_LITORAL pautará a elaboração e implementação de políticas públicas estaduais para o litoral do Paraná e deverá servir de subsídio para as demais esferas governamentais, iniciativa privada e instituições de ensino e pesquisa, extensão e inovação.

Para tanto, o Consorcio contempla dois tipos de ferramentas principais visando a transferência de conhecimento: (i) desenvolvimento de ferramentas tecnológicas de apoio aos processos de tomada de decisão pelos atores locais; e (ii) elaboração de um programa de capacitação voltado a organização de workshops e meeting de transferência de conhecimento.

Desenvolvimento de ferramentas tecnológicas

No marco do projeto, serão desenvolvidas várias ferramentas tecnológicas para comunicação do projeto e como ferramentas de apoio na apresentação dos resultados e para os processos de tomada de decisão no planejamento participativo previsto pelo projeto. Essas ferramentas são indicadas a seguir:

- **Criação do site contendo o repositório online de informações do projeto:** O Consórcio criará o site do projeto contendo uma base documental com todo tipo de materiais digitais de interesse e de livre acesso, contendo estudos, imagens e material audiovisual coletados no marco do projeto, permitindo o acesso on-line às informações pelo público geral e entidades envolvidas no processo de planejamento participativo do projeto, como uma ferramenta de consulta e informação para todos os participantes da Equipe Técnica Intersetorial - ETI, Equipe de Acompanhamento – EA, atores locais e sociedade civil geral na área de abrangência do projeto. O site e base documental será desenvolvida em uma plataforma Joomla, com formato amigável para disponibilização das informações e para as ações de comunicação do projeto.

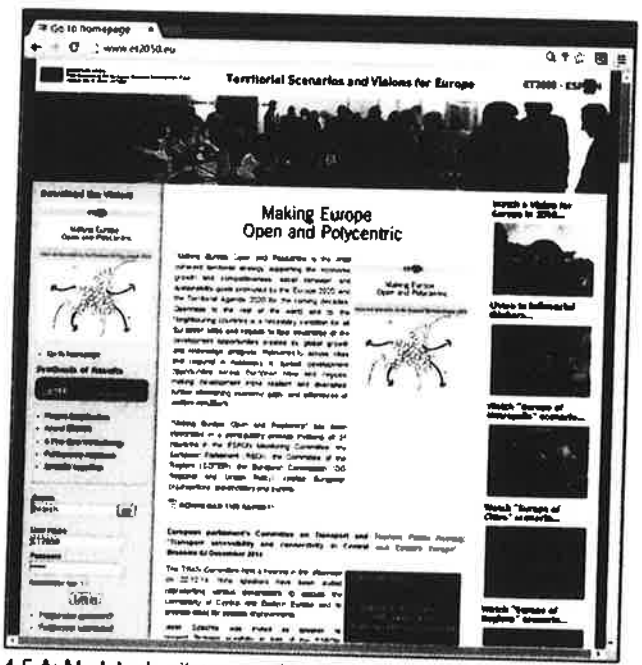

Figura 4.1.4.5.A: Modelo de site contendo a base documental desenvolvido pelo Consorcio no marco de projetos similares.

- **Sistemas de informação:** Uma pessoa informada é aquela capaz de dar sentido a todos os dados difusos que percebe continuamente em seu ambiente; por isso devem ser integrados numa estrutura comum que as interligue, e permita a sua contextualização. Um sistema de informação visa colocar no

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 334

contexto do planejamento as bases de dados disponíveis, selecionar e controlar a qualidade das variáveis mais importantes, estimando as variáveis que não estão disponíveis, mas necessárias, inter-relacionando cartografia e dados estatísticos georreferenciados, documentando as fontes e protocolos de manutenção e organizando o sistema de informação comum de acordo còm uma estrutura temática, geográfica e temporal prefixada

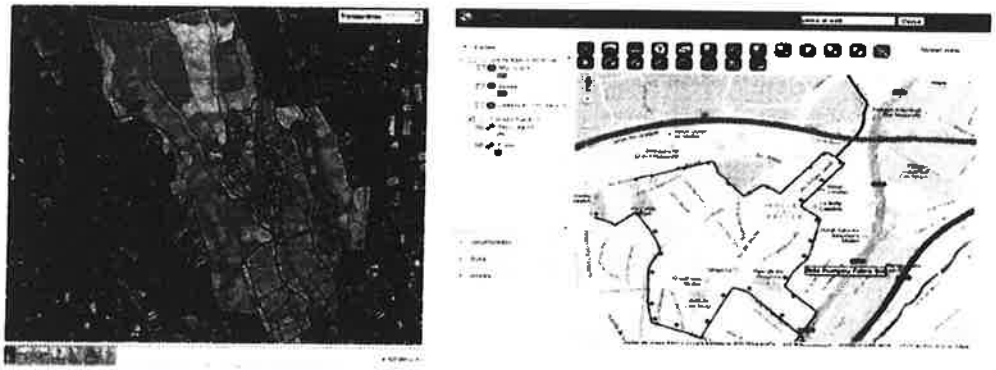

Figura 4.1.4.5.B: Ferramentas de SIG desenvolvidas pelo Consórcio no marco da elaboração de projetos de planejamento e inventários territoriais.

- **Modelos de previsão**: O objetivo de um modelo de previsão é o de criar novas informações sobre o futuro a partir de informação existente e de um conhecimento sobre o funcionamento do sistema a ser analisado. A utilização de modelos de previsão deve servir para objetivar as avaliações de cenários e estratégias alternativas. Idealmente, devem ser concebidas como ferramentas interativas (pergunta - resposta-nova pergunta) acessíveis a usuários interessados.

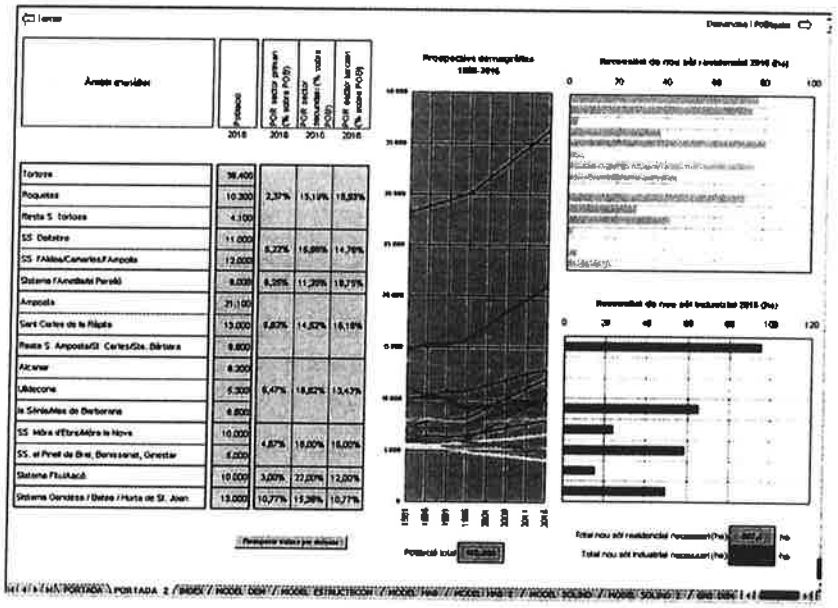

Figura 4.1.4.5.C: Exemplo de modelo de previsão das necessidades de solo residencial para região de Terres de l'Ebre, Catalunha (SIRGA, IDECE).

- **Modelos de avaliação:** Desenvolver um modelo de avaliação serve para objetivar as avaliações de cenários e estratégias alternativas para adotar. O método mais simples de avaliação para a adoção de

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 335

um projeto ou uma política ou estratégia seria a definição de um conjunto de critérios e indicadores. Os valores destes indicadores devem prosseguir tanto quanto possível dos modelos de previsão das atuações e modelos de impacto no meio ambiente, mas pode haver casos em que não há modelos disponíveis ou confiáveis e é necessário recorrer a valores expertos ou heurísticos. Em qualquer caso, indicadores devem ser explícitos. Para adicionar os valores dos indicadores, é construída uma matriz onde, para cada alternativa de decisão (ou projeto) são listados resultando em valores para cada indicador.

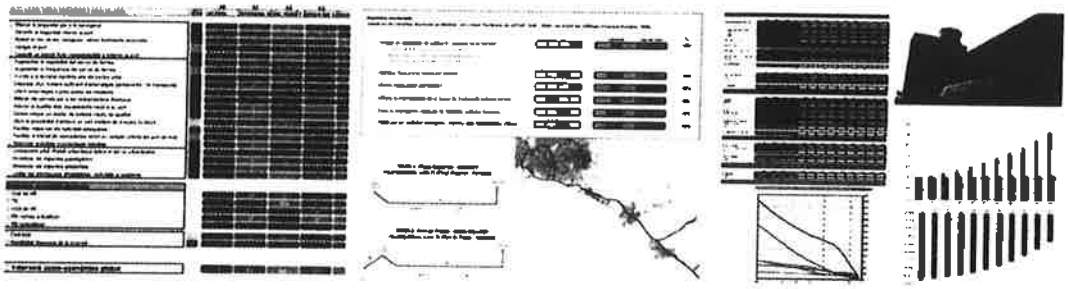

Figura 4.1.4.5.D: Ferramentas de avaliação desenvolvidas pelo Consórcio.

Relevância para o Programa de Capacitação

A transferência de conhecimento e tecnologia de forma planejada, estruturada e controlada é considerada fator crítico de sucesso, por ser pré-requisito fundamental para a continuidade das ações do Plano após o encerramento do contrato com o Consórcio.

O treinamento e qualificação dos profissionais envolvidos e o aprendizado permanente são as bases para o crescimento e sucesso do empreendimento e das pessoas. Dada a natureza do objetivo proposto, identificamos três esferas de atuação:



Cabe deixar bem claro que os eventos previstos ao longo da execução do Plano são diferentes dos "wokshops e meetings de transferência de conhecimento" a seguir propostos, os primeiros se referem aos passos executados durante a preparação do plano em suas fases/etapas com o fortalecimento do mecanismo de participação plural, fazendo com que o plano seja construído por "múltiplas mãos", Governo, Sociedade e Consultora. O segundo se refere a necessidade de se aproveitar do extenso conhecimento e experiência da empresa de consultoria contratada para a elaboração de um plano desta envergadura para que os agentes públicos e privados diretamente envolvidos possam ser capazes de monitorar e avaliar sua implementação de forma crítica e eficiente ao longos dos anos vindouros no horizonte da implantação do Plano e possam ainda se utilizar deste conhecimento na elaboração de outros planos de interesse do contratante e dos demais envolvidos.

Metodologia para a Capacitação

O repasse das informações e o método de trabalho adotado pela equipe contratada será realizado durante todo o plano. Serão realizados em duas formas:

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 336

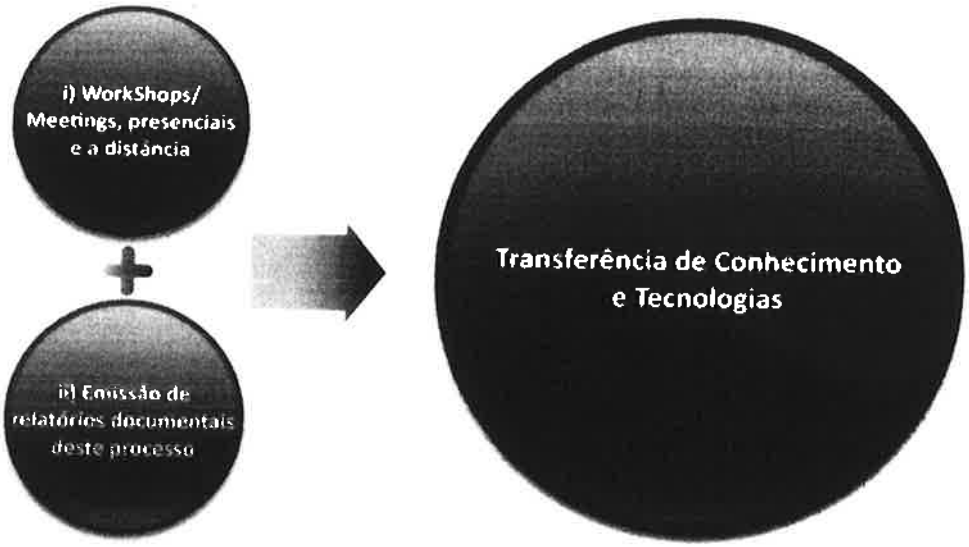

- Estes workshops/meetings serão realizados para no máximo 10 pessoas, terão a duração de 2h a 4h, dependendo do tema, se desenvolverão ao longo do período de contrato, ao início de cada uma das fases de elaboração do Plano e serão dirigidas pelos especialistas do Consórcio, sendo ministrados a equipe do Contratante e demais agentes envolvidos de modo que sejam apresentados detalhes sobre:
  - Metodologia utilizada
  - As práticas do sistema de qualidade/análise de riscos/mitigação
  - O uso dos softwares utilizados
  - E as lições aprendidas.
- Os relatórios documentais serão emitidos em até 15 dias após a realização do evento (workshop/meeting) no idioma português de forma impressa e na forma digital em mídia dvd-room contendo arquivo no formato .doc do software word da Microsoft, em tamanho 12,espaçamento 1,5 e fonte Arial. Poderá ser emitido em outro formato a escolha do contratante.

Num plano ou programa, a transferência de conhecimento e tecnologia necessita de pessoas, ações e ferramentas que permitam sua adequação operacional a partir do conhecimento adquirido. A principal fonte de conhecimento são as pessoas, razão pela qual é necessário o envolvimento integral tanto dos representantes da equipe do Consorcio quanto dos profissionais do Contratante e demais agentes. Desta forma, a gestão do conhecimento resultará na evolução do modelo de trabalho, através de três linhas de atuação: coleta de informação, análise (transformação em conhecimento), e implementação.

- A primeira linha consiste na coleta de informações, como resultados de atividades, experiências individuais ou outras e registradas em meio eletrônico.
- A segunda linha de atuação consiste na análise da informação, com o objetivo de transforma-la em conhecimento e validação das lições pelos especialistas da equipe do consorcio, preparando-se então a disseminação da informação no âmbito da UGP. Esta ação é considerada fundamental para garantir que a lição aprendida seja acurada e que possa ser facilmente compreendida.
- A terceira linha de ação é a implementação, visando a sua utilização prática.

Também serão fornecidas informações sobre os motivos que levaram à escolha das ações corretivas/mitigações acerca da análise risco da elaboração do Plano. Cabe ressaltar que a *mitigação de riscos e a gestão da comunicação* são as atividades encontradas com maior frequência em lições aprendidas nos programas e planos.

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 337

O pressuposto é que o conhecimento e a aprendizagem poderão ser compartilhados de maneira a evitar o retrabalho e que o conhecimento dos especialistas do Consorcio possa ser plenamente transferido aos técnicos do Contratante e demais agentes e se perenizem como multiplicadores para outras áreas do governo.

A transferência de conhecimento e tecnologia ao longo do processo contará com a assessoria continuada ao Coordenador mediante desenvolvimento de atividades para a discussão e capacitação em serviço. A metodologia, anteriormente apresentada, terá forte componente presencial (workshops, reuniões, salas de discussão) e se necessário, pela utilização de tecnologias da comunicação (plataformas virtuais e redes de conhecimento) que levem em conta as dificuldades de agenda dos participantes e dos palestrantes.

Qualificação dos Especialistas e Capacitadores

Ação	Responsável	Qualificação dos Especialistas
Workshop "Metodologia utilizada na elaboração do Plano"	• Coordenador	Conforme explicitadas item de Organização e Dotação de Pessoal desta Proposta Técnica
Meeting "Atividades Relacionadas ao Planejamento, Monitoramento e Avaliação do Plano"	• Coordenador • Especialista em Monitoramento e Avaliação	
Meeting "Análise e Mitigação de Riscos na elaboração do Plano"	• Coordenador • Especialista em Monitoramento e Avaliação	
Meeting "Mecanismos de Participação Social e Comunicação na elaboração do Plano"	• Coordenador • Especialista em Estruturação Social • Especialista em Mediação e Tratativas com a Comunidade • Especialista e Comunicação Social e Mídias Sociais	
Workshop "Lições aprendidas, sistematização de dados/ informações e memórias técnicas da implantação do Plano"	• Coordenador • Especialista em Monitoramento e Avaliação • Especialista em Sistemas de Informação	

B – PLANO DE TRABALHO

Neste capítulo, o Consórcio apresenta as atividades principais dos serviços, seu conteúdo e duração, fases e relações entre si, marcos (incluindo as aprovações provisórias do Contratante) e as datas de entrega dos relatórios. Também será incluída uma lista dos documentos finais, incluindo relatórios, planos e tabelas que serão apresentados como produto final.

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 338

4.2.1. Relação de Atividades

Os serviços para ***Elaboração do Plano de Desenvolvimento Sustentável do Litoral de Paraná – PDS Paraná*** foram desmembrados em 4 (quatro) componentes e estes em atividades para maior clareza de exposição da metodologia.

As atividades consideradas nesta descrição são as relacionadas no Termo de Referência e outras não explicitadas diretamente, mas que o Consórcio julga de fundamental importância para alcançar os objetivos preconizados. Para tanto, a nossa equipe propõe uma metodologia baseada na organização das atividades em ETAPAS DE TRABALHO, que têm como fim o desenvolvimento de cada um dos produtos entregáveis. Cada uma das ETAPAS DE TRABALHO compreende as atividades a serem desenvolvidas para atingir os resultados esperados, explicadas de forma pormenorizada no Plano de Trabalho a seguir. Cada fase e respectivas atividades receberam uma codificação, que se constitui em uma forma sistematizada de apresentação, permitindo maior clareza de exposição e melhor identificação de cada componente dentro do conjunto e sua correlação. Apresenta-se a seguir o Quadro "Relação das Atividades a Executar".

RELAÇÃO DAS ATIVIDADES A EXECUTAR	
ETAPA 0. ATIVIDADES PREPARATÓRIAS E GERENCIAIS DO CONTRATO	
Atividade 001	Providências Iniciais e Mobilização
Atividade 002	Acompanhamento gerencial do contrato
Atividade 003	Reunião de partida (kick-off meeting)
ETAPA 1. PLANO DE TRABALHO	
Atividade 101	Identificação e levantamento das informações existentes
Atividade 102	Desenho das ferramentas de comunicação do projeto
Atividade 103	Elaboração do plano de comunicação.
Atividade 104	Elaboração do plano de trabalho
Atividade 105	Realização da Reunião Técnica 1
Atividade 106	Disponibilização do Plano de Trabalho Inicial (P.T.I) e material elaborado para consulta pública
Atividade 107	Realização das Oficinas públicas de Engajamento
Atividade 108	Audiência Pública de Engajamento
Atividade 109	Validação do Plano de Trabalho Final
ETAPA 2. CONTEXTUALIZAÇÃO	
Atividade 201	Levantamentos e análise de dados secundários
Atividade 202	Levantamentos e análise de dados primários
Atividade 203	Elaboração de mapas georreferenciados para interpretação dos dados.
Atividade 204	Elaboração de diagnóstico e da matriz FOFA
Atividade 205	Elaboração de benchmark para identificação de boas práticas internacionais
Atividade 206	Elaboração do Relatório de Contextualização Inicial (RCI)
Atividade 207	Realização da Reunião Técnica 2
Atividade 208	Disponibilização do Disponibilização do Relatório de Contextualização Inicial (RCI) e material elaborado para consulta pública
Atividade 209	Realização das Oficinas públicas de Contextualização
Atividade 210	Audiência Pública de Contextualização

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 339

Atividade 211	Validação do Relatório de Contextualização Final (R.C.F.)
ETAPA 3. CONSTRUÇAO DE CENARIOS E VISAO DE FUTURO	
Atividade 301	Construção dos cenários de desenvolvimento sustentável e avaliação de impactos
Atividade 302	Formulação de visão geral de futuro para até 2035
Atividade 303	Estabelecimento de objetivos e metas previstas
Atividade 304	Definição dos eixos estratégicos e princípios orientadores do Plano
Atividade 305	Processo de consulta com os atores locais
Atividade 306	Elaboração do Relatório de Construção de Cenários e Visão de Futuro Inicial
Atividade 307	Realização da Reunião Técnica 3
Atividade 308	Disponibilização do Relatório de Construção de Cenários e Visão de Futuro Inicial (R.C.C.I.) e material elaborado para consulta pública
Atividade 309	Realização das Oficinas públicas de Construção de Cenários e Visão de Futuro Inicial (RCCI)
Atividade 310	Audiência Pública de Construção de Cenários e Visão de Futuro
Atividade 311	Validação do Relatório de Construção de Cenários e Visão de Futuro Final (R.C.C.F.),
ETAPA 4. PLANO DE AÇAO	
Atividade 401	Zoneamento territorial
Atividade 402	Definição de programas e propostas de ação
Atividade 403	Definição de estratégias de financiamento viáveis
Atividade 404	Definição da estratégia institucional e de gestão
Atividade 405	Definição dos mecanismos de monitoramento e controle de ações governamentais
Atividade 406	Elaboração do Relatório de Plano de Ação Inicial (R.P.A.I.)
Atividade 407	Realização da Reunião Técnica 4
Atividade 408	Disponibilização do Relatório de Plano de Ação Inicial (R.P.A.I.) e material elaborado para consulta pública
Atividade 409	Realização das Oficinas públicas de Plano de Ação Inicial (R.P.A.I.)
Atividade 410	Audiência Pública de Plano de Ação Inicial (R.P.A.I.)
Atividade 411	Validação do Relatório de Plano de Ação Final (R.P.A.F.)
ETAPA 5. CONFERENCIA REGIONAL	
Atividade 501	Elaboração do documento final do Plano
Atividade 502	Apresentação e revisão do documento final
Atividade 503	Realização da Conferencia Regional

4.2.2. Descrição das atividades e tarefas

Apresenta-se a seguir a descrição das atividades a executar, com seu alcance, abrangência e prazos.

ETAPA 00. ATIVIDADES PREPARATORIAS E GERENCIAIS DO CONTRATO

Trata-se da fase inicial do processo, caracterizada pela mobilização das equipes, dos recursos materiais e tomada de providências legais exigidas, e do acompanhamento do contrato, garantindo a execução das tarefas conforme planejamento, acerca de compatibilidade com cronograma proposto e qualidade. Nesta etapa também será desenvolvido o modelo gerencial de atuação do consorcio no marco do projeto

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 140

Atividade 001. Providencias iniciais e mobilização. A atividade visa a mobilizar as equipes, os recursos materiais, tomar as providências legais exigidas e formular os planos iniciais de atuação das equipes. Nesta etapa será estabelecida a forma de atuação das equipes na condução dos trabalhos, por meio da caracterização de tarefas, normas (princípio, regras), procedimentos (modos) e rotinas (sequência de atos) e, principalmente prazos e metas pré-estabelecidos que, por reunirem definições fundamentais, constituir-se-ão na fonte de consulta e de referência permanente ao longo da elaboração/revisão dos Planos em questão. A mobilização de pessoal e recursos deverá estar concluída após 15 (quinze) dias do seu início

Atividade 002: Acompanhamento Gerencial do Contrato. Esta atividade consiste no acompanhamento gerencial do contrato, garantindo a execução das tarefas conforme planejamento, acerca de compatibilidade com cronograma proposto e qualidade. Este sistema, propiciará ações de integração voltadas para a busca da otimização de resultados, desempenhando as funções básicas de coordenação, fiscalização, planejamento e controle, através de um conjunto de soluções administrativas que a experiência prática vem consagrando e assegurando pronta e eficaz resposta a qualquer desvio detectado.

A estrutura para a geração deste sistema envolve, além dos instrumentos administrativos relativos às funções básicas citadas, a formação de equipes segundo conceitos organizacionais bem definidos, podendo-se destacar, principalmente, os seguintes:

- Definição clara e precisa de responsabilidade;
- Avaliação correta dos objetivos e meios necessários para atingi-los;
- Atuação integrada da equipe, sem problema de comunicação ou dupla chefia;
- Ajustamento contínuo dos recursos necessários mediante reavaliações sistemáticas;
- Controle total do ritmo de desenvolvimento de cada uma das etapas do trabalho.

A Coordenação será conduzida ao longo de todo o período do contrato, compreendendo o desenvolvimento de ações gerenciais que incluem o planejamento dos serviços e o acompanhamento físico-financeiro dos mesmos, permitindo que todas as atividades de controle (de caráter administrativo, de informações, de comunicação, técnico e/ou institucional) sejam conduzidas de forma a viabilizar a consecução das metas da CONTRATANTE, respeitando prazo, qualidade e custo dos serviços. Competirá ao coordenador garantir a perfeita atuação e a adequada integração dos especialistas, de modo a possibilitar o desenvolvimento dos trabalhos.

Atividade 003: Reunião de Partida ("Kick-Off Meeting"). A reunião tem por objetivos a avaliação técnica, coordenação e definição do trabalho, considerando os seguintes pontos:

Pela parte do Consorcio:

I. Apresentação da equipe, experiência prévia e atribuições no marco do projeto;

II. Apresentação da metodologia de trabalho para identificação de pontos críticos a serem considerados no Plano de Trabalho

Por parte do Governo:

III. Definição dos interlocutores chave que irão acompanhar o projeto e participarão da Equipe Técnica Intersecretarial;

IV. Indicação de atores e entidades a serem consideradas para as atividades participativas do projeto que serão levadas em conta na elaboração dos planos de comunicação.

V. Indicação de informações existentes relevantes no marco do projeto e na sua área de abrangência.

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 341

ETAPA 01. ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Nesta etapa prevista no Termo de Referência do projeto estão também estabelecidas as atividades relativas a elaboração do Plano de Comunicação e Levantamento de Informações Existentes que objetivam a elaboração do Plano de Trabalho. O Plano de Trabalho Inicial (PTI) deverá ser validado na Reunião Técnica 1, Oficinas Públicas de Engajamento e Audiência Pública de Engajamento como estabelecido a seguir:

Atividade 101. Levantamento e Organização das Informações, Pesquisas, Estudos, Projetos e Planos Existentes. O levantamento e organização das informações, pesquisas, estudos, projetos e planos existentes visa à obtenção de uma fotografia atualizada do contexto de atuação e propostas de desenvolvimento existentes na área abrangente do Projeto. Do ponto de vista metodológico, esta fase deverá considerar:

- A seleção prévia das fontes, considerando a relevância das mesmas;
- A elaboração das fichas de sistematização dos dados secundários referenciando: a forma de coleta; o órgão responsável; a periodicidade e regularidade da pesquisa;
- A seleção dos dados mais relevantes para o trabalho;
- A organização e sistematização digital das informações;
- A análise crítica das informações levantadas.

As informações coletadas serão incluídas em um sistema repositório on-line para publicação das informações coletadas na pesquisa. A base documental será desenvolvida em uma plataforma Joomla, sistema de gestão de conteúdo disponibilizado via web, que permite o acesso e as atualizações totalmente on-line. O sistema de informação incorporará três níveis de informações:

I. Bases de dados socioculturais, econômicos, ambientais e territoriais desenvolvidas em pesquisas anteriores, com foco no conhecimento das empresas públicas e privadas existentes, dos distintos setores, e nas características dos turistas;

II. Identificação de boas práticas, observações das lições aprendidas e informações sobre processos de desenvolvimento em territórios similares; e

III. Repositório de estudos sobre metodologias relevantes para as avaliações que serão desenvolvidas no marco do Projeto.

Atividade 102. Elaboração do Plano de Comunicação. A elaboração do plano de comunicação do projeto contempla os seguintes itens:

a) Relação do diretório de agentes e instituições locais que devem ser envolvidas no processo da elaboração do PDS_LITORAL, incluindo instituições governamentais (federal, estadual, municipal), sociedade civil, academia, terceiro setor e outros interessados que deverão participar das reuniões, oficinas e audiências públicas.

b) Definição da metodologia, canais e atividades do plano de comunicação levando em consideração os seguintes itens:

I. Metodologia das atividades de comunicação, voltadas a Oficinas Locais e Audiências Públicas para uma participação continua ao longo do projeto.

II. Definição dos grupos alvo, a partir do diretório de agentes e instituições locais elaborado.

III. Detalhamento das ações, estabelecendo:

(a) Veículos e canais de comunicação.

(b) Foco geral dos conteúdos;

(c) Princípios e diretrizes;

(d) Publico alvo;

(e) Tipologia de temas prioritários.

IV. Planejamento e fluxograma detalhado

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 342

Atividade 103. Desenho das ferramentas de comunicação do projeto. A criação da imagem do Projeto é um elemento crítico para a necessária e prévia informação aos empresários e agentes que serão abordados pelos pesquisadores de campo, de modo a criar facilidades e a evitar resistências em relação ao trabalho a ser desenvolvido. Para tanto, o Consorcio propõe a criação de duas ferramentas de comunicação: o **site do projeto** e a **logomarca**. A criação e desenvolvimento da logomarca e da identidade visual própria do Projeto, previamente aprovada pela Equipe Técnica Intersecretarial – ETI e Equipe de Acompanhamento – EA, deverá ser aplicada em todas as peças e instrumentos utilizados para fins de comunicação do Projeto. A segunda ferramenta de comunicação que será desenvolvida pelo Consórcio é o site do projeto, em um sistema repositório on-line (em formato Joomla, plataforma livre de restrições comerciais). Além das informações para as consultas e audiências locais previstas no marco do projeto, o site conterá as informações, relatórios e pesquisas que sejam consideradas relevantes ou estratégicas para o Projeto, sendo um ponto de informação de referência sobre o Litoral do Paraná.

Atividade 104. Elaboração do Plano de Trabalho. A elaboração do Plano de Trabalho visa ao norteamento do projeto, contendo o planejamento de todas as ações previstas e prazos de entrega estabelecidos em alinhamento com as orientações do edital, contendo no mínimo, os seguintes elementos:

i. Definição de etapas e atividades a serem realizadas;

ii. Definição geral de metodologias, técnicas e instrumentos a serem utilizados nos trabalhos, de acordo com as etapas e/ou atividades;

iii. Apresentação de aspectos críticos do projeto;

iv. Definição de organograma por etapas/atividades;

v. Definição de sistema de engajamento da Equipe Técnica Intersecretarial - ETI e da Equipe de Acompanhamento – EA nas atividades;

vi. Elaboração de plano de comunicação participativa do projeto

vii. Definição de cronograma de execução e fluxos detalhados

viii. Informe Metodológico detalhando a metodologia proposta para consecução dos resultados esperados pelo Projeto, permitindo à UCP e ao BID assegurar que este aspecto será trabalhado de maneira adequada.

Atividade 105. Realização da Reunião Técnica 01. O Plano de Trabalho será apresentado na Reunião Técnica 01 com e Equipe Técnica Intersecretarial – ETI para obtenção do Plano de Trabalho Inicial (P.T.I) compilado alterações e contribuições, se houver, desde que acordadas entre os participantes, além das atas de reunião e uma lista prévia das diversas entidades que participarão das oficinas de engajamento.

Atividade 106. Disponibilização do Plano de Trabalho Inicial (P.T.I) e material elaborado para consulta pública O Plano de Trabalho Inicial (P.T.I) será analisado e aprovado pela Equipe Técnica Intersecretarial – ETI em até 07 (sete) dias úteis e retornará, se for o caso, para ajustes em um prazo de 07 (sete) dias para reapresentá-lo. Após aprovação, o documento resultado da reunião será disponibilizado no site do projeto junto com o material elaborado como informação para consultas públicas até a data de realização das Oficinas de Engajamento.

Atividade 107. Realização das Oficinas públicas de Engajamento. Serão realizadas 7 (sete) Oficinas de Engajamento para apresentação do Plano de Trabalho Inicial (P.T.I.) e definição dos representantes locais que irão compor a Equipe de Acompanhamento – EA. O resultado das Oficinas de Engajamento será a entrega do Relatório de Atividade 01: Oficinas de Engajamento e Plano de Trabalho Consolidado (RA 01).

Atividade 108. Realização da Audiência Pública de Engajamento. A Audiência Pública será realizad em três municípios a serem definidos e tem como objetivo garantir participação amplificada da população, ouvindo os seus anseios e contribuições para a construção do Plano. O resultado das Audiências Públicas de Engajamento será a entrega do Plano de Trabalho Final (P.T.F.), que é o documento resultante da compilação do Plano de

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 343

Trabalho Inicial (P.T.I.), Relatório de Atividade 01: Oficinas de Engajamento e Plano de Trabalho Consolidado (RA 01) e contribuições recebidas durante a Audiência Pública de Engajamento.

Atividade 109. Validação do Plano de Trabalho Final (P.T.F). Os documentos resultantes das ações de participação local serão disponibilizados para consulta pública através da internet. O resultado após as aprovações locais será o Plano de Trabalho Final (P.T.F) do projeto a serem apresentado no terceiro mês do projeto.

ETAPA 02. CONTEXTUALIZAÇAO

Esta etapa de trabalho tem como objetivo dispor de um **conhecimento atualizado da Região Litoral do Estado o Paraná**, com base no levantamento, compilação e análise dos dados primários e secundários de tipo ambiental, socioeconómico, cultural e institucional, referidos à área de abrangência do projeto. O diagnóstico será submetido a **audiência pública** com a finalidade de validar o resultado e incorporar os comentários e contribuições obtidas nas atividades de participação local previstas no marco do projeto.

Atividade 201. Levantamento e análise de dados secundários. A equipe de consultores recolherá as informações e realizará uma análise sistemática das fontes de consulta, identificando os fatores importantes que vão acondicionar o desenho do Plano de Desenvolvimento Sustentável do Litoral do Estado do Paraná. A coleta de dados sobre as áreas costeiras envolvidas será realizada envolvendo: (i) o meio socioterritorial e cultural; (ii) o meio ambiental e físico; (iii) as infraestruturas; (iv) o meio socioeconômico; e (v) o meio institucional. Cabe verificar, ademais, as lições aprendidas e a investigação da base legal relativa ao gerenciamento costeiro aos níveis estadual e municipal, identificando os planos, programas e projetos que se encontram em execução e previstos pelo Estado, ligados à zona costeira. Para tanto, serão revisados, entre outros, os instrumentos legais mencionados no item 4.5 do Marco Legal, dos TDR do projeto.

Atividade 202. Levantamento e análise de dados primários. A coleta de dados primários consiste na recopilação de diversos tipos de dados originais das variáveis de interesse sócio territoriais, ambientais, econômicas e institucionais relativas à região costeira do Paraná, mediante técnicas de amostragem diretas realizadas no terreno.

Atividade 203. Coleta de dados geográficos e elaboração de mapas georreferenciados. O Consórcio criará uma base de dados estatísticos, com indicadores-chave e tendências básicas, a partir das informações quantitativas disponíveis em uma plataforma SIG compatível com os sistemas de comunicação existentes nas áreas prioritárias do Projeto.

Atividade 204. Elaboração do diagnóstico e da Matriz FOFA. A equipe consultora reunirá todas as informações, na escala estadual e municipal, sobre as características físico-naturais e socioeconômicas da zona costeira, com a finalidade de orientar ações de preservação, conservação, regulamentação e fiscalização, se for o caso, a incluir no Plano de Desenvolvimento Sustentável do Paraná. O diagnóstico contemplará os seguintes conteúdos mínimos organizando e sistematizando a informação:

- Informação atualizada sobre o estado de conservação da biodiversidade da zona costeira, fazendo um balanço do conhecimento existente no campo da biologia marinha da zona de abrangência, indicando áreas de ação prioritária que serão consideradas posteriormente no zoneamento.
- Conhecimento sobre a hidrodinâmica e os processos erosivos do litoral paranaense.
- Os dados mais atualizados existentes sobre a poluição marinha causada pelas atividades e infraestruturas em terra.
- As dimensões atuais e potenciais da atividade urbano-industrial e a sua interação com o resto das atividades.
- As normas e legislação existente para a regulação do uso e proteção dos recursos costeiros e marinhos.
- As potencialidades turísticas e ecoturísticas da região do Paraná.
- A organização institucional aos níveis do Estado e dos Municípios, vinculados ao gerenciamento costeiro.

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 344

Como complemento e resumo do processo de diagnóstico, a nossa equipe propõe a elaboração de uma matriz FOFA para a identificação de Potencialidades e Vulnerabilidades da área costeira de abrangência.

Atividade 205. Benchmarking de boas práticas internacionais. Além do diagnóstico multidisciplinar da região litoral do Paraná, a nossa equipe realizará um processo de análise focado em identificar, avaliar e comparar as práticas e estratégias de desenvolvimento sustentável em regiões costeiras de características similares, com objetivo de comparar os resultados com a situação de partida do litoral do Paraná e projetar assim as prioridades de ações necessárias para melhorar a sustentabilidade da região e corrigir as ameaças e vulnerabilidades detectadas, extraindo as lições aprendidas aplicáveis ao território costeiro paranaense.

Atividade 206. Elaboração do Relatório de Contextualização Inicial (RCI). A contextualização deve ser analisada sob as condições peculiares de sazonalidade da população e tendo em vista a população projetada, bem como, as pressões de expansão urbana e de infraestrutura, sem com isto, perder de vista um cenário futuro de perenidade, buscando propor melhorias sociais e econômicas e preservação do ambiente da região do litoral. Mais do que uma descrição estática, a contextualização deve conter análises dinâmicas comparativas, permitindo situar a região em relação a outras regiões do estado e país, de tal forma, que permita dimensionar seu grau de desenvolvimento sustentável e competitividade.

Atividade 207. Realização da Reunião Técnica 02. O Relatório de Contextualização será apresentado na Reunião Técnica 02 com e Equipe Técnica Intersecretarial – ETI para obtenção do Relatório de Contextualização Inicial (RCI), que deverá ser analisado e aprovado pela Equipe Técnica Intersecretarial – ETI em até 15 (quinze) dias úteis e retornará, se for o caso, ao Consorcio para devidos ajustes em um prazo de até 15 (quinze) dias.

Atividade 208. Disponibilização do Relatório de Contextualização Inicial (RCI) e material elaborado para consulta pública. Após aprovação do Relatório de Contextualização Inicial (R.C.I.), o Consorcio disponibilizará o Relatório de Contextualização Inicial (R.C.I.) e todo o material elaborado para consulta pública através da internet, 15 (quinze) dias antes da data de realização das Oficinas de Contextualização.

Atividade 209. Realização das Oficinas públicas de Contextualização. Serão realizadas as 7 (sete) Oficinas de Contextualização nos municípios de abrangência do projeto com o intuito de submeter o Relatório de Contextualização Inicial (R.C.I.) à apreciação dos participantes da Equipe de Acompanhamento – EA estabelecidos na etapa anterior. O Relatório das Oficinas de Contextualização e Relatório de Contextualização Consolidado (RA 02) será analisado e aprovado pela Equipe Técnica Intersecretarial – ETI.

Atividade 210. Realização da Audiência Pública de Contextualização. A Audiência Pública será realizada em três locais dentro da área de abrangência do projeto, atendendo as diretrizes estabelecidas no plano de trabalho com o intuito de garantir participação amplificada da população, ouvindo os seus anseios e contribuições para a construção do Plano.

Atividade 211. Validação do Relatório de Contextualização Final (P.T.F). O resultado após as aprovações locais e consulta pública local na internet será o Relatório de Contextualização Final (R.C.F) a serem apresentado

ETAPA 03. CRIAÇAO DE CENARIOS E VISAO DE FUTURO

Esta etapa corresponde à fase de prognóstico visando a realização de projeções para o futuro com base no diagnóstico, somado às expectativas dos envolvidos, às oportunidades e potencialidades levantadas, e às restrições e riscos que poderão influenciar o PDS_LITORAL, e indica aquilo que pode ser esperado no futuro, em médio e longo prazo. No prognóstico devem ser observados os aspectos quantitativos (a partir de projeções estatísticas) e os aspectos qualitativos levantados nas oficinas e ações de planejamento participativo realizadas.

Atividade 301. Construção dos cenários de desenvolvimento sustentável. Com base nos dados secundários e primários levantados na fase anterior, monta-se um Cenário Atual, ou seja, para o ano base, constituído pela representação numérica da realidade existente, tanto dos aspectos socioeconômicos, territoriais, demográficos, ambientais e de mobilidade, entre outros. Com base nas tendências detectadas, projeta-se um Cenário Tendencial. Ao lado dele, com base nas desejadas alterações das tendências, constituindo novas políticas públicas, seja de desenvolvimento sócio-econômico-ambiental seja especificamente de uso do solo e

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 345

transporte projeta-se um Cenário Planejado ou mais de um, se for o caso, para que disputem a preferência política. Para tanto, a equipe elaborará modelos de previsão estabelecidos num horizonte de 5 anos (curto prazo), 10 anos (médio prazo) e 20 anos (longo prazo), a partir de projeções estatísticas dos indicadores levantados no diagnóstico.

Atividade 302. Formulação de visão geral de futuro para até 2035. A partir da metodologia dos cenários, será elaborada a visão de futuro para o Litoral do Paraná num horizonte de 5 anos (curto prazo), 10 anos (médio prazo) e 20 anos (longo prazo). O "exercício de visão" deverá se concentrar na identificação do cenário geral desejado e os resultados/objetivos para cada uma das áreas principais incluídas no plano, e políticas e estratégias mais amplas para alcançar esses resultados/objetivos.

Atividade 303. Objetivos e metas previstas. Em relação aos **Objetivos**, referem-se ao estado ou situação que se pretende atingir, sendo reflexos ponderados dos diferentes motivos que movem os sujeitos envolvidos no processo. Os objetivos propostos devem ser hierarquizados em função de sua importância (finalísticos ou instrumentais), mensuráveis quantitativa e qualitativamente e avaliáveis periodicamente, de forma a poder estabelecer um sistema de monitoramento e controle dos resultados obtidos. Deverá haver objetivos de médio prazo e de longo prazo (visão 2030). Para serem operacionais, os objetivos devem ser coerentes com as condições do mercado e com as disponibilidades de orçamento, controláveis e assumidos pelo conjunto dos agentes envolvidos. Finalmente, a definição das **Metas** representa uma descrição detalhada dos objetivos, elaborada de modo que possam ser medidas, tanto quanto à qualidade, como quanto à quantidade. Elas devem estar dentro das possibilidades da capacidade do setor em alcançá-las, caso contrário irão gerar situações de estresse, perda de confiança, ansiedade ou desinteresse. A realização das metas leva ao alcance dos desafios propostos, segundo os objetivos planejados, definindo-se o prazo para a sua realização.

Atividade 304. Definição dos eixos estratégicos. A atividade visa a definição dos eixos estratégicos que nortearão a construção do plano para formulação de diversos cenários prospectivos desejáveis, alternando as prioridades de cada dimensão analisada. A proposta de eixos estratégicos elaborada será ajustada em um processo de consulta local, a partir da metodologia de Avaliação Multicritério visando hierarquizar os resultados do diagnostico, as diretrizes e os projetos a serem incluídos no PDS_LITORAL.

Atividade 306. Elaboração do Relatório de Construção de Cenários e Visão de Futuro Inicial

A partir dos resultados obtidos nas atividades desta fase, será elaborado o Relatório de Construção de Cenários e Visão de Futuro Inicial (R.C.C.I) que será apresentado na **Reunião Técnica 03** com e Equipe Técnica Intersecretarial – ETI e que deverá ser validado e aprovado nas Oficinas Locais e Audiência Pública como detalhado nesta proposta para obtenção do Relatório de Construção de Cenários e Visão de Futuro Final (R.C.C.F)

Atividade 307. Realização da Reunião Técnica 03. O Relatório Relatório de Construção de Cenários e Visão de Futuro será apresentado na Reunião Técnica 03 com e Equipe Técnica Intersecretarial – ETI para obtenção do Relatório de (R.C.C.I), que será disponibilizado no site do projeto junto com o material elaborado como informação para consultas públicas.

Atividade 208. Disponibilização do Relatório de Construção de Cenários e Visão de Futuro Inicial (RCI) e material elaborado para consulta pública. Após aprovação do Relatório de Construção de Cenários e Visão de Futuro Inicial (R.C.C.I.) na etapa anterior, será disponibilizado junto com todo o material elaborado para consulta pública através da internet, até 15 (quinze) dias antes da data de realização das Oficinas de Construção de Cenários e Visão de Futuro.

Atividade 209. Realização das Oficinas públicas de Cenários e Visão de Futuro. As Oficinas de Construção de Cenários e Visão de Futuro serão realizadas nos 7 (sete) municípios integrantes da área de abrangência do PDS_LITORAL com atores sociais locais de maior representatividade e os participantes da Equipe de Acompanhamento – EA para validação do Relatório de Construção de Cenários e Visão de Futuro Inicial (R.C.C.I.).

Atividade 210. Realização da Audiência Pública de Cenários e Visão de Futuro. A Audiência Pública será realizada nos três municípios selecionados visando obter contribuições da população local no Relatório de Construção de Cenários e Visão de Futuro Inicial (R.C.C.I.). O resultado da Audiência Pública de Contextualização será a entrega do Relatório de Construção de Cenários e Visão de Futuro Final (R.C.C.F.), que

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 346

é o documento resultante da compilação do elatório de Atividade 03: Oficinas de Construção de Cenários e Visão de Futuro Contextualização e Relatório de Construção de Cenários e Visão de Futuro consolidado (RA 03) e contribuições recebidas durante a Audiência Pública de Construção de Cenários e Visão de Futuro. Deverá conter um relato das contribuições e das presenças dos participantes durante a audiência pública.

Atividade 211. Validação do Relatório de Cenários e Visão de Futuro Final (P.T.F). O resultado após as aprovações locais será o Relatório de Contextualização Final (R.C.F) a serem apresentado no mês noveno do projeto.

ETAPA 04. PLANO DE AÇAO

Esta etapa tem como objetivo o desenho das ações necessárias para garantir a implementação eficaz do Plano de Desenvolvimento Sustentável do Litoral do Paraná, bem como os instrumentos de monitoramento e controle das ações institucionais e governamentais e a forma em que se inter-relacionam. Isto permitirá não só a implementação do plano, mas a gestão adaptativa do mesmo, com base na resposta e nas mudanças observadas.

Atividade 401. Zoneamento territorial. A partir da informação de caracterização da área costeira, e tendo em conta os objetivos gerais e específicos e as metas do PDL, serão definidas **áreas homogêneas** no que diz respeito aos seus valores ecológicos, estéticos, produtivos, paisagísticos, etc., e pelas suas necessidades de gestão. Entre os critérios empregados para definir as zonas, serão empregados os seguintes:

- Presença de habitats ou espécies prioritárias ou de interesse.
- Presença de elementos culturais ou patrimoniais relevantes.
- Estado de conservação dos habitats naturais.
- Fragilidade e vulnerabilidade dos ecossistemas.
- Presença de atividades produtivas de sustento para as comunidades locais.
- Presença de infraestruturas chave.
- Valor paisagístico e turístico.
- Presença de usos tradicionais compatíveis com a conservação.
- Estado degradado ou contaminado de uma zona que precisa ações de restauração.
- Capacidade de proteção e resiliência ante as perturbações.

Com base nos critérios mencionados, serão estabelecidas **tipologias de zonas** nas quais serão permitidos ou regulados determinados usos, e aquelas que requerem de ações de melhora, investimento ou restauração com vistas a conservação total, parcial ou compatibilidade com as atividades humanas, e também zonas de amortecimento no entorno das áreas naturais e turísticas de maior valor.

Atividade 402. Definição de programas e propostas de ação. Nesta etapa serão definidos os programas e metas de desenvolvimento sustentável para a região costeira do Paraná, de modo a compatibilizar as questões relacionadas aos riscos e vulnerabilidades ambientais e sociais traçadas pelos cenários futuros, e o crescimento sustentável. As ações propostas devem ser agrupadas nos eixos de intervenção estabelecidos, preparando-se uma descrição do seu conjunto, com as seguintes indicações:

n) Descrição do produto;
o) Objetivo;
p) Justificativa;
q) Descrição da ação;
r) Prazo de execução estimado (ou previsão de continuidade);
s) Previsão de custos;
t) Análise legal (arcabouço jurídico) quanto aos aspectos ambientais, culturais, sociais, administrativo, financeiro;
u) Fontes de Investimentos (nacional e internacional);
v) Modelo de gestão (público, privado, concessão, parceria público-privado);
w) Impactos econômicos e sociais esperados na Região;

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 347

x) Impactos na geração de empregos e qualificação;
y) Análise de viabilidade físico-financeira quanto à sua execução;
z) Principais atores privados e públicos envolvidos.

O conjunto dos Planos Operacionais deverá gerar um **caderno de aplicação**, incluindo a respectiva análise de viabilidade físico-financeira quanto a execução de cada um dos Planos, bem como seu cronograma físico-financeiro de implementação, considerando, ainda, a estimativa dos investimentos necessários, suas fontes e modos de captação.

Atividade 403. Definição de estratégias de financiamento viáveis. Serão elaboradas **fichas de investimento** específicas para cada uma das ações do PDL nas que se contabilizarão os custos de implementação, monitoramento e avaliação, bem como as oportunidades de empreendimento e desenvolvimento de inciativas locais e as opções de financiamento viáveis para cada ação, detalhando:

- Descrição do investimento
- Tipo de investimento (obras, infraestruturas, melhora institucional, capacitação, formação, promoção, restauração, conservação, etc.)
- Custos associados a implementação.
- Opções de financiamento, indicando: se são públicas, privadas ou em parceria, as entidades implicadas, as formas de aplicação.
- Os documentos necessários para a aplicação.
- A temporalidade ou periodicidade do chamamento para a apresentação de aplicativos.

Atividade 404. Definição de estratégia institucional e de gestão. Esta atividade consiste na elaboração de um quadro institucional apropriado para gerenciar a implementação, revisão e atualização do PDL, tanto no curto, como no médio e longo prazo. Para isto se estabelecerá um organograma organizativo no qual estejam representadas as partes interessadas para levar a cabo este gerenciamento do Plano de forma participada e com consenso.

Atividade 405. Estabelecimento de indicadores de monitoramento e avaliação. Esta fase tem por objetivo promover o monitoramento da evolução do Projeto, o acompanhamento e a avaliação dos resultados. Com esta finalidade será elaborada uma matriz de indicadores de desempenho do Projeto, tendo como linha de base o período inicial dos trabalhos, indo até a sua conclusão. A **seleção de indicadores** deverá ser realizada de forma **participada** com os atores implicados no gerenciamento costeiro e os agentes interessados, compartindo a visão estratégica proposta para o litoral de Paraná.

Atividade 406. Elaboração do Relatório do Plano de Ação Inicial (RPAI). A partir dos resultados obtidos nas atividades desta fase, será elaborado o Relatório do Plano de Ação Inicial (R.P.A.I)

Atividade 407. Realização da Reunião Técnica 04. Apresentação do Relatório do Plano de Ação Inicial (R.P.A.I) com a Equipe Técnica Intersecretarial – ETI para disponibilização posterior e validação nas oficinas locais e audiência pública.

Atividade 408. Disponibilização do Relatório de Plano de Ação Inicial e material elaborado para consulta pública Após aprovação do Relatório do Plano de Ação Inicial (R.P.A.I) na etapa anterior, será disponibilizado junto com todo o material elaborado para consulta pública através da internet, até 15 (quinze) dias antes da data de realização das Oficinas de Plano de Ação Inicial.

Atividade 409. Realização das Oficinas públicas de Plano de Ação. As Oficinas de Plano de Açao serão realizadas nos 7 (sete) municípios integrantes da área de abrangência do PDS_LITORAL com atores sociais locais de maior representatividade e os participantes da Equipe de Acompanhamento – EA para validação do Relatório do Plano de Ação Inicial (R.P.A.I).

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 348

Atividade 410. Realização da Audiência Pública de Plano de Ação. A Audiência Pública será realizada nos três municípios selecionados visando obter contribuições da população local no Relatório do Plano de Ação Inicial (R.P.A.I).
Atividade 411. Validação do Relatório de Plano de Ação Final (P.D.A.F). O resultado após as aprovações locais será o Relatório de Plano de Ação Final (R.P.A.F) a serem apresentado no mês onze (11) do projeto.

ETAPA 05. CONFERENCIA REGIONAL

Atividade 501. Elaboração do documento final do Plano. O documento final trata-se do documento consolidado e editorado, atendendo plenamente e satisfatoriamente a todos os itens previstos no Termo de Referência do projeto. O Consorcio entregará uma lista sugerindo a quantidade e destinatários das cópias do documento final, bem como, uma prévia do documento final para a Equipe Técnica Intersecretarial – ETI.
Atividade 502. Revisão do documento final do Plano. A lista e o documento prévio serão avaliados em até 15 (quinze) dias e se necessário, retomará à contratada para no prazo máximo de 07 (cinco) dias proceda às correções.

Atividade 503. Organização da Conferência Regional. Após aprovaçao, serao iniciado os trabalhos para realizaçao da Conferência Regional em pelo menos um município e com a participação mínima de um representante de cada setor da sociedade, apontada previamente no Plano de Trabalho e divulgada amplamente para todos os envolvidos. A Conferência Regional celebra o fim dos trabalhos de elaboração do plano e a entrega do documento final.

4.2.3. Lista de produtos

PRODUTO 1 Plano de Trabalho Inicial (P.T.I.),	Deverá conter: – Atas de Reunião Técnica 01 – Lista prévia das diversas entidades que participarão das oficinas de engajamento
PRODUTO 2 Relatório de Atividade 01: Oficinas de Engajamento e Plano de Trabalho Consolidado (RA 01)	De cada uma das oficinas de engajamento: ▪ Lista de Presença, contendo nomes, instituição e informações de contato; ▪ Ata da reunião que contenha a transcrição das contribuições de cada município; ▪ Relatórios fotográficos; ▪ Relatórios e entrevistas em vídeo; ▪ Lista dos Integrantes das Equipes de Acompanhamento - EA; ▪ Outras informações pertinentes. Plano de trabalho Consolidado: ▪ Plano de trabalho avaliado e compilado com as contribuições das oficinas de engajamento. ▪ Definição do local e listagem prévia dos participantes da Audiência Pública Inicial.
PRODUTO 3 Plano de Trabalho Final (P.T.F.),	Consiste no documento resultante da: ▪ Compilação do Plano de Trabalho Inicial (P.T.I.), ▪ Relatório de Atividade 01: Oficinas de Engajamento e Plano de Trabalho Consolidado (RA 01) ▪ Contribuições recebidas durante a Audiência Pública de Engajamento. Deverá conter um relato das contribuições e das presenças dos participantes durante a audiência pública.
PRODUTO 4 Relatório de Contextualização Inicial (R.C.I.)	A contextualização deverá abordar, no mínimo, as seguintes dimensões: sócio territorial, ambiental, infraestrutura, econômica e institucional,

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 349

	Informações indispensáveis para a análise e compreensão de condições peculiares à região estudada, integrando todas as informações e documentos colhidos em uma base de dados e em plataforma tecnológica integrada, mapeada e georreferenciada, permitindo o geoprocessamento das informações, o melhor conhecimento e gestão inteligente do território.
PRODUTO 5 Relatório de Atividade 02: Oficinas de Contextualização e Relatório de Contextualização Consolidado (RA 02).	De cada uma das oficinas de contextualização: • Lista de Presença, contendo nomes, instituição e informações de contato; • Ata da reunião que contenha a transcrição das contribuições de cada oficina; • Relatórios fotográficos; • Relatórios e entrevistas em vídeo; • Lista dos Integrantes das Equipes de Acompanhamento - EA; • Outras informações pertinentes. Relatório de Contextualização Consolidado: • Contextualização da Região avaliado e compilado com as contribuições das oficinas de e contextualização. • Definição do local e listagem prévia dos participantes da Audiência Pública de Contextualização da Região.
PRODUTO 6 Relatório de Contextualização Final (R.C.F.),	Consiste no documento resultante da: – Compilação do Relatório de Contextualização Inicial (R.C.I.), – Relatório de Atividade 02: Oficinas de Contextualização e Relatório de Contextualização Consolidado (RA 02) – Contribuições recebidas durante a Audiência Pública de Contextualização. Deverá conter um relato das contribuições e das presenças dos participantes durante a audiência pública.
PRODUTO 7 Relatório de Construção de Cenários e Visão de Futuro Inicial (R.C.C.I.)	A contratada deverá apresentar um conjunto prepositivo de diretrizes, objetivos e metas, que contemple: • Eixos estratégicos orientadores do Plano; • Formulação de visão geral de futuro para até 2035; • Previsão detalhada dos cenários de desenvolvimento sustentável; • Os efeitos/impactos no meio natural e comunidades (pesqueiras, rurais, tradicionais, quilombolas e indígenas); • Esboço dos princípios orientadores do Plano; • Metas previstas e as políticas do Plano; e • Realização de uma extensa consulta com as partes interessadas.
PRODUTO 8 Relatório de Atividade 03: Oficinas de Construção de Cenários e Visão de Futuro Contextualização e Relatório de Construção de Cenários e Visão de Futuro consolidado (RA 03).	De cada uma das Oficinas de Construção de Cenários e Visão de Futuro: • Lista de Presença, contendo nomes, instituição e informações de contato; • Ata da reunião que contenha a transcrição das contribuições de cada oficina; • Relatórios fotográficos; • Relatórios e entrevistas em vídeo; • Lista dos Integrantes das Equipes de Acompanhamento - EA; • Outras informações pertinentes. Relatório Construção de Cenários e Visão de Futuro Consolidado: • Relatório Construção de Cenários e Visão de Futuro avaliado e compilado com as contribuições das oficinas. • Definição do local e listagem prévia dos participantes da Audiência Pública de Construção de Cenários e Visão de Futuro
PRODUTO 9 Relatório de Construção de Cenários e Visão de	Consiste no documento resultante da: – Compilação do Relatório de Construção de Cenários e Visão de Futuro Inicial (R.C.C.I.),

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 350

Futuro Final (R.C.C.F.),	– Relatório de Atividade 03: Oficinas de Construção de Cenários e Visão de Futuro Contextualização e Relatório de Construção de Cenários e Visão de Futuro consolidado (RA 03) – Contribuições recebidas durante a Audiência Pública de Construção de Cenários e Visão de Futuro.
PRODUTO 10 Relatório do Plano de Ação Inicial (R.P.A.I.)	Contendo propostas para intervenções físicas, estudos complementares e ações institucionais, de curto, médio e longo prazo, focando nas seguintes áreas: ▪ Identificação e localização das zonas funcionais (existentes e propostas) que serão necessárias para acomodar o crescimento demográfico e econômico projetado para a área do Litoral. ▪ Zonas ambientais/ecológicas para preservação ▪ Áreas vulneráveis à mudança climática ▪ Zonas históricas, culturais e arqueológicas para preservação (existentes e propostas) e instrumentos de salvaguarda e estratégias de valorização propostas. ▪ Rede principal de transporte (existente e proposta) das zonas funcionais do projeto. ▪ Localização de investimentos-chave em infraestrutura urbana nas áreas funcionais do projeto visando apoiar o crescimento da área do Litoral. ▪ Identificar áreas informais/de baixa renda para o aprimoramento de programas de desenvolvimento social. ▪ Definição de padrões de desenvolvimento para planejamento urbano voltados à forma de construção, utilização de terra, espaço público, áreas verdes, mobilidade não motorizada, e a prestação de serviços públicos básicos (educação, saúde e esportes). ▪ Identificação de unidades de conservação atuais e futuras e formação de corredores ecológicos e as áreas intocáveis; ▪ Identificação de outras iniciativas que irão apoiar a visão para a área do Litoral a Longo Prazo.
PRODUTO 11 Relatório de Atividade 04: Oficinas do Plano de Ação e Relatório do Plano de Ação Consolidado (RA 04).	De cada uma das Oficinas do Plano de Ação: ▪ Lista de Presença, contendo nomes, instituição e informações de contato; ▪ Ata da reunião que contenha a transcrição das contribuições de cada oficina; ▪ Relatórios fotográficos; Relatórios e entrevistas em vídeo; ▪ Lista dos Integrantes das Equipes de Acompanhamento - EA; ▪ Outras informações pertinentes Relatório do Plano de Ação Consolidado: ▪ Relatório do Plano de Ação avaliado e compilado com as contribuições das oficinas. ▪ Definição do local e listagem prévia dos participantes da Audiência Pública do Plano de Ação.
PRODUTO 12 Relatório do Plano de Ação Final (R.P.A.F.),	Consiste no documento resultante da: – Compilação do Relatório do Plano de Ação Inicial (R.P.A.I.), – Relatório de Atividade 04: Oficinas do Plano de Ação e Relatório do Plano de Ação Consolidado (RA 04) – Contribuições recebidas durante a Audiência Pública do Plano de Ação
PRODUTO 13 Documento Final.	O documento final trata do documento consolidado e editorado, atendendo plenamente e satisfatoriamente a todos os itens previstos no Termo de Referência.

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 351

Os produtos serão escritos em língua portuguesa lida e falada no Brasil.

Cumpre destacar que todos os produtos serão inicialmente apresentados em 03 cópias impressas e encadernadas em volume único e 01 cópia em meio digital, em formato PDF, além da publicação posterior às aprovações na internet, através de website.

C - ORGANIZAÇÃO E DOTAÇÃO DE PESSOAL - QUANTA

4.3.1. Organograma

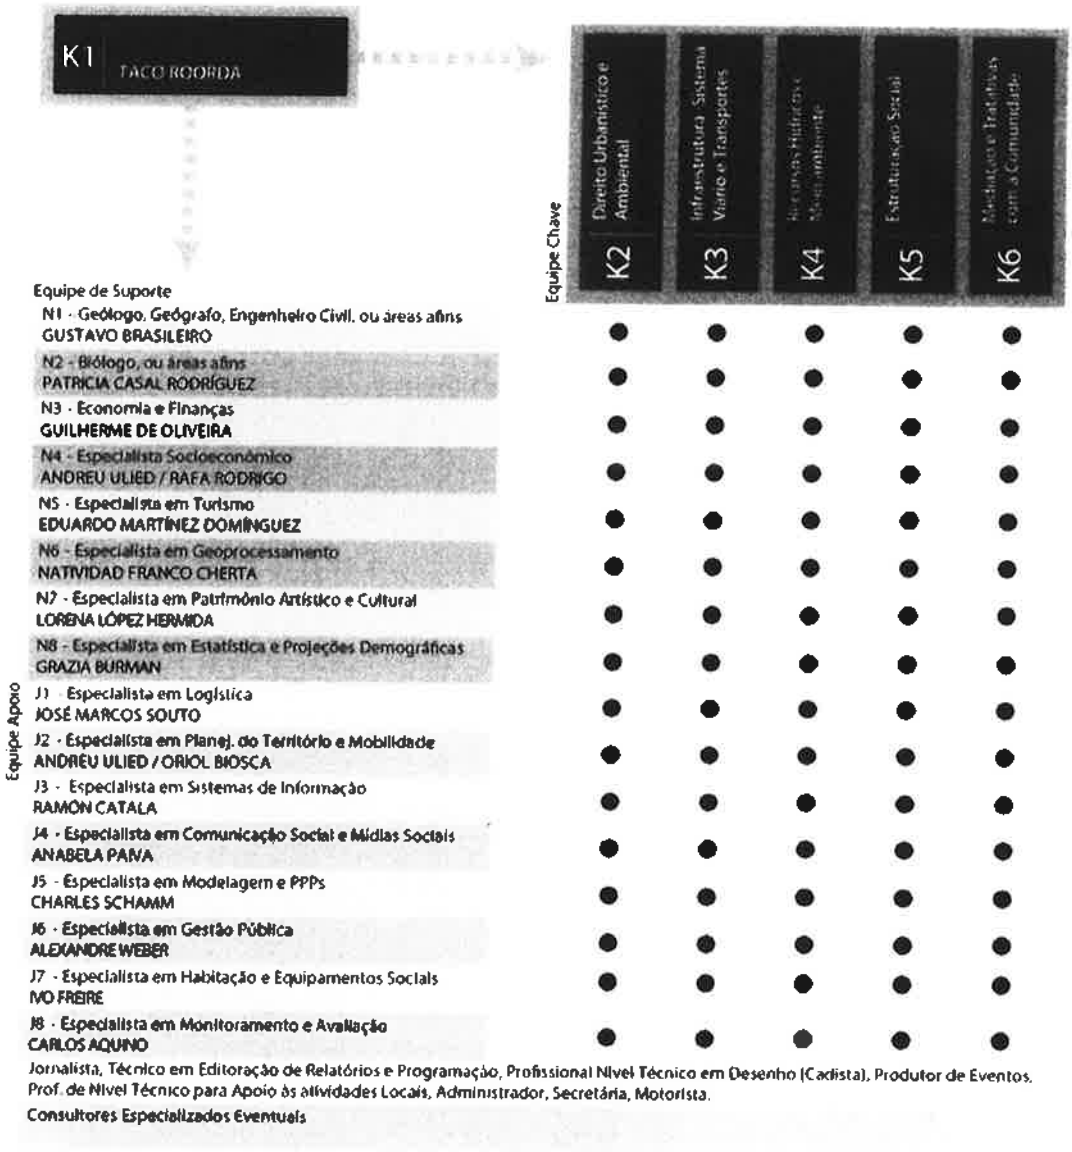

4.3.2. Composição da Equipe

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 352

Equipe	Função no Projeto	Nome do Profissional
(K1) Coordenação e Macrozoneamento Regional	Responsável pelo Planejamento e Coordenação de todas as atividades e pela emissão final dos documentos. É o representante do Consórcio perante o Cliente.	Taco Roorda
(K2) Direito Urbanístico e Ambiental	Executa trabalhos e coordena assuntos da área de Direito Urbano e Ambiental, observados os marcos regulatórios da gestão urbana nas esferas federal, estadual e municipal. Apoiará em questões, dentre outras, as relativas à definição de competências institucionais, instrumentos de regulação de uso do solo e de desenvolvimento imobiliário, tributação e incentivos.	Nereo Cardoso
(K3) Infraestrutura – Sistema Viário e Transportes	Executa trabalhos e coordena assuntos da área de Sistema Viário e Transportes, com foco na mobilidade, acessibilidade e multimodalidade no transporte de passageiros, mas também sob o aspecto do transporte e logística de carga da Reglão.	Andreu Esquius
(K4) Recursos Hídricos e Meio Ambiente	Executa trabalhos e coordena assuntos da área de Recursos Hídricos e Meio Ambiente e terá apoio dos especialistas em Meio Ambiente e Patrimônio Histórico e Cultural. É o responsável direto pelos assuntos relacionados com: hidrografia, hidrologia, áreas de risco, unidades de Conservação, fauna e flora.	Fernando Lopez
(K5) Estruturação Social	Executa trabalhos e coordena assuntos na área de diagnóstico sócio territorial.	Verônica Ferreira
(K6) Mediação e Tratativas com a Comunidade	Executa trabalhos e coordena assuntos relacionados a área institucional no desenho e implementação de políticas públicas, responsável pela articulação entre os envolvidos no Plano e pelo encaminhamento das oficinas temáticas e audiências públicas.	Pedro Strozemberg
(N1) Engenheiro Civil	Executa trabalhos ou apoia assuntos da área de infraestrutura, apoiando a área de Sistema Viário e Transportes e reportando-se ao Especialista em Recursos Hídricos e Meio Ambiente e para assuntos relacionados a riscos climáticos e riscos geotécnicos.	Gustavo Coelho
(N2) Biólogo	Executa trabalhos ou apoia assuntos da área de Meio Ambiente, Fauna e Flora, Unidades de Conservação e estudos de impactos ambientais.	Patrícia Casal Rodriguez

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 353

Equipe	Função no Projeto	Nome do Profissional
(N3) Economia e Finanças	Executa trabalhos ou apoia assuntos relacionados a Economia e Finanças Públicas. Exercerá, dentre outras atribuições, a conciliação dos aspectos econômicos e financeiros, dentro das limitações da administração pública, na elaboração das estratégias propostas.	Guilherme de Oliveira
(N4) Especialista Socioeconômico	Executa trabalhos ou apoia na análise de elementos socioeconômicos.	Andreu Ulied / Rafa Rodrigo
(N5) Especialista em Turismo	Executa trabalhos ou apoia assuntos das áreas de Patrimônio Artístico e Cultural.	Eduardo Martínez Domínguez
(N6) Especialista em Geoprocessamento	Executa trabalhos ou apoia as áreas pertinentes, para o tratamento e armazenamento de dados em sistemas georreferenciados.	Natividad Franco Cherta
(N7) Especialista em Patrimônio Artístico e Cultural	Executa trabalhos ou apoia assuntos relativos aos programas e projetos de gestão do patrimônio artístico e cultural. Apoiando ainda questões relacionadas ao tema Turismo.	Lorena López Hermida
(N8) Especialista em Estatística e Projeções Demográficas	Executa trabalhos ou apoia os estudos de transporte, logística, econômicos, ambientais, urbanísticos e da geografia humana, dentre outros, naquilo em que forem necessários estudos e pareceres estatísticos.	Grazia Burman
(J1) Especialista em Logística	Executa trabalhos ou apoia na área de logística trabalhando de forma conjugada com o especialista em transporte. Avaliará a inserção da região nos eixos logísticos nacionais, o seu papel nacional na Logística e Transportes. Examinará e opinará sobre os gargalos logísticos avaliando a intermodalidade e o desempenho dos portos como interfaces ao comércio internacional e à navegação de cabotagem, sob o ponto de vista da logística.	José Marcos Souto
(J2) Especialista em Planejamento do Território e Mobilidade	Executa trabalhos ou apoia assuntos da área de Sistema Viário e Transportes, integrando questões sobre planeamento, centralidades, habitação e mobilidade.	Andreu Ulied / Oriol Biosca

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 354

Equipe	Função no Projeto	Nome do Profissional
(J3) Especialista em Sistemas de Informação	Executa trabalhos ou apoia estudo na área de planejamento, obtenção, processamento, armazenamento e divulgação da informação; tanto aquelas relativas à elaboração do Plano, como o Planejamento do sistema de informações inerente a sua implantação.	Ramón Catala
(J4) Especialista em Comunicação Social e Mídias Sociais	Executa trabalhos ou apoia assuntos de sua área, no desenho e planejamento da implantação de programas de comunicação e divulgação de grande escala e complexidade.	Anabela Paiva
(J5) Especialista em Modelagem e PPPs	Executa trabalhos ou apoia na organização e avaliação de orçamentos de despesas de custeio e investimentos públicos, políticas fiscais, programas de investimento e alternativas de financiamento públicos e público/privados.	Charles Schamm
(J6) Especialista em Gestão Pública	Executa trabalhos ou apoia no tratamento dos mecanismos de participação e comunicação, dos Arranjos Institucionais, Mecanismos de Participação, Sistema de Informação, Ajustes Jurídicos e Programas Complementares.	Alexandre Weber
(J7) Especialista em Habitação e Equipamentos Sociais	Executa ou apoia os estudos na área habitacional, integrado no planejamento urbano. Analisará políticas e planos habitacionais, dentro da diversidade social da área, com atenção às comunidades carentes e sua reurbanização. Proporá soluções.	Ivo Freire
(J8) Especialista em Monitoramento e Avaliação	Elaborará a construção dos indicadores na gestão pública para o acompanhamento dos programas multissetoriais a serem implantados pelo Plano, bem como sugerirá mecanismos de monitoramento e avaliação.	Carlos Aquino
(J9) Jornalista	Apoia no registro de eventos, redação de textos para divulgação e comunicação	-
(J10) Técnico em Editoração de Relatórios e Programação Visual	Apoio em reuniões, seminários, palestras e emissão de relatórios.	-
(J11) Profissional Nível Técnico em Desenho (Cadista)	Apoio na elaboração de desenhos informatizados.	-

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 355

Equipe	Função no Projeto	Nome do Profissional
(J12) Produtor de Eventos	Apoio na organização de palestras, oficinas e audiências.	-
(J13) Profissionais de Nível Técnico para Apoio às atividades Locais	Apoio na organização de palestras, oficinas e audiências.	-
Administrador	Apoia na Administração do contrato.	-
Secretária	Apoio ao Coordenador Geral e Especialistas.	-
Motorista	Apoio ao transporte individual a equipe.	-

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 356

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 357

4.3.3. Matriz de Responsabilidade

PRODUTO	EQUIPE CHAVE						EQUIPE DE SUPORTE								EQUIPE DE APOIO
	Coord Geral e Planejamento	Direito Urbanístico e Ambiental	Infraestrutura e Sistema Viário	Recursos Hídricos e M. A.	Estruturação Social	Mobilização e fortalecimento comunitário	Geólogo, Geógrafo, Engenheiro Civil, ou áreas afins	Biólogo ou áreas afins	Economista e Finanças	Especialista em turismo	Especialista em turismo	Especialista em geoprocessamento	Especialista em patrimônio artístico e cultural	Especialista em estatística e projeções demográficas	
001 - Providências Iniciais e Mobilização	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	E	E	E	E	A
002 - Acompanhamento gerencial do contrato	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	E	E	E	E	A
003 - Reunião de partida (Kick-off meeting)	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	E	E	E	E	A
101 - Identificação e levantamento das informações existentes	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	E	E	E	E	A
102 - Desenho das ferramentas de comunicação do projeto	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	E	E	E	E	A
103 - Elaboração do plano de comunicação	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	E	E	E	E	A
104 - Elaboração do plano de trabalho	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	E	E	E	E	A
105 - Realização da Reunião Técnica 1	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	E	E	E	E	A
106 - Disponibilização do Plano de Trabalho Inicial (P.T.I) e material elaborado para consulta pública	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	E	E	E	E	A
107 - Realização das (3) Oficinas públicas de Engajamento (R.A.O.E.)	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	E	E	E	E	A
108 - Audiência Pública de Engajamento	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	E	E	E	E	A
109 - Validação do Plano de Trabalho Final (P.T.F)	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	E	E	E	E	A
201 - Levantamentos e análise de dados secundários	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	E	E	E	E	A
202 - Levantamentos e análise de dados primários	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	E	E	E	E	A
203 - Elaboração de mapas georreferenciados para interpretação dos dados.	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	E	E	E	E	A
204 - Elaboração de diagnóstico e da matriz FOFA	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	E	E	E	E	A
205 - Elaboração de benchmark para identificação de boas práticas internacionais	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	E	E	E	E	A
206 - Elaboração do Relatório de Contextualização Inicial (RCI)	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	E	E	E	E	A
207 - Realização da Reunião Técnica 2	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	E	E	E	E	A
208 - Disponibilização do Relatório de Contextualização Inicial (RCI) e material elaborado para consulta pública	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	E	E	E	E	A
209 - Realização das (3) Oficinas públicas de Contextualização (R.A.O.C.)	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	E	E	E	E	A
210 - Audiência Pública de Contextualização	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	E	E	E	E	A
211 - Validação do Relatório de Contextualização Final (R.C.F)	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	E	E	E	E	A
301 - Construção dos cenários de desenvolvimento sustentável e avaliação de impactos	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	E	E	E	E	A
302 - Formulação de visão geral de futuro para até 2035	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	E	E	E	E	A
303 - Estabelecimento de objetivos e metas previstas	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	E	E	E	E	A
304 - Definição dos eixos estratégicos e princípios orientadores do Plano	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	E	E	E	E	A
305 - Processo de consulta com os atores locais	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	E	E	E	E	A
306 - Elaboração do Relatório de Construção de Cenários e Visão de Futuro Inicial (R.C.C.I.)	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	E	E	E	E	A
307 - Realização da Reunião Técnica 03	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	E	E	E	E	A
308 - Disponibilização do R.C.I. de Construção de Cenários e Visão de Futuro Inicial e material elaborado para consulta pública (R.C.C.I.)	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	E	E	E	E	A
309 - Realização das (3) Oficinas públicas de Construção de Cenários e Visão de Futuro Inicial (R.O.C.C.I.)	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	E	E	E	E	A
310 - Audiência Pública de Construção de Cenários e Visão de Futuro	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	E	E	E	E	A
311 - Validação do Relatório de Construção de Cenários e Visão de Futuro Final (R.C.C.F.)	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	E	E	E	E	A
401 - Zoneamento territorial	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	E	E	E	E	A
402 - Definição de programas e propostas de ação	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	E	E	E	E	A
403 - Definição de estratégias de financiamento viáveis	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	E	E	E	E	A
404 - Definição da estrutura institucional e de gestão	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	E	E	E	E	A
405 - Definição dos mecanismos de monitoramento e controle de ações governamentais	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	E	E	E	E	A
406 - Elaboração do Relatório de Plano de Ação Inicial (R.P.A.I.)	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	E	E	E	E	A
407 - Realização da Reunião Técnica 4	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	E	E	E	E	A
408 - Disponibilização do Relatório de Plano de Ação Inicial (R.P.A.I.) e material elaborado para consulta pública	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	E	E	E	E	A
409 - Realização das (2) Oficinas públicas de Plano de Ação Inicial (R.P.A.I.)	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	E	E	E	E	A
410 - Audiência Pública de Plano de Ação Inicial (R.P.A.I.)	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	E	E	E	E	A
411 - Validação do Relatório de Plano de Ação Final (R.P.A.F.)	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	E	E	E	E	A
501 - Elaboração do documento final do Plano	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	E	E	E	E	A
502 - Apresentação e revisão do documento final	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	E	E	E	E	A
503 - Realização da Conferência Regional	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	E	E	E	E	A

C COORD. GERAL
C COORD. SETORIAL
E EXECUTA
A APOIA

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

PROJETO MULTISSETORIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO PARANÁ

Empréstimo Nº 8201-BR

Solicitação de Proposta Nº: 02/2015
Elaboração Do Plano Para O Desenvolvimento Sustentável Do Litoral Do Estado Do Paraná

PROPOSTA TÉCNICA
(Original)

TEC-5

BARCELONABRASILGROUP

Mcrit hidria ciencia, ambiente y desarrollo Quanta CONSULTORIA

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 358

TEC – 5

CRONOGRAMA DO TRABALHO E PLANEJAMENTO PARA OS PRODUTOS

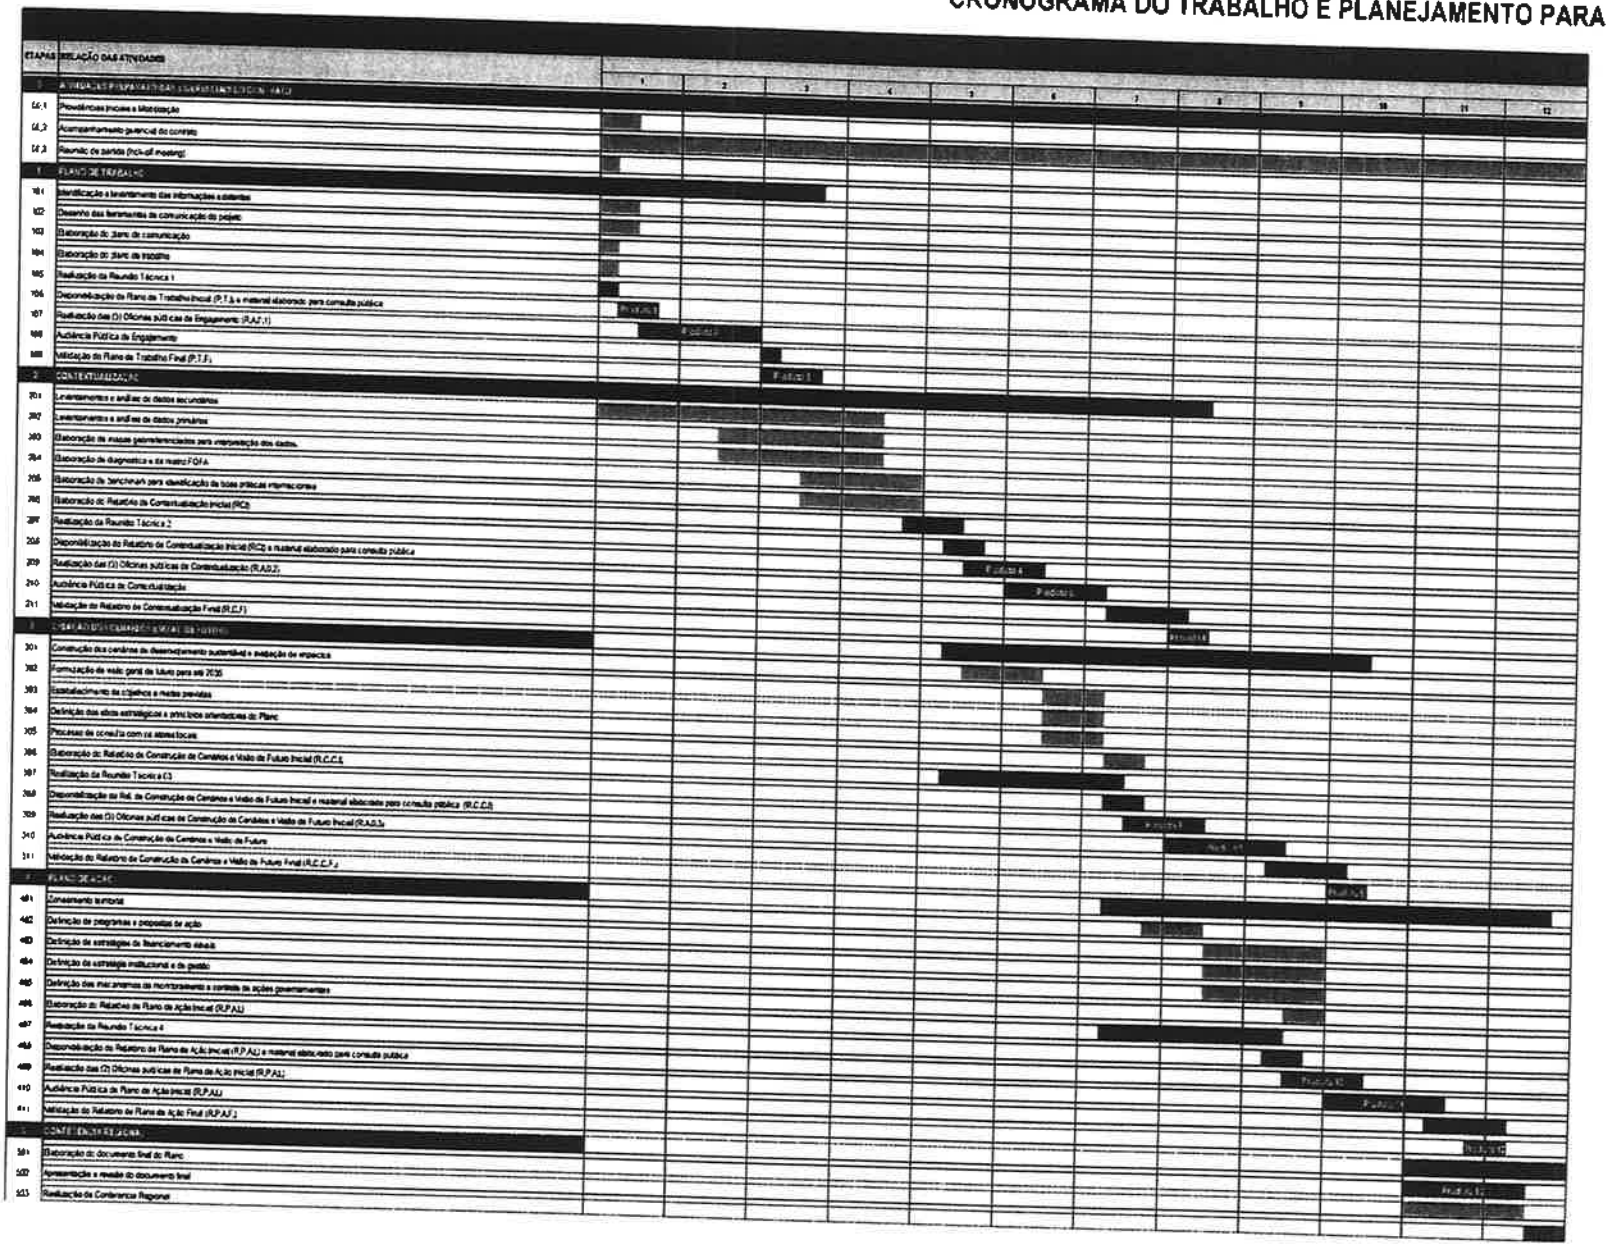

Legenda:

- Atividades SDP
- Atividades Adicionais propostas pelo Consórcio

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 359

APÊNDICE B

Composição das equipes e Currículo Vitae baseado nas experiências dos especialistas principais

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 360

APÊNDICE B

COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES E CURRÍCULO VITAE BASEADO NAS EXPERIÊNCIAS DOS ESPECIALISTAS PRINCIPAIS

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - 4º andar - Ala C - 80.530-140 - Curitiba - Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 - Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 361

A- COMPOSIÇÃO DA EQUIPE

COMPOSIÇÃO DA EQUIPE, SERVIÇO E INSUMOS DOS ESPECIALISTAS PRINCIPAIS

Nº	Nome	Cargo	Insumo do especialista (em pessoa/mês) para cada Produto (listado em TEC-5)														Insumo total do tempo (em meses)		
				Produto 1	Produto 2	Produto 3	Produto 4	Produto 5	Produto 6	Produto 7	Produto 8	Produto 9	Produto 10	Produto 11	Produto 12	Produto 13	Fora	Campo	Total
EQUIPE CHAVE																			
E-1	[illegible]	[illegible]	(Sede)	0,95	0,95	0,95	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,95	0,95	0,95	12,00	0	12,00
			(Campo)																
E-2	[illegible]	[illegible]	(Sede)	0,75	0,75	0,75	0,60	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,75	0,75	0,75	9,00	0	9,00
			(Campo)																
E-3	[illegible]	[illegible]	(Sede)	0,60	0,60	0,60	0,45	0,45	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,60	0,60	0,60	7,00	0	7,00
			(Campo)																
E-4	[illegible]	[illegible]	(Sede)	0,55	0,55	0,55	0,50	0,50	0,50	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	7,00	0	7,00
			(Campo)																
E-5	[illegible]	[illegible]	(Sede)	0,70	0,70	0,70	0,65	0,65	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	9,00	0	9,00
			(Campo)																
E-6	[illegible]	[illegible]	(Sede)	0,70	0,70	0,70	0,65	0,65	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	9,00	0	9,00
			(Campo)																
EQUIPE DE SUPORTE																			
E-1	[illegible]	[illegible]	(Sede)	-	0,50	0,50	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,50	0,60	0,60	0,60	8,00	0	8,00
			(Campo)																
E-2	[illegible]	[illegible]	(Sede)	-	0,50	0,50	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,50	0,60	0,60	0,60	8,00	0	8,00
			(Campo)																
E-3	[illegible]	[illegible]	(Sede)	-	0,50	0,50	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,50	0,60	0,60	0,60	8,00	0	8,00
			(Campo)																
E-4	[illegible]	[illegible]	(Sede)	-	0,35	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,40	0,40	0,40	4,00		4,00
			(Campo)																
E-5	[illegible]	[illegible]	(Sede)	-	0,50	0,50	0,48	0,48	0,48	0,45	0,45	0,45	0,50	0,60	0,60	0,60	8,00	0	8,00
			(Campo)																
E-6	[illegible]	[illegible]	(Sede)	-	0,50	0,50	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,50	0,60	0,60	0,60	8,00	0	8,00
			(Campo)																
E-7	[illegible]	[illegible]	(Sede)	-	0,35	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,40	0,40	0,40	4,00		4,00
			(Campo)																
N-1	[illegible]	[illegible]	(Sede)	-	0,50	0,50	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,50	0,60	0,60	0,60	8,00	0	8,00
			(Campo)																
EQUIPE DE APOIO																			
E-1	[illegible]	[illegible]	(Sede)	-	0,30	0,30	0,30	0,30	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	4,00		4,00
			(Campo)															0	
E-2	[illegible]	[illegible]	(Sede)	-	0,30	0,30	0,30	0,30	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	4,00		4,00
			(Campo)															0	
E-3	[illegible]	[illegible]	(Sede)	-	0,30	0,30	0,30	0,30	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	4,00		4,00
			(Campo)															0	
E-4	[illegible]	[illegible]	(Sede)	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	12,00		12,00
			(Campo)															0	
E-5	[illegible]	[illegible]	(Sede)	-	0,30	0,30	0,30	0,30	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	4,00		4,00
			(Campo)															0	
E-6	[illegible]	[illegible]	(Sede)	-	0,45	0,45	0,45	0,45	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,55	0,55	0,55	8,00		8,00
			(Campo)															0	
E-7	[illegible]	[illegible]	(Sede)	-	0,45	0,45	0,45	0,45	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,55	0,55	0,55	8,00		8,00
			(Campo)															0	
E-8	[illegible]	[illegible]	(Sede)	-	-	-	-	-	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	4,00		4,00
			(Campo)															0	
E-9	[illegible]	[illegible]	(Sede)	-	0,35	0,35	0,60	0,65	0,65	0,65	0,70	0,70	0,70	0,75	0,75	0,75	8,00		8,00
			(Campo)															0	
E-10	[illegible]	[illegible]	(Sede)	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	12,00		12,00
			(Campo)															0	
E-11	[illegible]	[illegible]	(Sede)	-	0,70	0,70	0,70	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,80	0,80	0,80	9,00		9,00
			(Campo)															0	
E-12	[illegible]	[illegible]	(Sede)	-	0,35	0,35	0,60	0,65	0,65	0,65	0,70	0,70	0,70	0,75	0,75	0,75	8,00		8,00
			(Campo)															0	
E-13	[illegible]	[illegible]	(Sede)	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	12,00		12,00
			(Campo)															0	
E-14	[illegible]	[illegible]	(Sede)	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	12,00		12,00
			(Campo)															0	
E-15	[illegible]	[illegible]	(Sede)	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	12,00		12,00
			(Campo)															0	
E-16	[illegible]	[illegible]	(Sede)	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	12,00		12,00
			(Campo)															0	
CONSULTORES ESPECIALIZADOS																			
Consultores Especialistas em Treinamento			(Sede)	-	-	-	-	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00		6,00		6,00
			(Campo)															0	

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 362

BARCELONABRASILGROUP Mcrit hidria Quanta

CURRICULUM VITAE (CV)

Título e nº do cargo	K-01, Coordenação e Macrozoneamento
Nome do Especialista:	Taco Roorda
Data de nascimento:	13/06/1949
País de origem/residência	Holanda / Brasil

Educação:

Instituição	Título (s) ou Diploma (s) obtido:
Universidade Federal do Paraná, Curitiba-PR (1973)	Arquiteto e Urbanista

Registro histórico de empregos relevante para o serviço:

Período	Organização empregadora e seu cargo/posição. Informações de contato para referência	País	Resumo das atividades desempenhadas relevantes para o Serviço
1979-2016	Sócio administrador e responsável técnico da empresa Cidade Planos Consultoria Ltda. (sucessora da empresa Cidade Planos e Projetos Ltda.)	Brasil	Serviços de consultoria para elaboração e coordenação de planos diretores municipais e de estruturação urbana; transporte coletivo urbano; projetos de revitalização de áreas centrais; projetos de requalificação urbana; planos regionais; planos, estudos e projetos com foco no desenvolvimento do turismo sustentável; projetos de habitação de interesse social.
1997-2003	Serviço Social Autônomo Ecoparaná Superintendente Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo	Brasil	Elaboração de projetos regionais de turismo no Estado do Paraná: • Projeto Serra do Mar/Litoral • Projeto Campos Gerais • Projeto Costa Oeste • Projeto Vale do Iguaçu • Projeto Costa Norte • Projeto Região Metropolitana de Curitiba

Filiação de associações profissionais e publicações:
CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná

Idiomas:

Idiomas	Falar	Ler	Escrever
Espanhol	Bom	Bom	Bom
Português	Fluente	Fluente	Fluente
Holandês	Fluente	Fluente	Fluente
Inglês	Bom	Bom	Bom
Francês	Conhecimentos	Conhecimentos	Conhecimentos
Alemão	Conhecimentos	Conhecimentos	Conhecimentos

01

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 363

Adequação para o serviço:

Tarefas detalhadas atribuídas à Equipe de especialistas do Consultor:
0 - ATIVIDADES PREPARATÓRIAS E GERENCIAIS DO CONTRATO
00.1 - Providências iniciais e Mobilização
00.2 - Acompanhamento gerencial do contrato
00.3 - Reunião de partida (kick-off meeting)
1 - PLANO DE TRABALHO
101 - Identificação e levantamento das informações existentes
102 - Desenho das ferramentas de comunicação do projeto
103 - Elaboração do plano de comunicação
104 - Elaboração do plano de trabalho
105 - Realização da Reunião Técnica 1
106 - Disponibilização do Plano de Trabalho Inicial (P.T.I) e material elaborado para consulta pública
107 - Realização das (3) Oficinas públicas de Engajamento (R.A.0.1)
108 - Audiência Pública de Engajamento
109 - Validação do Plano de Trabalho Final (P.T.F)
2 - CONTEXTUALIZAÇÃO
201 - Levantamentos e análise de dados secundários
202 - Levantamentos e análise de dados primários
203 - Elaboração de mapas georreferenciados para interpretação dos dados.
204 - Elaboração de diagnostico e de matriz FOFA
205 - Elaboração de benchmark para identificação de boas práticas internacionais
206 - Elaboração do Relatório de Contextualização Inicial (RCI)
207 - Realização da Reunião Técnica 2
208 - Disponibilização do Relatório de Contextualização Inicial (RCI) e material elaborado para consulta pública
209 - Realização das (3) Oficinas públicas de Contextualização (R.A.0.2)
210 - Audiência Pública de Contextualização
211 - Validação do Relatório de Contextualização Final (R.C.F)
3 - CRIAÇÃO DOS CENÁRIOS E VISÃO DE FUTURO
301 - Construção dos cenários de desenvolvimento sustentável e avaliação de impactos
302 - Formulação de visão geral de futuro para até 2035
303 - Estabelecimento de objetivos e metas previstas
304 - Definição dos eixos estratégicos e princípios orientadores do Plano
305 - Processo de consulta com os atores locais
306 - Elaboração do Relatório de Construção de Cenários e Visão de Futuro Inicial (R.C.C.I)
307 - Realização da Reunião Técnica 03
308 - Disponibilização do Rel. de Construção de Cenários e Visão de Futuro Inicial e material elaborado para consulta pública (R.C.C.I)
309 - Realização das (3) Oficinas públicas de Construção de Cenários e Visão de Futuro Inicial (R.A.0.3)
310 - Audiência Pública de Construção de Cenários e Visão de Futuro
311 - Validação do Relatório de Construção de Cenários e Visão de Futuro Final (R.C.C.F.)
4 - PLANO DE AÇÃO
401 - Zoneamento territorial
402 - Definição de programas e propostas de ação
403 - Definição de estratégias de financiamento viáveis
404 - Definição de estratégia institucional e de gestão
405 - Definição dos mecanismos de monitoramento e controle de ações governamentais
406 - Elaboração do Relatório de Plano de Ação Inicial (R.P.A.I.)
407 - Realização da Reunião Técnica 4
408 - Disponibilização do Relatório de Plano de Ação Inicial (R.P.A.I.) e material elaborado para consulta pública
409 - Realização das (2) Oficinas públicas de Plano de Ação Inicial (R.P.A.I.)
410 - Audiência Pública de Plano de Ação Inicial (R.P.A.I.)
411 - Validação do Relatório de Plano de Ação Final (R.P.A.F.)

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 364

5 - CONFERÊNCIA REGIONAL
501 - Elaboração do documento final do Plano
502 - Apresentação e revisão do documento final
503 - Realização da Conferencia Regional

Informação sobre trabalho/serviço anterior que melhor ilustre a competência para lidar com as tarefas designadas

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DA ÁREA TURÍSTICA PRIORITÁRIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA / PDITS (PRODETUR SUL)
Ano: 2003
Local: Estado de Santa Catarina
Cargo: Coordenador
Contratante: Consultur Assessoria em Projetos Ltda.
Atividades desempenhadas: Coordenação da equipe técnica que elaborou os documentos Perfil da Área Turística – PAT e Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável – PDITS.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DA ÁREA TURÍSTICA DE CURITIBA, REGIÃO METROPOLITANA E CAMPOS GERAIS / PDITS (PRODETUR SUL)
Ano: 2011
Local: Estado do Paraná
Cargo: Consultor
Contratante: FAUEPG – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Institucional, Científico e Tecnológico da Universidade Estadual de Ponta Grossa
Atividades desempenhadas: Integrante da equipe técnica que elaborou os documentos: (i) Perfil da Área Turística – PAT; e (i) Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável – PDITS.

PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE VIANA (REGIÃO METROPOLITANA DE LUANDA, ANGOLA)
Ano: 2014
Local: Luanda, Angola
Cargo: Coordenador
Contratante: Jaime Lerner Arquitetos Associados Ltda.
Atividades desempenhadas: Coordenação da equipe técnica que elaborou o Plano Diretor Municipal de Viana, município da Região Metropolitana de Luanda com 1.525.000 habitantes, contemplando: (i) modelo de organização espacial (ii) estratégia de desenvolvimento e ordenamento do território; (iii) planta de zoneamento; (iv) análise das vias de comunicação e transportes; (v) definição de índices urbanísticos; (vi) dimensionamento e localização de infraestruturas principais (vii) dimensionamento e localização de equipamentos principais; (viii) elaboração de carta de ordenamento; (ix) elaboração de carta de condicionantes; e (x) realização de duas audiências públicas.

PROJETO BÁSICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL
Ano: 2008
Local: Distrito Federal
Cargo: Coordenador
Contratante: Jaime Lerner Arquitetos Associados
Atividades desempenhadas: Coordenação da equipe técnica que elaborou o Projeto Básico de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal: (i) Tema 1 – Macroestruturação Urbana; e (ii) Tema 2 – Projetos Urbanos Estratégicos.

PLANOS DIRETORES PARTICIPATIVOS DOS MUNICÍPIOS DE NAVEGANTES, BOMBINHAS, ILHOTA E LUÍS ALVES/SC
Ano: 2007
Local: Estado de Santa Catarina
Cargo: Coordenador
Contratante: AMFRI – Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí.
Atividades desempenhadas: Coordenação da equipe técnica que elaborou os planos diretores participativos dos municípios de Navegantes, Bombinhas, Ilhota e Luís Alves, contemplando (i) elaboração da leitura da realidade do município; (ii) elaboração dos eixos estratégicos e diretrizes; (iii) elaboração dos eixos estratégicos e temas prioritários; (iv) propostas de atualização da legislação

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 365

urbana básica.

PLANO DE DIRETRIZES DE OCUPAÇÃO URBANA DO MOSQUEIRO – ARACAJU/SE
Ano: 2014
Local: Aracaju/SE
Cargo: Coordenador
Contratante: Jaime Lerner Arquitetos Associados
Atividades desempenhadas: Coordenação da equipe técnica que elaborou o Plano de Diretrizes de Ocupação Urbana do Mosqueiro, zona de expansão urbana de Aracaju-SE, com área de 5.632,52 hectares, contemplando: (i) diagnóstico físico-territorial, socioeconômico e ambiental; (ii) plano de requalificação urbana; (iii) plano ou traçado de cidade; (iv) plano de intervenção local; (v) análise e aplicação dos instrumentos do Estatuto das Cidades; e (vi) realização de audiências públicas.

PLANO DIRETOR PARCITIPATIVO DO MUNICÍPIO DE PORTO BELO/SC
Ano: 2007
Local: Porto Belo/SC
Cargo: Coordenador
Contratante: Prefeitura Municipal de Porto Belo
Atividades desempenhadas: Coordenação da equipe técnica que elaborou o Plano Diretor Participativo, contemplando: (i) elaboração do perfil e diagnóstico; (ii) definição dos eixos estratégicos; (iii) propostas de atualização das leis municipais; e (iv) realização de audiências públicas.

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE PENHA/SC
Ano: 2007
Local: Penha/SC
Cargo: Coordenador
Contratante: Prefeitura Municipal de Penha
Atividades desempenhadas: Coordenação da equipe técnica que elaborou o Plano Diretor Participativo, contemplando: (i) leitura técnica; (ii) definição dos eixos estratégicos; (iii) anteprojeto de atualização da lei do plano diretor; e (iv) realização de audiências públicas.

PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL/SC
Ano: 2005
Local: São Francisco do Sul/SC
Cargo: Coordenador
Contratante: Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Social
Atividades desempenhadas: Coordenador da equipe técnica que elaborou o Plano Diretor Municipal de São Francisco do Sul, contemplando: (i) perfil do município; (ii) diagnóstico e síntese do diagnóstico; (iii) diretrizes para reestruturação urbana; (iv) minuta da lei de diretrizes ou lei do plano diretor; (v) minutas da legislação urbana básica; e (vi) proposta de adaptação da estrutura organizacional da prefeitura.

DIETRIZES BÁSICAS DE ESTRUTURAÇÃO URBANA PARA A CIDADE DE CUIABÁ/MT
Ano: 2006
Local: Cuiabá/MT
Cargo: Consultor
Contratante: Jaime Lerner Arquitetos Associados
Atividades desempenhadas: Integrante da equipe técnica que elaborou as Diretrizes Básicas de Estruturação Urbana para a Cidade de Cuiabá, contemplando: (i) conhecimento da realidade; (ii) elaboração das diretrizes preliminares.

PLANO DE ESTRUTURAÇÃO URBANA DA CIDADE DE UBERABA/MG
Ano: 2010
Local: Uberaba/MG
Cargo: Consultor
Contratante: Jaime Lerner Arquitetos Associados
Atividades desempenhadas: Integrante da equipe técnica que elaborou a Proposta de Estruturação Urbana de Uberaba/MG, contemplando: (i) estruturação urbana; (ii) estruturação viária; (iii) mobilidade e acessibilidade; e (iv) elaboração de projetos

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 366

estratégicos.
PROJETO DE REVITALIZAÇÃO URBANA DA ZONA 10 NA CIDADE DE MARINGÁ/PR Ano: 2006 Local: Maringá/PR Cargo: Consultor Contratante: Prefeitura Municipal de Maringá Atividades desempenhadas: Integrante da equipe técnica que elaborou o Projeto de Revitalização Urbana da Zona 10 na Cidade de Maringá, contemplando: (i) diagnóstico; (ii) definição de diretrizes; (iii) projeto de revitalização; e (iv) plano de ação.

Informações de contato do Especialista: (e-mail: taco@cidadeplance.com.br, telefone: (41) 9975-1750 e (41) 3029-2423).

Certificado:

Eu, abaixo assinado, certifico que, sob o meu conhecimento e convicção, este CV descreve-me corretamente, minhas qualificações e minha experiência e que estou disponível para executar o serviço no caso de outorga. Estou ciente de que qualquer informação ou declaração falsa apresentada aqui pode resultar na minha desqualificação ou dispensa pelo Cliente e/ou na aplicação de sanções pelo Banco Mundial.

TACO ROORDA
Nome do Especialista

Assinatura

15/08/2016

1o TABELIONATO GIOVANNETTI
Rua Paula Gomes, 110 Curitiba
Tel:(41)3014-2727 - Fax:(41)3014-2720
Reconheco a(s) firma(s) de:
[AmDGUVm0]-TACO ROORDA.....
por SEMELHANCA.
Em testemunho _____ de verdade.
Curitiba, 12 de Junho de 2017
106-VIVIANE CARLA DA SILVA
ESCREVENTE AUTORIZADA
JAR
SELO DIGITAL:A9OJ3 . aQIIa . FQYXZ - 9HD7t . KHOJf
Consulte esse selo em
http://funarpen.com.br

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 367

BARCELONABRASILGROUP Mcrit hidria Quanta

CURRICULUM VITAE (CV)

Título e nº do cargo	K-02, Direito Urbanístico e Ambiental
Nome do Especialista:	Nerêo Cardoso de Melos Junior
Data de nascimento:	11/07/1976
País de origem/residência	Brasil/ Brasil

Educação:

Instituição	Título (s) ou Diploma (s) obtido:
Universidade Cândido Mendes (2003)	Especialização em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil (2000)	Bacharel em Direito

Registro histórico de empregos relevante para o serviço:

Período	Organização empregadora e seu cargo/posição. Informações de contato para referência	País	Resumo das atividades desempenhadas relevantes para o Serviço
2004 - presente	Procuradoria de Serviços Públicos (PSE) do Município do Rio de Janeiro Procurador do Município do Rio de Janeiro, Consultivo e Contencioso Dra. Vera Helena R. Caldas Francisco Ex- Procuradora Chefe da PTA 3083-8383 vera.francisco@pgm.rio.rj.gov.br	Brasil	Análise, junto com equipe, de minutas de projetos de lei e decretos; Elaboração e análise, junto com equipe, de minutas de editais de licitação e contratos;
2009 – mar/2017	Escritório Elísio de Souza Consultor na área de Direito Administrativo Dr. Anderson Elísio de Souza 2533-6843 anderson.elisio@ejupes.edv.br	Brasil	Análise de editais de licitações e dos respectivos contratos, elaborando impugnações e recursos administrativos quando necessário; Elaboração de defesas em processos administrativos; Análise da legislação dos municípios fluminenses – com exceção da Capital - visando à implantação de empreendimentos por particulares.
2004 - 2002	Procuradoria Trabalhista do (PTA) Município do Rio de Janeiro Procurador do Município do Rio de Janeiro, Consultivo e Contencioso Dra. Vera Helena R. Caldas Francisco Ex- Procuradora Chefe da PTA 3083-8383 vera.francisco@pgm.rio.rj.gov.br	Brasil	Elaboração, junto com equipe, da modelagem jurídica para o Projeto Jardineiros Comunitários da Fundação Parques e Jardins; Elaboração, junto com equipe, da modelagem jurídica para o Projeto Patrulha Ambiental do Município do Rio de Janeiro; Pareceres sobre a relação jurídica dos empregados da COMLURB, empresa municipal de limpeza urbana.

Filiação de associações profissionais e publicações:
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 368

Idiomas:

Idiomas	Falar	Ler	Escrever
Português	Nativo	Nativo	Nativo
Inglês	Regular	Regular	Bom
Francês	Regular	Regular	Regular

Adequação para o serviço:

Tarefas detalhadas atribuídas à Equipe de especialistas do Consultor:

0 - ATIVIDADES PREPARATÓRIAS E GERENCIAIS DO CONTRATO
00.3 - Reunião de partida (kick-off meeting)

1 - PLANO DE TRABALHO
101 - Identificação e levantamento das informações existentes
104 - Elaboração do plano de trabalho
109 - Validação do Plano de Trabalho Final (P.T.F)

2 - CONTEXTUALIZAÇÃO
201 - Levantamentos e análise de dados secundários
202 - Levantamentos e análise de dados primários
203 - Elaboração de mapas georreferenciados para interpretação dos dados.
204 - Elaboração de diagnostico e de matriz FOFA
205 - Elaboração de benchmark para identificação de boas práticas internacionais
206 - Elaboração do Relatório de Contextualização Inicial (RCI)
211 - Validação do Relatório de Contextualização Final (R.C.F)

3 - CRIAÇÃO DOS CENÁRIOS E VISÃO DE FUTURO
301 - Construção dos cenários de desenvolvimento sustentável e avaliação de impactos
302 - Formulação de visão geral de futuro para até 2035
303 - Estabelecimento de objetivos e metas previstas
304 - Definição dos eixos estratégicos e princípios orientadores do Plano
306 - Elaboração do Relatório de Construção de Cenários e Visão de Futuro Inicial (R.C.C.I)
311 - Validação do Relatório de Construção de Cenários e Visão de Futuro Final (R.C.C.F.)

4 - PLANO DE AÇÃO
401 - Zoneamento territorial
402 - Definição de programas e propostas de ação
403 - Definição de estratégias de financiamento viáveis
404 - Definição da estratégia institucional e de gestão
405 - Definição dos mecanismos de monitoramento e controle de ações governamentais
406 - Elaboração do Relatório de Plano de Ação Inicial (R.P.A.I.)
411 - Validação do Relatório de Plano de Ação Final (R.P.A.F.)

5 - CONFERÊNCIA REGIONAL
501 - Elaboração do documento final do Plano

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 369

BARCELONABRASILGROUP Mcrit hidria Quanta

Informação sobre trabalho/serviço anterior que melhor ilustre a competência para lidar com as tarefas designadas
ESCRITÓRIO ELÍSIO DE SOUZA. Ano: 2009 - Presente. Local: Rio de Janeiro-RJ. Contratante: Escritório Elisio de Souza. Cargo: Consultor em Direito Administrativo. Atividades desempenhadas: Direito Regulatório, Licitações e Contratos.
PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. Ano: 2004 - Presente. Local: Rio de Janeiro-RJ. Contratante: Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Cargo: Consultor em Direito Administrativo. Atividades desempenhadas: Serviços públicos, consultivo e contencioso.
PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. Ano: 2002 - 2004. Local: Rio de Janeiro-RJ. Contratante: Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Cargo: Procurador. Atividades desempenhadas: Trabalhista, consultivo e contencioso.
ESCRITÓRIO DO ACÁCIO MONTEIRO BARROSO E ADVOGADOS ASSOCIADOS. Ano: 1998 – 2000. Local: Rio de Janeiro-RJ. Contratante: Escritório do Acácio Monteiro Barroso e Advogados Associados. Cargo: Estagiário Atividades desempenhadas: Direito.
ESCRITÓRIO-MODELO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO-UFRJ. Ano: 1998 - 2000. Local: Rio de Janeiro-RJ. Contratante: UFRJ. Cargo: Estagiário. Atividades desempenhadas: Direito.

Informações de contato do Especialista: (e-mail: nereo.matos@gmail.com, telefone: (21) 99691-5033).

Certificado:

Eu, abaixo assinado, certifico que, sob o meu conhecimento e convicção, este CV descreve-me corretamente, minhas qualificações e minha experiência e que estou disponivel para executar o serviço no caso de outorga. Estou ciente de que qualquer informação ou declaração falsa apresentada aqui pode resultar na minha desqualificação ou dispensa pelo Cliente e/ou na aplicação de sanções pelo Banco Mundial.

NERÊO CARDOSO DE MATOS JUNIOR Assinatura 07/06/2017
Nome do Especialista

17º Ofício de Notas DA CAPITAL Tabelião: Carlos Alberto Firmo Oliveira 068574AD610496
Reconheço por semelhança a firma de: NEREO CARDOSO DE MATOS JUNIOR
(X000004B5EF0)
Rio de Janeiro, 12 de junho de 2017. Conf. Por:
Em testemunho ... de verdade.
Dijair da Silva Bezerra - Aut. Total: Art. 20 § 3º Lei 8.935/94
ECCX-61970 CNJ Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/selopublicidade - CAD/CGJ nº 94.029/16
SELO DE AUTORIDADE OFÍCIO DE NOTAS-RJ
Dijair da Silva Bezerra

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 370

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que **NEREO CARDOSO DE MATOS JUNIOR**, matrícula nº 10/221.213-2, é servidor público da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, pertencente ao Quadro de Procuradores do Município desta Procuradoria Geral, tendo sido provido no cargo de Procurador do Município, através do Decreto "P" 1444, de 07 de fevereiro de 2002, publicado no Diário Oficial (D.O.RIO) de 08 de fevereiro de 2002, com posse e exercício em 28 de fevereiro de 2002, dados retirados do Sistema de Recursos Humanos – ERGON.

O servidor, desde o início do seu exercício nesta Procuradoria Geral do Município,foi lotado na Procuradoria Trabalhista, de 28/02/2002 a 02/02/2004 e na Procuradoria de Serviços Públicos, de 03/02/2004 até hoje.

Declaramos, ainda, que os Procuradores do Município exercem a representação judicial e a consultoria jurídica do ente público, nos termos do artigo 134 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, de 05/04/90, e que à Procuradoria Geral do Município, por seus integrantes, compete (art. 3º, da Lei Municipal nº 788, de 12/12/1985):

I –a representação judicial do Município e de suas autarquias;

II –a cobrança administrativa e judicial da dívida ativa do Município;

III – a defesa em Juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, dos atos e prerrogativas do Prefeito;

IV – o exercício de funções de consultoria jurídica da Administração, no plano superior, inclusive no que respeita às decisões das questões a que se refere o art. 205 da Constituição Federal, bem como emitir pareceres, normativos ou não, para fixar a interpretação governamental de leis ou atos administrativos;

V – defender em Juízo ou fora dele o Legislativo municipal e responder a consultas por ele formuladas (...) (vetado)..

VI – elaborar minutas de informações a serem prestadas ao Judiciário em mandados de segurança impetrados contra ato do Prefeito e de outras autoridades que forem indicadas em norma regulamentar;

VII – propor ao Prefeito o encaminhamento de representação para a declaração de inconstitucionalidade de quaisquer normas, minutar a correspondente petição, bem como as informações que devam ser prestadas pelo Prefeito na forma da legislação específica;

VIII – promover, a juízo do Prefeito, a iniciativa do Chefe do Ministério Público estadual ou federal, conforme o caso, para que seja estabelecido pelo Tribunal de Justiça do Estado ou pelo Supremo Tribunal Federal, respectivamente, a interpretação de lei ou ato normativo municipal, estadual ou federal, nos termos da legislação pertinente;

IX – promover, a juízo do Prefeito, representação ao Procurador–Geral da República para que este providencie perante o Supremo Tribunal Federal a avocação de causas processadas perante quaisquer Juízos, nas hipóteses previstas na legislação federal pertinente;

X – defender os interesses do Município e do Prefeito junto aos contenciosos administrativos;

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 371

XI – assessorar o Prefeito, cooperando na elaboração legislativa;

XII – opinar sobre providências de ordem jurídica aconselhadas pelo interesse público e pela aplicação das leis vigentes;

XIII – propor ao Prefeito a edição de normas legais ou regulamentares de natureza geral;

XIV – propor ao Prefeito, para os órgãos da administração direta ou indireta e das fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, medidas de caráter jurídico que visem a proteger-lhes o patrimônio ou a aperfeiçoar as práticas administrativas;

XV – propor ao Prefeito medidas que julgar necessárias à uniformização da jurisprudência administrativa;

XVI – elaborar minutas padronizadas dos termos de contratos a serem firmados pelo Município;

XVII – opinar, por determinação do Prefeito, sobre as consultas que devam ser formuladas pelos órgãos da administração direta e indireta ao Tribunal de Contas e demais órgãos de controle financeiro e orçamentário;

XVIII – opinar previamente com referência ao cumprimento de decisões judiciais e, por determinação do Prefeito, nos pedidos de extensão de julgados, relacionados com a Administração Direta Estadual;

XIX – coordenar e supervisionar tecnicamente os órgãos do Sistema Jurídico Municipal, estabelecendo normas complementares sobre seu funcionamento integrado e examinando seus expedientes e manifestações jurídicos que lhe sejam submetidos pelo Prefeito ou por Secretário Municipal;

XX – opinar, sempre que solicitada, nos processos administrativos em que haja questão judicial correlata ou que neles possa influir como condição de seu prosseguimento;

XXI – desempenhar outras atribuições que lhe forem expressamente cometidas pelo Prefeito;

XXII – tomar, em juízo, as iniciativas necessárias à legalização dos loteamentos irregulares ou clandestinos.

Rio de Janeiro, 09 de junho de 2017

JACQUELINE GONÇALVES LOBO VIANNA
Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro
Gerente de Recursos Humanos da PGM
Matrícula: 11/131.975-5

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 372

12430

Brasil

BARCELONA GROUP Mcrit hidria Quanta

CURRICULUM VITAE (CV)

Título e nº do cargo	K-03, Infraestruturas – Sistema Viário
Nome do Especialista:	Andreu Esquius
Data de nascimento:	20/06/1967
País de origem/residência	Espanha / Barcelona

Educação:

Instituição	Título (s) ou Diploma (s) obtido:
Universidade Politécnica de Catalunha (1985-1992)	Engenharia civil

Registro histórico de empregos relevante para o serviço:

Período	Organização empregadora e seu cargo/posição. Informações de contato para referência	País	Resumo das atividades desempenhadas relevantes para o Serviço
1993- presente	MCRIT S.L. - Fundador e Diretor Para referências: ulied@mcrit.com Tel (+34) 93 225 03 13	Espanha	Coordenação de projetos internacionais de planejamento de mobilidade urbana e transporte público Participação em atividades e processos de avaliação de programas e Projetos governamentais ou não governamentais; Experiência com trabalhos sobre políticas públicas preferencialmente noâmbito da mobilidade urbana e o transporte;
1991-1999	Plano Territorial Metropolitano de Barcelona Responsável de Transporte Público	Espanha	Analista de propostas técnicas de longo prazo relacionadas com o transporte público na Região Metropolitana de Barcelona
2000- presente	UniversidadePolitécnica de Catalunha - Professor Para referências: Jordi Girona, 1, 08034 Barcelona Tel:(+34)934 01 69 00 director.camins@upc.edu	Espanha	Docência

Filiação de associaçõesprofissionais e publicações:

Colégio de Engenheiros Civis de Catalunha (11.122)

Idiomas:

Idiomas	Falar	Ler	Escrever
Espanhol	Nativo	Nativo	Nativo
Inglés	Fluente	Fluente	Fluente
Francés	Fluente	Fluente	Fluente
Português	Intermediário	Fluente	Fluente

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 373

Adequação para o serviço:

Tarefas detalhadas atribuídas à Equipe de especialistas do Consultor:
0 - ATIVIDADES PREPARATÓRIAS E GERENCIAIS DO CONTRATO 00.3 - Reunião de partida (kick-off meeting) **1 - PLANO DE TRABALHO** 101 - Identificação e levantamento das informações existentes 104 - Elaboração do plano de trabalho 109 - Validação do Plano de Trabalho Final (P.T.F) **2 - CONTEXTUALIZAÇÃO** 201 - Levantamentos e análise de dados secundários 202 - Levantamentos e análise de dados primários 203 - Elaboração de mapas georreferenciados para interpretação dos dados. 204 - Elaboração de diagnostico e da matriz FOFA 205 - Elaboração de benchmark para identificação de boas práticas internacionais 206 - Elaboração do Relatório de Contextualização Inicial (RCI) 211 - Validação do Relatório de Contextualização Final (R.C.F) **3 - CRIAÇÃO DOS CENÁRIOS E VISÃO DE FUTURO** 301 - Construção dos cenários de desenvolvimento sustentável e avaliação de impactos 302 - Formulação de visão geral de futuro para até 2035 303 - Estabelecimento de objetivos e metas previstas 304 - Definição dos eixos estratégicos e principios orientadores do Plano 306 - Elaboração do Relatório de Construção de Cenários e Visão de Futuro Inicial (R.C.C.I) 311 - Validação do Relatório de Construção de Cenários e Visão de Futuro Final (R.C.C.F.) **4 - PLANO DE AÇÃO** 401 - Zoneamento territorial 402 - Definição de programas e propostas de ação 406 - Elaboração do Relatório de Plano de Ação Inicial (R.P.A.I.) 411 - Validação do Relatório de Plano de Ação Final (R.P.A.F.) **5 - CONFERÊNCIA REGIONAL** 501 - Elaboração do documento final do Plano
Informação sobre trabalho/serviço anterior que melhor ilustre a competência para lidar com as tarefas designadas
Elaboração do Programa de Desenvolvimento Regional da área de influência da ferrovia norte-sul no Estado do Tocantins (Brasil) Ano: Abril 2015 - Abril 2016 País: Estado do Tocantins (Brasil) Contratante: Governo do Estado do Tocantins (financiamento do Banco Mundial) Principais características do projeto: Promover o desenvolvimento econômico e social sustentável, usando a Ferrovia Norte-Sul (FNS) como um vetor essencial no âmbito do Corredor Centro-Norte de Exportação Cargo: Engenheiro Civil, especialista em infraestruturas Atividades desempenhadas: Elaborações dos perfis (contextos) natural/ambiental, social, econômico, de infraestruturas, transporte e mobilidade urbana, demográfico, de cobertura e uso da terra, e sistemas produtivos. Avaliação e seleção dos segmentos empresariais (produtivos) que devem ser incentivados e atraídos. Definição dos objetivos e diretrizes norteadores do plano de desenvolvimento considerando os sistemas produtivos atuais e futuros na área de influência da FNS. Avaliação e seleção dos investimentos públicos de apoio, visando a integração dos espaços geográficos. Formulação das ações estratégicas a serem realizadas pelo Governo do Estado e Municípios envolvidos. Elaboração de um plano de ação
Elaboração do Estudo de Viabilidade Econômico Financeira e Ambiental do Projeto de Saneamento, Urbanização e Drenagem da Vila do Abraão - Ilha Grande - Angra Dos Reis. /RJ Ano: Abril 2014-Dezembro 2014 País: Brasil Contratante: Programa de Desenvolvimento do Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Prodetur-RJ) / Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) Principais características do projeto: O projeto visa avaliar o impacto de três intervenções distintas em infraestrutura (saneamento,

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 374

Principais características do projeto: O projeto visa à análise dos projetos estratégicos de infraestruturas e desenvolvimento econômico previstos na área de abrangência metropolitana, identificando propostas alternativas e estabelecendo o analise de viabilidade técnica e socioeconômica dos projetos. Cargo: Engenheiro Civil, especialista em infraestruturas Atividades desempenhadas: Identificação e documentação prévia dos projetos previstos. Levantamento sistemático de planos, projetos e pesquisas de referencia sobre as possíveis estratégias. Coordenação de oficinas de trabalho para analise estratégica com técnicos e especialistas para avaliação dos projetos e identificação dos problemas e oportunidades associados as diferentes alternativas, atendendo ao planejamento setorial e territorial atual. Elaboração do dossiê gráfico contendo as informações mais relevantes dos projetos. Os relatórios contem esquemas e cartografia, além de uma síntese da informação quantitativa em relação aos custos dos projetos, benefícios diretos e indiretos e os impactos macroeconômicos, sociais e ambientais associados. Avaliação técnica e socioeconômica das alternativas identificadas.
TENCONNECT – Definição de cenários das Rede de Transporte Trans- Europeias (TEN-T) Ano: Setembro 2007– Dezembro 2009 Local: União Européia Contratante: Comissão Européia – Direção Geral de Energia e Transportes (DG TREN) Principais características do projeto: O projeto analisa a atual Rede de Transporte Trans- Europeias (TEN-T) como parte do processo de desenvolvimento da política de transportes da UE a partir do ano 2010. O objetivo do projeto é a criação de uma base de dados sobre os fluxos de tráfico no território da União Europeia e a sua área de abrangência. Cargo: Engenheiro Civil, especialista em transportes Atividades desempenhadas:Utilização de Software de modelagem de transportes. Realização de estudos socioeconômicos. Modelagem em rede georreferenciada. Realização de inventários. Realização de pesquisas de O/D. Realização de contagens de tráfego. Realização de projeções de demanda. Alocação de tráfego em rede. Elaboração e apresentação de um diagnóstico sobre as características da circulação viária, Realização de Estudos de Simulação e Avaliação Cenários 2020 e 2030. Recomendações para ampliação do escopo de futuros estudos. Recomendaçoes para ampliação do escopo de futuros sistemas de comunicação, avaluaçao, gestão e monitoramento. Elaboração do Relatório Final
Sistema de Avaliação da Implementação de Projetos de Infraestrutura de Transporte – IGIS (System for Evaluation of Infrastructure Projects) Ano: Janeiro de 2004 - Dezembro 2006 País: União Europeia Contratante: Banco Europeu de Investimento (BEI) Cargo: Engenheiro Civil, especialista em transportes Atividades desempenhadas: Plataforma web georreferenciada permitindo a avaliação de projetos de transporte e infra-estrutura financiada pelo Banco Europeu de Investimento.
Plano Territorial Metropolitano de Barcelona Ano: 1991-1999 País: Espanha Contratante: Governo Regional de Catalunha Cargo: Engenheiro Civil, especialista em infraestruturase transporte público Atividades desempenhadas: Analista e de longo prazo propostas técnicas relacionadas com a mobilidade urbana e o transporte público na Região Metropolitana de Barcelona
Estudo e modelo custo-benefício e multi-critério para o Investimento público em infra-estrutura na Catalunha (MAIT) Ano: Junho 2010 - Setembro 2011 País: Espanha Contratante: Colégio de Engenharia Civil da Catalunha Cargo: Coordenação, Engenheiro Civil, especialista em avallação de programas e projetos Atividades desempenhadas:. O estudo tem como objetivo desenvolver um modelo de avaliação de infra-estrutura de transporte que integra as mais recentes contribuições sobre modelos de custo-benefício, os impactos macroeconômicos e efeitos ambientais e territoriais, que pode ser aplicado para investimentos propostos ou concluídos.
Plano Zonal de rede local de estradas de Província de Tarragona Ano: 2009-2012 Local: Tarragona, Espanha Contratante: Governo de Tarragona Cargo: Coordenador do projeto Atividades realizadas Desenvolvimento da plataforma SIG do Plano. Análises de caminhos a incorporar a rede. Desenvolvimento de uma metodologia de avaliação de custos dos projetos do Plano. Programação dos investimentos a realizar.
SIMPORT Ano: 2006-2012 Local: Porto de Barcelona, Espanha Contratante: Autoridade Portuária de Barcelona Cargo: Coordenador do projeto

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 375

Atividades desempenhadas: Desenvolvimento e manutenção da plataforma SIG. Análises sobre o potencial do porto. Desenvolvimento de uma metodologia de cálculo de emissão de CO2 e contaminantes em meios de transporte de mercadorias.
Avaliação custo-benefício do projeto de remodelação urbana da praça das Glorias em Barcelona (Espanha) Ano: Maio 2013 – Agosto 2013 País: Barcelona (Espanha) Contratante: Prefeitura de Barcelona Cargo: Coordenação, Engenheiro Civil, especialista em avaliação de programas e projetos Atividades desempenhadas: Avaliação de projetos de infraestrutura urbana da cidade de Barcelona, a partir da aplicação no projeto de desenvolvimento urbanístico no entorno da praza Glòries
Estudo do sistema ferroviário em Barcelona. Previsão de demanda, receitas e rentabilidade da linha L9. Impacto da estação de La Sagrera. Ano: Novembro 2014 - Abril 2015 País: Espanha Contratante: IFERCAT (Governo de Catalunha) Principais características do projeto: O estudo teve como objetivo realizar a previsão de demanda e das receitas da linha de metro L9, e em particular o impacto da nova estação em La Sagrera, com o objetivo final de contribuir ao estabelecimento de uma periodificação dos processos pendentes nessa linha. Cargo: Engenheiro Civil, especialista em infraestruturas Atividades desempenhadas: Atualização da informação de base. Ajuste de zoneamento e re-calibração do modelo de previsão de demanda. Cenários de infraestrutura, serviços e taxas. Definição de cenários socioeconômicos. Previsão de demanda. Cálculo de receitas.
Estudo de viabilidade técnica e econômica da nova estação ferroviária de Reus Ano: Dezembro 2014 - Março 2015 País: Espanha Contratante: ESTEYCO - Infraestructures.cat (Governo de Catalunha) Principais características do projeto: Reus tem 106.000 habitantes e notáveis perspectivas de crescimento urbano em áreas distantes da única estação que atualmente serve a cidade. O objetivo do estudo visa à realização da previsão de demanda para uma nova estação ferroviária em Reus na rota atual da linha e próximo ao Campus Universitário de Reus. O estudo faz parte do estudo de viabilidade técnica e econômica da nova estação ferroviária. Cargo: Engenheiro Civil, especialista em infraestruturas Atividades desempenhadas: Coleta de dados e estudos disponíveis. Análise da demanda atual para o transporte ferroviário. Análise da demanda por linhas de ônibus municipais e intermunicipais. Análise das previsões de novo desenvolvimento urbano. Cálculo da mobilidade gerada por novos desenvolvimentos urbanos. Análise da cobertura territorial da nova estação. Previsão de demanda para a nova estação.
Avaliação da rentabilidade, estudo de demanda e dimensionamento dos espaços associados da nova estação intermodal ferroviária de Sarria Ano: Julho 2009 - Janeiro 2010 País: Espanha Contratante: FCC - GISA (Governo de Catalunha) Principais características do projeto: Avaliar a rentabilidade socioeconômica e determinar a mobilidade gerada para o dimensionamento da da nova estação intermodal ferroviária de Sarria (Metro e trem) Cargo: Engenheiro Civil, especialista em infraestruturas Atividades desempenhadas: Calculo da demanda diária de passageiros da estação Intermodal ferroviária. Determinação do fator quarto de hora em horário de pico. Cálculo da capacidade do sistema de elevadores. Analise do dimensionamento. Avaliação da rentabilidade socioeconômica
Estudo de viabilidade técnica e econômica da estação da Zona Universitaria de Barcelona e conexão com a autoestrada B-23 Ano: Setembro 2013 - Dezembro 2013 País: Espanha Contratante: BOMAINPASA - Infraestructures.cat (Governo de Catalunha) Principais características do projeto: Estudo da demanda no contexto da redação do projeto básico da nova estação intermodal (ônibus, metro, VLT) na Zona Universitaria de Barcelona e conexão com a auto-estrada B-23. O projeto envolve a construção do corredor de ônibus na estrada B-23 para Zona Universitaria, a nova estação intermodal de ônibus subterrânea, que vai ser um hub com o VLT e a linha L3 de metro existentes, e a futura L9. Cargo: Engenheiro Civil, especialista em infraestruturas Atividades desempenhadas: Diagnóstico da oferta atual de linhas de ônibus. Diagnóstico da demanda atual de transporte público. Modelo de trânsito. Coleção de dados de tráfego. Desenvolvimento de um modelo de microsimulação de tráfego. Modelo da rede de transporte público. Adaptação e atualização do modelo SIMCAT da rede de transporte público de Catalunha, desenvolvido por MCRIT e propriedade do Governo da Catalunha. Previsão da mobilidade para os anos 2015 e 2035 dependendo das previsões socioeconômicas. Definição de cenários de para anos 2015 e 2035. Análise e resultados.
Estudo de demanda e dimensionamento dos espaços associados da nova estação intermodal ferroviária da linha de alta

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 376

drenagem e urbanização) na Vila do Abraão, Ilha Grande, dentro do Programa de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR/RJ) através de uma análise econômica financeira (análise de custo-eficiência; análise de custo-benefício) em conformidade com o disposto no Regulamento Operacional do Programa-ROP para cada tipo de intervenção.
Cargo: Engenheiro Civil, especialista em infraestruturas
Atividades desempenhadas: Análise do dimensionamento dos projetos, metodologia de análise e plano de participação local. Análise de Demanda para os projetos de água e esgoto sanitário, análise de Custos. Análise de demanda e de Capacidade de Pagamento da População em relação às intervenções de água e esgoto na Ilha Grande. Análise de sustentabilidade financeira, avaliação socioeconômica e financeira do projeto e recomendações Estratégicas.

Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável do Litoral Metropolitano de Barcelona
Ano: Junho 2004 - Dezembro 2005
País: Espanha
Contratante: Associação costeira de municípios metropolitanos em Barcelona
Cargo: Engenheiro Civil, especialista em infraestruturas
Atividades desempenhadas: Análise da dinâmica ambiental, econômica, urbana, e sócio-cultural e previsão da evolução da mobilidade, bem como os impactos e problemas enfrentados pelo meio ambiente e da paisagem em geral, e projetos que possam impactar curto médio prazo. Identificação dos projetos que possam impactar no desenvolvimento do curto e médio prazo. Desenvolvimento de um modelo de previsão que fornecem um conjunto de indicadores sobre a evolução das tendências futuras do litoral metropolitano de Barcelona. Criação de cenários prospectivos definidos a partir do cenário de tendência estabelecendo uma ferramenta de avaliação em base aos modelos futuros de desenvolvimento territorial. Discussão de modelos alternativos de desenvolvimento, considerando as dinâmicas atuais e as cadeias produtivas existentes na região. Definição do sistema de monitoramento do projeto, em relação ao grau de implantação das atividades planejadas

Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável do Litoral Maresme 2025
Ano: Novembro 2005 – Março 2007
País: Espanha
Contratante: Conselho da Comarca do Maresme
Cargo: Engenheiro Civil, especialista em infraestruturas
Atividades desempenhadas: Análise da dinâmica ambiental, econômica, urbana, e sócio-cultural e previsão da evolução da mobilidade, bem como os impactos e problemas enfrentados pelo meio ambiente e da paisagem em geral, e projetos que possam impactar curto médio prazo. Identificação dos projetos que possam impactar no desenvolvimento do curto e médio prazo. Desenvolvimento de um modelo de previsão que fornecem um conjunto de indicadores sobre a evolução das tendências futuras do litoral metropolitano de Barcelona. Criação de cenários prospectivos definidos a partir do cenário de tendência estabelecendo uma ferramenta de avaliação em base aos modelos futuros de desenvolvimento territorial. Discussão de modelos alternativos de desenvolvimento, considerando as dinâmicas atuais e as cadeias produtivas existentes na região. Definição do sistema de monitoramento do projeto, em relação ao grau de implantação das atividades planejadas

Avaliação do impacto territorial da construção de um túnel ferroviário no Estreito de Gibraltar
Ano: Julho de 2007 - Dezembro de 2009
País: Estreito de Gibraltar, Marrocos e Espanha
Contratante: Governos de Marrocos e Espanha
Cargo: Engenheiro Civil, especialista em infraestruturas
Atividades desempenhadas: Avaliação dos impactos sócio-econômicos da proposta túnel sob o Estreito de Gibraltar, impulsionado por empresas SNED em Marrocos e SECEGSA em Espanha, no tecido econômico e social da região do Estreito, e sobre os padrões de desenvolvimento regional nas regiões do norte de Marrocos e sul da Espanha

Plano de Paisagem de Costa da Morte
Ano: Setembro 2010 – Junho 2011
País: Espanha
Contratante: Governo de Galicia
Cargo: Engenheiro Civil, especialista em infraestruturas
Atividades desempenhadas: O Plano de Paisagem de Costa da Morte estuda as unidades paisagísticas do entorno litoral Galego, que possui um forte potencial turístico, ainda não desenvolvido. O Plano propõe uma serie de rotas e mirantes para realizar em veículo ou a pé que valorizem o patrimônio cultural e paisagístico da Costa, desde um ponto de vista turístico e econômico, procurando compatibilizar a visita ao território as atividades econômicas com a preservação do entorno natural e ecológico

ESPON ESATDOR - European Seas and Territorial Development, Opportunities and Risks
Ano: Setembro 2010-Junho 2013
País: União Europeia e países vizinhos do mar Mediterrâneo
Contratante: ESPON 2013 Programme (European Observation Network for Territorial Development and Cohesion) - European Commission
Principais características do projeto: ESPON ESATDOR visa abordar várias dimensões da política marítima integrada, como a economia marítima, a competitividade ea criação de emprego, fornecimento de energia, o transporte marítimo, a protecção do ambiente e conservação, alterações climáticas, a investigação ea inovação. Algumas destas dimensões estão interligadas e são analisados de forma integrada e crossdimensional.
Cargo: Engenheiro Civil, especialista em infraestruturas

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 377

Atividades desempenhadas: Investigação de usos atuais de mares da Europa através de padrões de mapeamento atual de uso do mar, tipologias, dinâmica e inter-relações.. Identificação de padrões de consumo de mar e de tipos de regiões costeiras: investigar o estado atual das zonas marítimas europeias, identificando potenciais áreas de conflito entre o uso de áreas marítimas e sua deterioração, distinguindo diferentes tipos de regiões costeiras, estudando os padrões de emprego em zonas marítimas e avaliar o estado atual de clusters marítimos. . Análise e identificação de oportunidades de desenvolvimento nas respectivas áreas, tendo também em conta as questões sobre sustentabilidade e mudanças climáticas. Análise da relação entre o planeamento terrestre e marítimo buscando práticas ótimas para a governação marítima

Proposta de novos usos e estudo da mobilidade em torno da estação ferroviária do Morrot no porto de Barcelona

Ano: Dezembro 2015- Maio 2015

País: Espanha

Contratante: Barcelona Regional

Principais características do projeto O projeto tem como objetivo definir um plano dos usos para a área do Morrol, no Porto de Barcelona, identificando os tipos de usos e configurações mais adequadas, especialmente em relação ao uso de derivados de atividade comercial e logística da comunidade portuária.

Cargo: Engenheiro Civil, especialista em infraestruturas

Atividades desempenhadas: Identificação e análise de possíveis novos usos com base numa análise comparativa dos portos e ambientes urbanos equivalentes, e as necessidades estratégicas próprio porto de Barcelona. Identificação e análise da demanda de mobilidade a partir de das atividades existentes em torno de Barcelona, através de entrevistas com a comunidade portuária. Definição de um projeto de usos a partir de pensando cenários de configurações alternativas. Avaliação estratégica de cenários, em particular a geração de mobilidade e adaptação dos usos propostos.

Master plan for Rijeka.(Croatia) Port enlargement and urban development

Ano: 2016

País: Croatia

Contratante: City of Rijeka

Principais características do projeto: The Master plan for Rijeka Port enlargement and urban development plans to develop an integral system of sustainable urban and regional mobility in the wider area of Rijeka, considering alternatives for the port's enlargement

Cargo: Engenheiro Civil, especialista em infraestruturas

Atividades desempenhadas: Desenvolvimento do modelo de transporte multimodal. Análise da situação atual e tendências. Definição de metas específicas de Plano Diretor. Desenvolvimento de medidas para alcançar metas estabelecidas. Modelação "fazer tudo" cenário. Desenvolvimento do plano de atividades de implementação.

Plano de Mobilidade de Urbana de Blumenau (Estado do Santa Caterina, Brasil)

Ano: Abril 2015 – Abril 2017

País: Estado do Santa Caterina, Brasil

Contratante: Prefeitura de Blumenau (financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento)

Principais características do projeto: O Plano de Mobilidade Urbana de Blumenau, é um conjunto de ações voltadas para a implementação de formas mais sustentáveis de viagem (caminhar, bicicleta e transportes públicos) na cidade. Modos de transporte, fazer o crescimento econômico de apoio, coesão social e proteção ambiental, garantindo, desta forma, uma melhor qualidade de vida para os cidadãos. Tudo isso com a oferta de um transporte público moderno, eficaz, a qualidade é um componente crítico de uma gestão da mobilidade adequada.

Cargo: Engenheiro Civil, especialista em infraestruturas

Atividades desempenhadas: Elaboração do grafo de ruas e rodovias. Delimitação das áreas urbanas. Zoneamento. Incorporação de dados. Estimação de tráfegos. Validação de dados secundários. Estimação da matriz OD a partir de dados socioeconômicos. Calibração da matriz OD em base a dados de tráfego real. Elaboração de cenários socioeconômicos e de demanda futura. Definição de propostas: infraestrutura, serviços e regulação. Avaliação de propostas. Micro-simulações.

Plano Diretor de Mobilidade Urbana da Região Metropolitana de Barcelona (PDM 2013-2018)

Ano: Maio 2010– Maio 2014

Local: Região Metropolitana de Barcelona (Espanha

Contratante: ATM – Autoridade do Transporte Metropolitano de Barcelona

Principais características do projeto: O Plano tem como principais objetivos melhorar a qualidade de vida, garantindo a acessibilidade dos cidadãos e alcançar uma mobilidade segura e sustentável que colaborarão na melhoria da competitividade. O Plano fornece medidas para reduzir o peso das viagens de carro privado e procura uma mudança na cultura de mobilidade para minimizar o uso do carro. O Plano faz um compromisso firme pelo transporte público e pelas viagens a pé e de bicicleta como meios mais sustentáveis.

Cargo: Engenheiro Civil, especialista em infraestruturas

Atividades desempenhadas: Utilização de Software de modelagem de transportes; Realização de estudos socioeconômicos; Modelagem em rede georreferenciada; Realização de inventários; Realização de pesquisas de O/D; Realização de contagens de tráfego; Realização de projeções de demanda; Alocação de tráfego em rede; Recomendações para ampliação do escopo de futuros estudos de Mobilidade

Análise estratégica dos projetos de infraestruturas na área metropolitana de Barcelona

Ano: Março 2012 - Dezembro 2012

País: Espanha

Contratante: Barcelona

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 378

velocidade em Figueres Ano: Julho 2006 - Janeiro 2007 País: Espanha Contratante: INCASOL (Governo de Catalunha) Principais características do projeto: Avaliar a rentabilidade socioeconômica e determinar a mobilidade gerada e atraída por todas as atividades que se concentram na estação intermodal ferroviária da linha de alta velocidade Barcelona-París e, com base nele, medir o espaço de estrada fora da estação ferroviária e do centro comercial Cargo: Engenheiro Civil, especialista em infraestruturas Atividades desempenhadas: Diagnóstico da oferta de serviços ferroviários para a estação intermodal ferroviária. Diagnóstico da demanda de passageiros da estação intermodal ferroviária. Analise dos modos de acesso e da dispersão dos passageiros na estação intermodal ferroviária. Analise do dimensionamento. Avaliação da rentabilidade sócio-econômica. Diagnóstico da oferta de serviços ferroviários para a estação intermodal ferroviária. Diagnóstico da demanda de passageiros da estação intermodal ferroviária. Analise dos modos de acesso e da dispersão dos passageiros na estação intermodal ferroviária. Analise do dimensionamento. Avaliação da rentabilidade socioeconômica
Estudo de demanda e dimensionamento da nova estação intermodal ferroviária do Aeroporto de Girona Ano: Junho 2012 - Setembro 2012 País: Espanha Contratante: IDOM - Infraestructures.cat (Governo de Catalunha) Principais características do projeto: Avaliar a rentabilidade socioeconômica e determinar a mobilidade gerada e atraída por todas as atividades que incidirá sobre o Aeroporto de Girona, quando conectado à linha ferroviária de alta velocidade Barcelona-Paris e, em sua base, a dimensão do desenvolvimento de espaços ao ar livre. Cargo: Engenheiro Civil, especialista em infraestruturas Atividades desempenhadas: Diagnóstico da oferta de serviços ferroviários para a estação intermodal ferroviária. Diagnóstico da demanda de passageiros da estação intermodal ferroviária. Analise dos modos de acesso e da dispersão dos passageiros na estação intermodal ferroviária. Analise do dimensionamento. Avaliação da rentabilidade sócio-econômica
Plano de Mobilidade Urbana da Área do Maresme Região Metropolitana de Barcelona Ano: Dezembro 2014 – Dezembro 2015 Local: Área do Maresme (Região Metropolitana de Barcelona,Espanha) Contratante: ATM – Autoridade do Transporte Metropolitano de Barcelona Principais características do projeto: O plano tem como objetivo realizar um diagnóstico da mobilidadee das redes de transporte que fornecem acesso à Maresme e estabelecer uma lista de ações de melhoria a 2020. Cargo: Engenheiro Civil, especialista em infraestruturas Atividades desempenhadas: Utilização de Software de modelagem de transportes; Realização de estudos socioeconômicos; Modelagem em rede georreferenciada; Realização de inventários; Realização de pesquisas de O/D; Realização de contagens de tráfego; Realização de projeções de demanda; Alocação de tráfego em rede; Recomendações para ampliação do escopo de futuros estudos de Mobilidade
Plano de Mobilidade Urbana de Terrassa Ano: Dezembro/2012 – Setembro/2014 Local: Terrassa (Região Metropolitana de Barcelona, Espanha) Contratante: Conselho Provincial de Barcelona Principais caracteristicas do projeto: Terrassa, com mais de 200.000 habitantes, e localizada na região metropolitana de Barcelona, é uma das cidades meiaas mais importantes da Catalunha. O Plano de Mobilidade Urbana de Terrassa, é um conjunto de ações voltadas para a implementação de formas mais sustentáveis de viagem (caminhar, bicicleta e transportes públicos) na cidade. Modos de transporte, fazer o crescimento econômico de apoio, coesão social e proteção ambiental, garantindo, desta forma, uma melhor qualidade de vida para os cidadãos. Tudo isso com a oferta de um transporte público moderno, eficaz, a qualidade é um componente crítico de uma gestão da mobilidade adequada. Cargo: Engenheiro Civil, especialista em infraestruturas Atividades desempenhadas: Utilização de Software de modelagem de transportes; Realização de estudos socioeconômicos; Modelagem em rede georreferenciada; Realização de inventários; Realização de pesquisas de O/D; Realização de contagens de tráfego; Realização de projeções de demanda; Alocação de tráfego em rede; Realização atividades de treinamento ao pessoal de Município para à capacitação equipe técnica; Recomendações para ampliação do escopo de futuros estudos de Mobilidade Urbana; Recomendações para ampliação do escopo de futuros sistemas de comunicação, avaliação, gestão e monitoramento.
Plano de Mobilidade Urbana de Girona Ano: Setembro/2012 – Setembro/2014 Local: Girona (Espenha) Contratante: Município de Girona Principais caracteristicas do projeto: O Plano de Mobilidade Urbana de Girona, é um conjunto de ações voltadas para a implementação de formas mais sustentáveis de viagem (caminhar, bicicleta e transportes públicos) na cidade. Modos de transporte, fazer o crescimento econômico de apoio, coesão social e proteção ambiental, garantindo, desta forma, uma melhor qualidade de vida para os cidadãos. Tudo isso com a oferta de um transporte público moderno, eficaz, a qualidade é um componente crítico de uma gestão de mobilidade adequada.

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 379

Cargo: Engenheiro Civil, especialista em infraestruturas
Atividades desempenhadas: Utilização de Software de modelagem de transportes; Realização de estudos socioeconômicos; Modelagem em rede georreferenciada; Realização de inventários; Realização de pesquisas de O/D; Realização de contagens de tráfego; Realização de projeções de demanda; Alocação de tráfego em rede; Realização atividades de treinamento ao pessoal de Municipio para à capacitação equipe técnica; Recomendações para ampliação do escopo de futuros estudos de Mobilidade Urbana; Recomendações para ampliação do escopo de futuros sistemas de comunicação, avaliaçao, gestão e monitoramento.

Plano de Mobilidade Urbana de Valls
Ano: Outubro/2010 – Abril/2014
Local: Valls (Espanha)
Contratante: Municipio de Valls
Principais caracteristicas do projeto: O Plano de Mobilidade Urbana de Valls, é um conjunto de ações voltadas para a implementação de formas mais sustentáveis de viagem (caminhar, bicicleta e transportes públicos) na cidade. Modos de transporte, fazer o crescimento econômico de apoio, coesão social e proteção ambiental, garantindo, desta forma, uma melhor qualidade de vida para os cidadãos. Tudo isso com a oferta de um transporte público moderno, eficaz, a qualidade é um componente crítico de uma gestão da mobilidade adequada.
Cargo: Engenheiro Civil, especialista em infraestruturas
Atividades desempenhadas: Utilização de Software de modelagem de transportes; Realização de estudos socioeconômicos; Modelagem em rede georreferenciada; Realização de inventários; Realização de pesquisas de O/D; Realização de contagens de tráfego; Realização de projeções de demanda; Alocação de tráfego em rede; Realização atividades de treinamento ao pessoal de Municipio para à capacitação equipe técnica; Recomendações para ampliação do escopo de futuros estudos de Mobilidade Urbana; Recomendações para ampliação do escopo de futuros sistemas de comunicação, avaliaçao, gestão e monitoramento.

Estudo de tráfego e de mobilidade urbana, como parte do estudo de viabilidade de uma ligação permanente entre a auto-estrada A4 e a cidade Bizerte (Tunisia).
Ano: Janeiro 2014 Julho 2014
Local:Bizerte Tunisia
Principais caracteristicas do projeto:Realização de uma previsão de tráfego associado à construção uma nova ligação rodoviária na cidade de Bizerte (Tunisia) que substitua o existente ponte, com graves problemas de congestão. O estudo fornecerá resultados de tráfego e outros indicadores necessários para a avaliação econômica do projeto: ganhos de tempo, acidentes e contaminação.
Cargo: Engenheiro Civil, especialista em infraestruturas
Atividades desempenhadas:Coleta de informação de base e análise dos conflitos de tráfego que acontecem. Caracterização do de tráfego atual: volumes de tráfego e análise de congestão. Desenvolvimento e calibração de um modelo de tráfego macroscópica utilizando uma metodologia de 4 estágios. Desenvolvimento de modelo de microssimulação de tráfego usando o software VISSIM (PTV Vision). Previsão da mobilidade e cenários de tráfego: 2018, 2028, 2038. Análise de diferentes alternativas.

Estudo de tráfego e de mobilidade urbana do um novo desenvolvimento urbano na cidade de Sabadell. Modelagem macroscópica e microscópica.
Ano: Abril 2013 - Fevereiro 2014
Local: Sabadell (Região Metropolitana de Barcelona, Espanha)
Principais caracteristicas do projeto:Estudo de tráfego para analisar os Impactos na mobilidade gerados por novos desenvolvimentos urbanos propostos em uma modificação do planejamento de 75 ha , na cidade de Sabadell, motivados pelo enterramento da linha ferroviária
Cargo: Engenheiro Civil, especialista em infraestruturas
Atividades desempenhadas:Coleta de informação de base e análise dos conflitos de tráfego que acontecem. Caracterização do de tráfego atual: volumes de tráfego e análise de congestão. Análise da rede rodoviária: desenvolvimento de um modelo de previsão macroscópico de tráfego. Desenvolvimento de modelo de microssimulação de tráfego usando o software VISSIM (PTV Vision). Cálculo da nova mobilidade gerada por novos desenvolvimentos urbanos propostos. Análise do impacto futuro das redes de transporte. Formulação da propostas e recomendações

Estudo de Avaliação da mobilidade gerada do Plano de Transporte de Manresa
Ano: Setembro/2012 – Abril/2014
Local: Manresa (Espanha)
Contratante: Municipio de Manresa
Principais caracteristicas do projeto:.O Estudo de avaliação da Mobilidade gerada do Plano de Planejamento Urbano Municipal de Manresa visa determinar o aumento da Mobilidade produzido pelos novos desenvolvimentos urbanos e propor medidas e ações necessárias para gerantir que a nova Mobilidade gerada siga as orientações caracterizadas pela preponderância de transporte mais sustentável.
Cargo: Engenheiro Civil, especialista em infraestruturas
Atividades desempenhadas: Utilização de Software de modelagem de transportes; Realização de estudos socioeconômicos; Modelagem em rede georreferenciada; Realização de inventários; Realização de pesquisas de O/D; Realização de contagens de tráfego; Realização de projeções de demanda; Alocação de tráfego em rede; Recomendações para ampliação do escopo de futuros estudos; Recomendações para ampliação do escopo de futuros sistemas de comunicação, avaliaçao, gestão e monitoramento.

Desenvolvimento do Sistema de Previsão de Modos Motorizados dentro do Plano de Mobilidade de Urbana de Sant Cugat del Valles

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 380

BARCELONA GROUP Mcrit hidria Quanta

Ano: Março/2009 – Janeiro/2010
Local: San CugatdelValles (Área Metropolitana de Barcelona, Espanha)
Contratante: Conselho Provincial de Barcelona
Principais caracteristicas do projeto: O modelo é integrado ao Sistema de Informações Corporativas do Municipio e é concebida como um instrumento de base para a elaboração do Plano Diretor de Transporte Urbano de Sant CugatdelValles. É um modelo de simulação, previsão e avaliação da mobilidade coletiva do municipio, especialmente da mobilidade motorizada.
Cargo: Engenheiro Civil, especialista em infraestruturas
Atividades desempenhadas: Utilização de Software de modelagem de transportes; Modelagem em rede georreferenciada; Realização de inventários; Realização de pesquisas de O/D; Realização de contagens de tráfego; Realização de projeções de demanda; Alocação de tráfego em rede; Realização atividades de treinamento ao pessoal de Municipio para à capacitação da equipe técnica; Recomendações para ampliação do escopo de futuros estudos de Mobilidade Urbana; Recomendações para ampliação do escopo de futuros sistemas de comunicação, avaliação, gestão e monitoramento.

Informações de contato do Especialista: (e-mail: esquius@mcrit.com, telefone: (+34) 93 225 03 13).

Certificado:

Eu, abaixo assinado, certifico que, sob o meu conhecimento e convicção, este CV descreve-me corretamente, minhas qualificações e minha experiência e que estou disponivel para executar o serviço no caso de outorga. Estou ciente de que qualquer informação ou declaração falsa apresentada aqui pode resultar na minha desqualificação ou dispensa pelo Cliente e/ou na aplicação de sanções pelo Banco Mundial.

ANDREU ESQUIUS
Nome do Especialista

Assinatura

15/08/2016

02

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 381

Yo, BORJA CRIADO MALAGARRIGA, Notario del Ilustre Colegio de Cataluña, con residencia en Barcelona, DOY FE ----------.

Que considero legítima la firma y rúbrica que antecede de Andreu Esquius Rafat

por coincidir con otra firma original legitimizada fehacientemente.

Y para que conste, expido el presente testimonio de legitimidad que he dejado anotado en el Libro Indicador de esta Notaría bajo el número 1172 de orden.

Barcelona, a 09 JUN 2017

SELLO DE LEGITIMACIONES Y LEGALIZACIONES

COLEGIOS NOTARIALES

NIHIL PRIUS FIDE

A082195191

CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO ESPAÑOL

NOTARIADO EUROPA

FE PÚBLICA NOTARIAL

02272851 84

COLEGIO NOT...

COLEGIO NOT...

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 382

BARCELONABRASILGROUP Mcrit hidria Quanta

CURRICULUM VITAE (CV)

Título e nº do cargo	K-04, Recursos Hídricos e Meio Ambiente
Nome do Especialista:	Fernando López Mera
Data de nascimento:	23/07/1976
País de origem/residência	Espanha/Espanha

Educação:

Instituição	Título (s) ou Diploma (s) obtido:
Escola Técnica Superior de Engenharia Civil de Santander. (2004-2007)	Doutor pela Universidade de Cantabria pela dissertação: "Estudo da estabilidade de quebra-mares galgáveis e submersos por meio de modelo RANS" Escola Técnica Superior de Engenharia Civil de Santander. Qualificação: Excelente Cum Laude por unanimidade. PREMIO MODESTO VIGUERAS DA ASSOCIAÇÃO ESPANHOLA DE PORTOS E COSTAS 2007.
Escola Técnica Superior de Engenharia Civil de Santander. (2003-2004)	Mestrado em Ciências e Tecnologias para a Gestão da Costa. Escola Técnica Superior de Engenharia Civil de Santander. Qualificação média: Excelente. Qualificação tese de mestrado: Excelente Melhor qualificação da edição
Escola Técnica Superior de Engenharia Civil de A Corunha. (2002-2004)	Diploma de estudos avançados Área. Engenharia Hidráulica. Escola Técnica Superior de Engenharia Civil de A Corunha. Qualificação: Excelente.
Escola Técnica Superior de Engenharia Civil de A Corunha. (1994-2000)	Engenheiro Civil. Escola Técnica Superior de Engenharia Civil de A Corunha. Qualificação média: Muito Bom Projeto final: Com honras.

NOTARIA DE D. MIGUEL LUCAS SANCHEZ - VIGO - MINIL PRIUS FAT

Formação Complementar:

- VI Curso prático para peixes: desenho, construção e evacuação. 16-19 Setembro 2014.
- Curso IHFOAM. Modelo numérico tridimensional para a simulação do fluxo bi-phase no interior de meios porosos. Santander. Espanha. 8-11 Outubro 2012.
- Curso IH2VOF. Modelo Numérico RANS para a simulação da interação do fluxo-estrutura. Santander. Espanha. 4-5 Outubro 2012.
- Curso SOLIDWORKS. Ferramenta de desenho 3D. Vigo. Espanha. 27-31 Agosto 2011.
- Curso SEAFLEX. "Design of elastic mooring system for floating pontton and breakwater". Umea. Suecia. 14-15 Junho 2011.
- Curso: AQUATOOL. Ferramenta de gestão dos recursos hídricos. Universidade Politécnica de Valencia. Vigo. 24-25 Outubro 2011.
- Curso: IBER. "Modelo matemático bidimensional para a simulação de fluxos em rios e estuários". A Corunha. Novembro 2010.
- Advanced Surface-Water Modelling with SMS. Environmental Modelling Software INC (EMS-I) – Environmental Hidraulic Laboratory (Bringham Young University). 40 horas. Provo Utah (USA). Dezembro 2008.
- Discharge Management with CORMIX-planning and análisis of watewater, colina water and desalination plant discharges for environmental impact studies. Universidade de Cantabria-Universidade de Karlsruhe. Santander. 26-27 Junho 2008.

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 383

- Curso de Introdução aos sistemas de informação geográfica. Aplicabilidade. Universidade de Vigo. 25-29 Maio 2007.
- Curso de pós-graduação: V Curso Ibero-americano de Engenharia Portuária. 122 horas. Universidade de Cantabria- Autoridade Portuária de Santander.
- Seminário: Regional wave modelling. Nick Graham (University of California. Scripps Institute). Ministrado na Universidade de Cantabria. 27 Outubro 2003.
- Seminário: Projeto HIPOCAS: Reanálise de ondulação e maré meteorológica no mar Mediterrâneo. Andry William Ratsimandresy. Ministrado na Universidade Cantabria. 27 Maio 2004.
- Seminário: GENESIS/T - Formulation of Upgrades. Hans Hanson (Head, Dept. of Water Resources, Universidade de Lund, Suécia). Ministrado na Universidade de Cantabria. 1 Junho 2004.
- Seminário: Novos avanços no projeto ENVIWAVE: Assimilação de dados. Juan Carlos Carretero (Portos do Estado) e Gema Morales. Ministrado na Universidade de Cantabria. 15 Julho 2004.
- Seminário: Field observation for dynamics response of pore pressures to storm waves. Motions of a caisson and deformation of its rubble mound computed by the discrete element methods. Tomotsuka Takayama. Universidade de Kioto, Japão. Ministrado na Universidade de Cantabria. 27 Setembro 2004.
- Seminário: Modelos de particulas e elementos finitos para interação fluxo-estrutura. Eugenio Oñate (CIMNE). Ministrado na Universidade de Cantabria. 12 Janeiro 2005.
- CIRP Technology Transfer Workshop "Prediction and Modeling of Sediment Transport and Morphology Change at Beaches and Inlets". 30 horas. Ponte Vedra Beach. Florida. Fevereiro 2003.
- Curso do Sistema de Modelagem Costeira, Ministrado pelo Grupo de Engenharia Oceanográfica e de Costas da Universidade de Cantabria e a Direção Geral de Costas do Ministério de Meio Ambiente (30 horas). Madrid. Dezembro de 2002.
- Curso à distância: "Cálculo de estruturas pelo método de elementos finitos". Fevereiro 2002- Maio 2002
- Advanced Surface-Water Modelling with SMS. Environmental Modelling Software INC (EMS-I). Environmental Hidraulic Laboratory (Bringham Young University). 40 horas. Provo Utah (USA). Dezembro 2001.
- Curso sobre o projeto de medidas corretivas do impacto ambiental das obras públicas (25 horas). Ministrado no Colégio de Engenheiros Civis de Madrid. Abril 2001.
- Assistência ao seminário de Tricalc 5.0 em A Corunha. Dezembro 2000.
- Assistência ao curso: "Critérios Geotécnicos de Desenho de Taludes e Túneis" Ministrado na Universidade Politécnica de El Salvador pelo Dr Engenheiro de Minas Don José Maria Galera, da Universidade Politécnica de Madrid. Agosto 2000.
- Curso de projetista e instalador de Energia Solar. CENSOLAR (Centro Espanhol de Energia Solar). Promoção de 1998-1999.
- Organização e assistência das V Jornadas Espanholas de Engenharia de Portos e Costas, ministradas na ETSICCP de A Corunha. Setembro 1999.
- Realização e montagem do mapa "Cartografia histórica dos Caminhos de Santiago da provincia de A Corunha". Trabalho liderado pelo professor D. Carlos Nárdiz publicado pela Deputação de A Corunha. Junho 1999.
- Curso de 180 horas nos anos 1998-1999 do Contorno Microstation: utilização do programa de desenho gráfico Microstation, de desenho industrial Microstation Modeler e programas de planejamento económico Menfis e Project.

Capacidades Profissionais:

Suas áreas de especialização incluem fundamentalmente obras lineares e urbanas, engenharia de costas e obras marítimas, com particular atenção aos modelos hidrodinâmicos do meio fluvial e marinho, circulação estuarina, ondulação, dinâmica sedimentaria, morfologia de praias.

Conhecimento a nivel profissional de software de engenharia:

- Vasto conhecimento de programas de CAD (Microstation).
- Engenharia marítima:
  - Sistema de modelagem costeira: SMC
  - Ondulação: STWAVE, CGWAVE, OLUCA.
  - Agitação e onda larga: MSP, BOUSS2D, MANOLO.
  - Correntes: ADCIRC, M2D, COPLA.
  - Morfologia de praias: GÊNESIS, SBEACH, PETRA.
  - Cálculo de estruturas marítimas: ACES, TIC.

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 384

- Engenharia hidráulica: hidráulica 1D (HEC-RAS, MIKE 11), hidráulica 2D em rios (RMA2, TUFLOW), transporte de sedimentos e poluentes (SED2D).
- Engenharia hidrológica: Modelos distribuídos y semi-distribuídos.
- Engenharia sanitária: modelo SWMM.
- Cálculo de estruturas. Programas TRICALC, CYPECAD, SAP, COSMOS...
- Traçado de obras lineares: INROADS.
- Engenharia solar: CENSOL-1, CENSOL-3, CENSOL-5, SOLARIS.
- Elaboração de orçamentos: MENFIS, ARQUÍMEDES.

Programação em linguagens Matlab, fortran.
Experiência em assistência técnica em obra como diretor de obra e coordenador de segurança e saúde.

Registro histórico de empregos relevante para o serviço:

Período	Organização empregadora e seu cargo/posição. Informações de contato para referência	País	Resumo das atividades desempenhadas relevantes para o Serviço
2005-Atualmente	Diretor gerente AQUÀTICA Engenharia Civil, S.L.	-	Empresa de consultoria em desenvolvimento de projetos de engenharia civil, assistência técnica e supervisão de obra, estudos econômicos financeiros. Especializada em empreendimentos portuários e estudos hidrodinâmicos e dinâmica costeira.
2007-2009	Universidade de A Corunha- Mestrado de Engenharia da Agua	-	Colaborador como professor da cadeira "Modelos numéricos hidrodinâmicos na ETSICCP de A Coruña".
2004- 2005	Grupo de Engenharia Oceanográfica e de Costas- Universidade de Cantabria Realização de projetos de consultoria de engenharia marítima e portuária.	-	Investigação pré-doutorado da Universidade de Cantabria, realizando a tese doutoral: "ESTUDO DA ESTABILIDADE DE QUEBRA-MARES GALGÁVEIS E SUBMERSOS POR MEIO DE MODELO RANS".
2003-2004	Universidade de A Corunha	-	Colaborador como professor da cadeira: "Introdução à cooperação para o desenvolvimento" na ETSICCP de A Corunha. Seminário: "Novos movimentos sociais. Fórum Social Mundial".
2003-2004	Universidade de Vigo	-	Organização e participação como palestrante no curso de verão "Rompendo o circulo da pobreza" Ano 2003 organizado por ESF e a Universidade de Vigo no tema "Projetos de cooperação ao desenvolvimento".
2002-2003	Universidade de A Corunha	-	Colaborador como professor da cadeira: "Introdução à cooperação para o desenvolvimento" na ETSICCP de A Corunha. Seminário: "Divida externa e movimentos sociais".
2001-2002	Universidade de A Corunha	-	Colaborador como professor da cadeira: "Introdução à cooperação para o desenvolvimento" na ETSICCP de A Corunha. Seminário: "Tecnologias apropriadas em cooperação para o desenvolvimento".
2000-2003	Engenharia Civil do Atlántico S.A. ÍNCAT Empresa consultora de elaboração de projetos de engenharia civil, assistência técnica e supervisão de obra.		Elaboração de projetos em distintas áreas da engenharia civil. Foi parte da equipe técnica em projetos de rodoviárias, estações de serviço, campos esportivos, edifícios industriais, instalações esportivas, docas, obras marítimas, portos esportivos, urbanizações e informes. Responsável da área de estruturas e estudos de impacto ambiental. Calculo de instalações de energia solar.
2000-2000	Universidade Politécnica de El Salvador	San Salvador	Professor da cadeira Mecânica Estrutural na Escola Superior de Engenharia Civil.

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 385

2000-2000	CONSULTORIA HDH S.A. de C.V. Empresa dedicada à elaboração de projetos estruturais, assistência técnica e reparação de estruturas afetadas pelos sismos.	San Salvador	Calculista de estruturas e assistência técnica. Realização de levantamentos topográficos e ensaios de resistência. Responsável de projeto "Cálculo da coberta da catedral de São Vicente".
1995-Atualmente	Engenharia sem Fronteiras Organização não governamental dedicada à realização de projetos de cooperação ao desenvolvimento.	-	Coordenador do grupo de projetos de Galicia durante os anos 1998 e 1999. Cálculo de instalações solares. Gestão de subvenções aos projetos. Responsável do projeto: "Ajuda para autogestão de casas família em Scutari (Albânia)" Ano 2001. Colaborador como professor da cadeira "Introdução à cooperação para o desenvolvimento na ETSICCP de A Corunha". Ano 2001: "Tecnologias apropriadas em cooperação para o desenvolvimento" Ano 2002: "Divida externa e movimentos sociais" Ano 2003: "Novos movimentos sociais. Fórum Social Mundial". Organização e participação como palestrante no curso de verão "Rompendo o circulo da pobreza" Ano 2003 organizado por ESF e a Universidade de Vigo no tema "Projetos de cooperação ao desenvolvimento".

Filiação de associaçõesprofissionais e publicações:

1. "Hydrodynamic and morphological evolution in the estuary of river Ulla (Galicia, Espanha)".

Peña E., López Mera F., Puertas J. (Universidade de A Corunha)

Ninth International Symposium on River Sedimentation (9th ISRS) Yichang, China, 18-21, Out. 2004.

2. "Puerto deportivo en Canido. Metodología para trabajo hidrodinámico dentro de las Rías Gallegas".

López Mera, F. Projeto de Mestrado em Ciências e Tecnologias para a Gestão da Costa. Universidade de Cantabria 2004.

3. "Hidráulica experimental: Experimentación en laboratorio de secciones sumergidas protegidas con escollera sometidas a oleajes variables"

López Mera, F. Dissertações doutorado Universidade de A Coruña. 2004.

4. "Flujo turbulento: Modelización numérica de secciones sumergidas protegidas con escollera sometidas a oleajes variables"

López Mera, F. Dissertações doutorado Universidade de A Coruña. 2004.

5. "Hydrodynamic and morphological evolution in the estuary of river Eume (Galicia, España)" (num. 047).

López Mera F., Peña E., Sopelana J., Puertas J., Vidal C. (Universidade de A Corunha)

5th International Conference on Coastal Dynamics 2005. Barcelona, Espanha, 4-8 Abril 2005.

6. "Incorporación de nuevos modelos de propagación en playas situadas en Rías, Estuarios o Grandes Lagos dentro del Sistema de Modelado Costero".

López Mera F., Medina R., González M. (Universidade de Cantabria).

VIII Jornadas Espanholas de Engenharia de Portos e Costas. 15-16 Maio Sitges 2005.

7. "Design formula of rubble mound low crested structures" POSTER

López Mera F., Vidal C., García N.

30th Internacional Conference of Coastal Engineering. San Diego (EE. UU.). Setembro 2006.

8. "River mouth evolution and dredging strategy in the Eume's estuary (Spain)".

J. Sopelana, F.R. López, E. Peña, J. Anta. (Aquática Engenharia, Universidade de A Corunha).

Enviado: 10th international symposium on river sedimentation: 1 August 2007 - 4 August 2007. Moscovo, Rússia.

9. "Caracterización hidráulica y estructural en modelo físico de una tipología de pantalla. Análisis de sensibilidad de parámetros". E.Pena, J.Sopelana, F.Lopez Mera, , F.Sanchez-Tembleque.

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 386

Inglês	Fluente	Fluente	Fluente
Francês	Bom	Bom	Bom
Português	Regular	Regular	Regular

Adequação para o serviço:

Tarefas detalhadas atribuídas à Equipe de especialistas do Consultor:
0 - ATIVIDADES PREPARATÓRIAS E GERENCIAIS DO CONTRATO 00.3 - Reunião de partida (kick-off meeting) **1 - PLANO DE TRABALHO** 101 - Identificação e levantamento das informações existentes 104 - Elaboração do plano de trabalho 109 - Validação do Plano de Trabalho Final (P.T.F) **2 - CONTEXTUALIZAÇÃO** 201 - Levantamentos e análise de dados secundários 202 - Levantamentos e análise de dados primários 203 - Elaboração de mapas georreferenciados para interpretação dos dados. 204 - Elaboração de diagnostico e da matriz FOFA 205 - Elaboração de benchmark para identificação de boas práticas internacionais 206 - Elaboração do Relatório de Contextualização Inicial (RCI) 211 - Validação do Relatório de Contextualização Final (R.C.F) **3 - CRIAÇÃO DOS CENÁRIOS E VISÃO DE FUTURO** 301 - Construção dos cenários de desenvolvimento sustentável e avaliação de impactos 302 - Formulação de visão geral de futuro para até 2035 303 - Estabelecimento de objetivos e metas previstas 304 - Definição dos eixos estratégicos e princípios orientadores do Plano 306 - Elaboração do Relatório de Construção de Cenários e Visão de Futuro Inicial (R.C.C.I) 311 - Validação do Relatório de Construção de Cenários e Visão de Futuro Final (R.C.C.F.) **4 - PLANO DE AÇÃO** 401 - Zoneamento territorial 402 - Definição de programas e propostas de ação 406 - Elaboração do Relatório de Plano de Ação Inicial (R.P.A.I.) 411 - Validação do Relatório de Plano de Ação Final (R.P.A.F.) **5 - CONFERÊNCIA REGIONAL** 501 - Elaboração do documento final do Plano
Informação sobre trabalho/serviço anterior que melhor ilustre a competência para lidar com as tarefas designadas
Desde Aquática Engenharia Civil: • Estudo de alternativas para a cobertura do rio Raizes no ambiente Avilés. Estudo hidrológico hidráulico. 2016. • Projeto de construção: obras de melhoria das instalações échouages Domayo Meira. Moaña. Pontevedra. 2016. • Projeto de construção: reorganização e transferência de instalações para barcos de pesca no porto de Xufre. A Illa de Arousa, Pontevedra. 2016. • Projeto de construção: novos pantalanes para a frota de pesca no porto de Porto do Son. A Coruña. 2016 • Relatório sobre a proposta de alternativas de melhoria em praia "La Romana" hotel Bahia Principio (Rec. dominicano). 2016 • Estudo alternativo e projeto construtivo para o cais da inclinação o Cavadelo, Vilagarcia de Arousa (Pontevedra). 2016. • "Desenvolver o plano e gestão de bacias hidrografica rios Lill-Mendez-Cañaveralejo (código 2630) e de ajuste (atualização) do plano de manejo e gestão da Bacia do Rio Cali (código 2634), sob a gestão de risco do projeto incorporação do componente de gestão do risco como um determinante ambiental do ordenamento do território na formulação e / ou actualização dos planos e gestão de bacias hidrográficas afectadas pelo fenómeno da Niña 2010-2011. Corporação

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 387

X Jornadas Espanholas de Engenharia de Portos e Costas. 27-28 Maio 2009. Santander.

10. "Seawalls parameter characterization and sensitivity analysis: transmission coefficients and maximum loads". E.Peña, F.Sanchez-Tembleque, J.Sopelana, F.Lopez Mera. Coasts, Marine Structures and Breakwaters 2009.

16 – 18 setembro 2009, Scotland, UK.

11. "Nuevas metodologías para el cálculo de la estabilidad de diques rebasables y sumergidos" para o libro: "Premios Modesto Vigueras de la Asociación Técnica de Puertos y Costas". ISBN: 978-84-88975-72-0. Ano 2009

12. "Comportamiento estructural de las líneas de fondeo en diques flotantes frente a oleaje de fondo". López Mera F, Sopelana J, E.Peña, A.Lopez, F-Sanches Tembleque, J Ferreras.

XI Jornadas Espanholas de Engenharia de Portos e Costas. 2011

13. "Harbor paradox. Estudio integral de agitación" López Mera F, Sopelana J, Díaz-Hernández G., Vigo-Baz M.

XII Jornadas Espanholas de Engenharia de Portos e Costas. 2013.

Participação em Projetos de Investigação:

1. PROJETO FLOMAR: "Novos conceitos e metodologias no desenho e construção de quebra-mares e pieres flutuantes de concreto como obras marítimas de abrigo e ancoradouro".
PROGRAMA FEDER INNTERCONECTA 2012-2014
Investigador principal

2. E 17/08 CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA DO MÉDIO FÍSICO MARINHO ESPANHOL PARA A OPTIMIZAÇÃO DA EXPLORAÇÃO PORTUÁRIA E A NAVEGAÇÃO MARÍTIMA- DETERMINAÇÃO DE PERÍODOS RESSONANTES NOS PORTOS ESPANHÓIS.
Projeto coordenado com o Instituto de Hidráulica de Cantabria
Plano Nacional de I+D+I 2008-2011 do Subprograma para a mobilidade sustentável e a mudança modal para o transporte. Ação Estratégica Energia e Mudança Climática.

3. Desenvolvimento de Metodologias para a prossecução de melhores localizações para usinas de energia maremotriz. Desenvolvimento de atlas galego de energia maremotriz. (PGIDIT07REM008E).
Investigador principal.
Projeto coordenado com o Centro de Investigações Submarinas.
Programa setorial de I+D. Xunta de Galicia. 2006-2008

4. Desenvolvimento dum sistema de modelagem numérica para cálculo de correntes em praias dentro de rias ou estuários. (PGIDIT06TAM013E).
Investigador principal.
Projeto coordenado com o Centro de Investigações Submarinas.
Programa setorial de I+D. Xunta de Galicia. 2005-2007

5. Desenho e teste a escala dum novo modelo de barreira anti-ondulação. (PGIDIT06DPI207E)
Projeto coordenado com Isolamentos Térmicos de Galicia.
Programa setorial de I+D. Xunta de Galicia. 2005-2007

6. Desenvolvimento do Sistema de Modelagem Costeiro (SMC).
Introdução no sistema de modelos de propagação baseados na equação da conservação da ação de onda.
Universidade de Cantabria, Ministério de Meio Ambiente. Supervisionado pelo Dr. Raúl Medina González. 2004-2005.

7. Projeto europeu Feder-Tubo. Estudo teórico e experimental de tubos de alta densidade para sua utilização na construção em locais expostos a ondulação com grande altura de onda significante.
Calibração e validação de modelos numéricos de Navier-Stokes através de dados de laboratório.
Universidade de Cantabria. Supervisado pelo Dr. Pedro Lomónaco Tonda.

8. Estudo da cria da amêijoa na Ria de Arousa.
Estudo das condições hidrodinâmicas e morfológicas da Ria de Arousa.
Fundação da Engenharia Civil de Galicia. Supervisionado pelo: Dr. Jerónimo Puertas Agudo.

9. Estudo das condições hidrodinâmicas para a cria do pregado nas Rias Galegas.
Vigo- Pescanova S.A. 2001-2002 trabalhando para INCAT S.A.

Idiomas:

Idiomas	Falar	Ler	Escrever
Galego	Nativo	Nativo	Nativo
Espanhol	Bilingue	Bilingue	Bilingue

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 388

Autónoma Regional do Valle del Cauca. 2015-2016.

- Modelagem da qualidade de água do embalse e águas abaixo do projecto hidroelètrico Ituango. 2014-2016.
- Serviço de apoio para a realização das tarefas de acordo do regime de volumes ecológicos das massas de água da categoria rio da demarcación hidrográfica de Galiza-Costa. 2014-2015.
- Estudo de alternativas para a melhoria da dinâmica costeira no porto de Cesantes, Redondela. Pontevedra. 2015.
- Projeto de adaptação do projeto de construção ordenamento da margem direita do rio Verdugo entre Pontesampaio e Insuíña; T.M. Pontevedra (Pontevedra). 2015.
- Projeto de construção: dique flutuante para melhoria do abrigo do porto de Portonovo Sanxenxo, Pontevedra. 2015
- Estudo hidrogeológico de onze túneis - projeto variante Mocoa - São Francisco. De 2014.
- "Elaboração e redação do estudo da demanda da análise das necessidades do setor portuário das Ilhas Baleares para a redação dos planos diretores dos portos." 2014- Em execução.
- "Projeto básico: Porto para embarcações esportivas em San Adrián de Cobres, Vilaboa, Pontevedra". Setembro de 2014.
- "Projeto para concurso de adjudicação: Melhora da drenagem superficial, condução à descarga e regeneração da praia de Carabuxeira." Junho 2014.
- "Projeto de construção: Instalação de um pier náutico no pântano da margem de Ayamonde, Huelva". Maio 2014
- "Estudo prévio: Instaleções náutico-recreativas na Ilha de A Toxa. O Grove, Pontevedra." Abril 2014.
- Estudo de afeição do porto externo Langosteira sobre a dinâmica costeira e sedimentar da zona ". Autoridade Portuária A Coruña. Ano 2013 - 2014.
- Elaboração dos planos de gestão com base comunitária de diferentes solos húmidos e de sectores naturais protegidos nas Ilhas Fuvahmulah e Hithadhoo (ilhas Maldivas). 2013-2014
- "Elaboração de mapas de periculosidade e risco de inundação para Galicia costa: área hidrográfica Galicia centro". Águas de Galicia. Ano 2012-2015.
- "Estudo de Alternativas para a implantação de um local de marinas esportivas na área de Amador. Panamá City". Unidade Administrativa de Bens Revertidos. Ministério de Economia E Finanças de Panamá. Ano 2012.
- "Projeto de construção de uma praia artificial em Campeche (México). Campeche Country Club." Ano 2012.
- "Projeto de construção e direção de obra de um novo porto esportivo na doca central da AP Vigo. Real Club Náutico de Vigo." Anos 2011-12.
- "Projeto de construção: Ampliação e ordenação do porto de Portonovo, Pontevedra. Portos de Galicia." Fevereiro 2012.
- "Projeto básico de construção e direção de obra de um novo porto esportivo em Cabo de Cruz (Boiro). Club Náutico de Boiro." Anos 2011-12.
- "Plano hidrológico de Galicia Costa, Águas de Galicia". Anos 2009-2011.
- "Projeto de Construção: Estrutura de abrigo e pier de ancoragem na doca de A Laxe. Autoridade Portuário de Vigo". Dezembro 2010.
- "Assistência técnica à obra: Ampliação de Espaços Portuários no Porto de Caión. Construções López Cao". Ano 2012.
- "Projeto de construção de Ampliação de Espaços Portuários no Porto de Caión. Portos de Galicia". Agosto 2010.
- "Projeto de Ampliação do Porto de O Grove. Portos de Galicia". Setembro 2010.
- "Determinação de áreas inundáveis e Dominio Público Hidráulico nas bacias de Galicia Costa. Águas de Galicia". Dezembro 2009.
- "Estudo de agitação e onda longa no novo porto exterior de A Corunha. Ponta Langosteira SENER Engenharia e Sistemas". Fevereiro 2009.
- "Estudo da dinâmica litorânea do projeto de ampliação do porto de Vilagarcia de Arousa (Pontevedra). Autoridade Portuária de Vilagarcia". Fevereiro 2009.
- "Estudo de colmatarão no porto de Sidi Ifni" Agencia Nacional de Postos de Marrocos. Dezembro 2008.
- "Projeto básico para a cria de praias na Ilha de São Tiago (Cabo Verde). Grupo Sacramento Campos". Julho 2008.
- "Plano diretor de instalações náutico-esportivas dependentes do ente público Portos de Galicia". Abril 2008
- "Projeto para a ordenação da lâmina d'agua com rosetas de fundeio autônomas no porto de Mahón". Janeiro 2008.
- "Emissário submarino de dessalinizadora de Honaine (Argélia). Técnicas Reunidas". Dezembro 2007.
- "Projeto de construção de coletores gerais e ETAR em O Grove. Concelho de O Grove". Novembro 2007
- "Ampliação do porto de Saidia. Fadesa Maroc". Setembro 2007.
- "Projeto para concurso de adjudicação de estação de tratamento de águas residuais de Caloira e Xove. Puentes Infraestruturas". Agosto 2007
- "Projeto básico de novas instalações náutico-esportivas em Pasaxe de Camposancos. CN Camposancos". Julho 2007.
- "Nova instalação náutico-esportiva no quebra-mar de levante dos molhes de a Osa. Porto de Gijón. UTE Marina Gijón". Dezembro 2006.
- "Recuperação da borda litorânea entre praia Fontenla e a praia de A Lanzada. Concelho de Sanxenxo". Setembro 2006.
- "Projeto de construção da estrada Parque Empresarial – Vilalonga. Concelho de Sanxenxo". Setembro 2006.
- "Urbanização do âmbito de As Telleiras. Concelho de Sanxenxo". Agosto 2006.
- "Reordenação do espaço portuário de Portonovo. Concelho de Sanxenxo". Junho 2006.

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 389

- "Estudo morfodinâmico e de evolução da praia de Silgar, (Sanxenxo), Concelho de Sanxenxo". Março 2006.
- "Ampliação do porto de Saidía, Fadesa". Março 2006.
- "Projeto de construção de estacionamento subterrâneo em Aral (Baiona). Sofranda construtora". Junho 2006.
- "Projeto para concurso de adjudicação de estacionamento subterrâneo Aral (Baiona). Sofranda construtora". Março 2006.
- "Estudo de dinâmica litorânea do porto de Saidía" Fadesa. Janeiro 2006.
- "Estudo de ondulação no porto de Sada. Norai Engenharia e Arquitetura". Janeiro 2006.
- "Estudo prévio de um novo porto esportivo em Taghazout (Marrocos) Fadesa". Dezembro 2005.
- "Projeto básico para concurso de adjudicação de um novo porto esportivo em Cedeira. Exponáutica". Junho 2005.
- "Projeto básico para concurso de adjudicação de um novo porto esportivo em Combarro. Paragefa". Abril 2005.

Desde o Grupo de Engenharia Oceanográfica e de Costas da Universidade de Cantabria:

- "Análise da ondulação como recurso energético na costa Vasca. Ente Vasco da Energia". Abril 2005.
- "Estudo da estabilidade das estruturas de Puerto Caldera (Costa Rica). Instituto de Turismo de Costa Rica". Fevereiro 2005.
- "Determinação dos regimenes de ondulação na costa pacífica costarriquenha. Instituto de Turismo de Costa Rica". Dezembro 2004.
- "Estudo da dinâmica litorânea do novo porto de Arinaga. Portos de Las Palmas". Setembro 2004.

Desde Engenharia Civil do Atlântico:

- "Estudo hidrodinâmico da área do Parque Nacional das Ilhas Atlânticas para apoio de limpeza de hidrocarbonetos" Janeiro 2003.
- "Estudo de soluções e efeitos da dinâmica litorânea sobre os sistemas da vizinhança da praia de Cabanas e da praia de Areamorta, T.M. Cabanas y T.M. Ares". Novembro 2002.
- "Área de serviço de Cartaya (Huelva)". Setembro 2002.
- "Informe sobre os efeitos da dinâmica litorânea na ampliação do porto de O Grove". Abril 2002.
- "Estudo das condições hidrodinâmicas para a cria do pregado na Ria de Arousa". Julho 2002.
- "Estudo da ondulação na Ría de Arousa". Julho 2002.
- "Estudo de ondulação para o porto de Cabo de Cruz". Abril 2002.
- "Centro de conservação de estradas de A Gudiña (Ourense)". Março 2002.
- "Estudo dos efeitos sobre a dinâmica litorânea da ampliação do porto de Vilanova de Arousa (Pontevedra)". Março 2002.
- "Passarela de pedestres em Placeres". Fevereiro 2002.
- "Estudo das condições hidrodinâmicas para a cria do pregado na Ria de Vigo". Janeiro 2002.
- "Estudo dos efeitos sobre a dinâmica litorânea. Projeto de instalações para a náutica recreativa. Baiona, (Pontevedra)." Dezembro 2001.
- "Cálculo de cimentação por microestacas da nova lota de grandes peixes e pesca costeira do Porto de Vigo". Novembro 2001.
- "Ampliação do prédio de serviços do porto de Arcade (Pontevedra)". Agosto 2001.
- "Remodelação da rodoviária portuária em A Guardia (Pontevedra)". Julho 2001.
- "Cálculo de flutuabilidade, estabilidade e escora de pieres no porto esportivo de A Coruña" Julho 2001.
- "Quebra-mar flutuante em O Grove (Pontevedra)" Junho 2001.
- "Informe sobre a viabilidade de construção numa parcela em O Gorxal". Junho 2001.
- "Estudo de agitação interior no porto de O Grove (Pontevedra)". Maio 2001.
- "Instalações náutico-esportivas em Sada (A Coruña)". Maio 2001.
- "Pieres flutuantes em Escarabote (A Coruña)". Abril 2001.
- "Pieres flutuantes em Alcalá do Rio (Sevilla)". Março 2001.

Em AQUÁTICA ENGENHARIA CIVIL:

- 2008. Projeto de construção.
  Projetos de ampliação das novas instalações portuárias de Ponta Langosteira.
  Autoridade Portuária de A Corunha. (Espanha)

Em SENER ENGENHARIAS E SISTEMAS:

- 2005. Estudo de viabilidade.
  Estudo de viabilidade para o novo terminal de contentores em Esmirna. (Turquia)
- 2005. Projeto de construção.
  Ampliação do porto de Gijón.
  Autoridade Portuária de Gijón. (Espanha)

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 390

Em INCAT S.A.:

- 2002. Projeto básico
  Proposta para o concurso público de seleção de uma oferta para tramitação da concessão de ocupação do Dominio Público Portuário do Porto de Moaña, para sua construção e exploração. Ronáutica S.A. (Espanha)
- 2002. Projeto de construção.
  Contrato de concessão de área de serviço de Cartaya. Autoestrada do V Centenário. A-49. P.K. 102 T.M. Cartaya, Huelva. Euroll. (Espanha)
- 2002. Projeto de construção.
  Remodelação das instalações para embarcações pequenas em A Pobra do Caramiñal.
  Portos de Galicia (Espanha)
- 2002. Projeto de construção.
  Repintagem da marcação horizontal da autoestrada das Rias Baixas A-52, P.K. 112.230 a 267.100
  UTE Ferrovial, Agromán e Extraco.
- 2002. Projeto de construção. Via litorânea de conexão entre o cais para passageiros alé o cais de O Con. Portos de Galicia.
- 2002. Projeto de construção. Instalação de pier flutuante no rio Sil. Viajes Hemisferios, S.L.
- 2002. Projeto de construção. Urbanização do P.E.R.I. do Rocio. Vigo Pontevedra Junta de Compensação do P.E.R.I. do Rocio (Espanha)
- 2002. Projeto de construção. Adequação da sinalização indicativa nas autoestradas A-6, A-52, N-550 y N-120 Caminos, Carreteras y Asfaltos, S.L.
- 2002. Projeto de construção. Urbanização da travessia de Picota Interior. Promociones Ensenada San Simón S.L.
- 2002. Projeto de construção. Modernização da ETAR da Ilha de A Toja S.A. Internacional de Terrenos y Edificios
- 2002. Projeto conceitual Via litorânea de conexão entre o cais para passageiros alé o cais de O Con. Portos de Galicia.
- 2002. Projeto de construção. Urbanização da unidade de aluação nº 10. Junta de compensação da unidade de atuação 10.
- 2002 Projeto de construção. Centro de conservação de estradas, A Gudiña UTE Copasa Geseco
- 2002 Projeto de construção. Centro de conservação de estradas, Allariz. UTE Extraco Ferrovial.
- 2002 Estudo de impacto ambiental. Estudo de impacto ambiental do novo porto esportivo de Vilanova de Arousa Portos de Galicia.
- 2002 Projeto básico Nave industrial de armazenamento no porto de Vigo. Terminales Marítimos del Atlántico
- 2002 Departamento técnico. Pier e acondicionamento de encoro de San Estevo, Ourense (Espanha). Ronáulica S.A.
- 2002 Direção de obra Estacionamento para residentes na praza Bonaire em Málaga (Espanha). Sociedade Municipal de Estacionamentos e Serviços SA
- 2001 Projeto de construção. Canalização da drenagem longitudinal na C-550 PK 162+200, margem esquerdo. Trecho Baiona - La Guardia. Rául González Granja.
- 2001 Projeto de construção. Rotatória em CN 532 P.K. 1+600 Concelho de Verín.
- 2001 Projeto alterado Modificado nº1: via de conexão entre cais. Portos de Galicia.
- 2001 Cálculo Cálculo de cimentação por microestacas da nova lota de grandes peixes e pesca costeira do Porto de Vigo. FCC Construção.
- 2002 Estudo
- Estudo das condições hidrodinâmicas para a cria do pregado em gaiolas fundeadas Insuña Pescanova.
- 2002 Projeto de construção. Nave para processado de vieiras Vieira de Galicia S.L.
- 2001 Estudo estudo da dinâmica litorânea para o estudo do impacto ambiental do porto esportivo de Baiona. Ronáulica S.A.
- 2001 Projeto de construção. Pier flutuante no porto de Bueu. Portos de Galicia.
- 2001 Projeto alterado Modificado nº1. Duplicação de estrada e reordenação da interseção CN-558, trecho Pontevedra – Porto de Marin P.K. 3,500 alé o P.K.4,100.
  Vias e Construções.
- 2001 Projeto de construção.
  Remodelação da rodoviária portuária em A Guarda
  Portos de Galicia.
- 2001 Estudo
  Estudo de alternativas para as instalações náutico-esportivas em Vilanova.
  Portos de Galicia
- 2001 Projeto de construção.
  Instalação flutuante e adequação da vizinhança do Centro Interfederado de Remo
  Prefeitura de Tui (Espanha).
- 2001 Estudo informativo
  Ampliação do porto esportivo de Ribadeo.

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 391

Portos de Galicia

- 2001 Projeto de construção.
  Pier flutuante em Altar. Barreiros.
  Portos de Galicia
- 2001 Projeto de construção.
  Pieres no porto de Baiona.
  Portos de Galicia
- 2001 Projeto de construção.
  Ampliação do prèdio de serviços do porto de Arcade.
  Portos de Galicia
- 2001 Projeto de construção.
  Instalação de pier flutuante para serviço de travel lift de Construcciones y Astilleros Llagoa S.A.
  Construcciones y Astilleros Llagoa S.A.
- 2001 Projeto básico
  Ampliação do porto de Cesantes.
  Portos de Galicia
- 2001 Projeto alterado
  Modificado nº1. Acondicionamento da travessia de Vigo.
  Arias Hermanos
- 2001 Projeto de construção.
  Via litorânea de conexão entre o cais para passageiros até o cais de O Con.
  Portos de Galicia
- 2001 Projeto de construção.
  Instalações para a náutica recreativa em Baiona.
  Ronáutica S.A.
- 2001 Projeto de construção.
  Quebra mar flutuante no porto de O Grove.
  Portos de Galicia
- 2001 Projeto de construção.
  Pieres no porto de Escaraboie.
  Portos de Galicia
- 2001 Projeto de construção.
  Instalações náutico-recreativas em Sada
  Clube náutico de Sada.
- 2001 Projeto de construção.
  Pier flutuante no reservatório de Santa Teresa. Salvaterra de Tormes.
  9001 Hidratec S.L.
- 2001 Projeto e supervisão de obra.
  Instalação de um elevador no Real Clube Náutico de Vigo.
  Schindler S.A.
- 2001 Projeto de construção.
  Área de serviço de Colunga. Autoestrada do Cantábrico, A-8 T.M. Colunga (Astúrias).
  Ceyd S.A
- 2001 Projeto de construção.
  Contrato de concessão de área de serviço em Guilliz.
  Polucor Áreas de Serviço S.A.
- 2000 Projeto de construção.
  Contrato de concessão de área de serviço de Ponteareas autoestrada das Rias baixas. A-52. P.K. 292 T.M. Ponteareas
  Polucor Áreas de Serviço S.A.
- 2000 Projeto de construção.
  Remodelação do acesso em CN 551
  Oficina de projetos de Vigo
- 2000 Projeto básico
  Proposta para o concurso público de seleção de uma oferta para tramitação da concessão de ocupação do Domínio Público Portuário do Porto de Baiona, para sua construção e exploração.
  Ronáutica S.A
- 2000 Projeto de construção.
  Pieres flutuantes na praia de La Herradura. Almuñécar (Granada) / Ronáutica S.A

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 392

Informações de contato do Especialista: (e-mail: flopezmera@aquaticaingenieria.com, telefone: 659 85 09 67).

Certificado:

Eu, abaixo assinado, certifico que, sob o meu conhecimento e convicção, este CV descreve-me corretamente, minhas qualificações e minha experiência e que estou disponível para executar o serviço no caso de outorga. Estou ciente de que qualquer informação ou declaração falsa apresentada aqui pode resultar na minha desqualificação ou dispensa pelo Cliente e/ou na aplicação de sanções pelo Banco Mundial.

FERNANDO LOPEZ MERA
Nome do Especialista

Assinatura

15/08/2016

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 393

----**LEGITIMACION N° 216 DEL LIBRO INDICADOR** ----

LEGITIMACION.- Yo **MIGUEL LUCAS SANCHEZ,** Notario del Ilustre Colegio de Galicia, con residencia en Vigo, -------

DOY FE: Que la firma estampada en el presente documento redactado en idioma portugués, que entiendo y conozco suficientemente a los efectos de juzgar la licitud de su contenido, es la legítima de Don Fernando Rubén Lopez Mera, que identifico por su D.N.I. número 36126290-Y, por haber sido puesta en mi presencia. ----------

Vigo, a doce de junio de dos mil diecisiete.----------

FE PÚBLICA NOTARIAL
CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO ESPAÑA
NOTARIADO EUROPA
SANCHEZ - VIGO
0220267615
NIHIL PRIUS FIDE
A272158502

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 394

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

DH4224743

Testimonio de legitimación de firma, expedido por el Notario de Vigo, don Miguel Lucas Sánchez, el 12 de Junio de 2017, de la firma de Don Fernando Rubén López Mera.-

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. **País:** ESPAÑA
   Country / Paya :

El presente documento público
This public document / Le présent acte public

2. **ha sido firmado por** Don Miguel Lucas Sánchez
   has been signed by
   a été signé par

3. **quien actúa en calidad de** Notario de Vigo
   acting in the capacity of
   agissant en qualité de

4. **y está revestido del sello / timbre de** la Notaría
   bears the seal / stamp of
   est revêtu du sceau / timbre de

Certificado
Certified / Attesté

5. **en** Vigo at / à	6. **el día** 12/06/2017 the / le
7. **por** Don Jaime Romero Costas, Notario de Vigo, por delegación del Ilmo. Sr. Decano by / par	
8. **bajo el número** N6005/2017/005538 No sous no	
9. **Sello / timbre:** Seal / stamp: Sceau / timbre:	10. **Firma:** Signature: Signature :

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido.

Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

(No es válido el uso de esta Apostilla en España)

(Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: https://eregister.justicia.es)

Código de verificación de la Apostilla: NA:GIMh-hixA-MpID-e1N8

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

(This Apostille is not valid for use anywhere within Spain)

(To verify the issuance of this Apostille, see https://eregister.justicia.es)

Verification Code of the Apostille: NA:GIMh-hixA-MpID-e1N8

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

(L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au Espagne.)

(Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante https://eregister.justicia.es)

Code de vérification de l'Apostille: NA:GIMh-hixA-MpID-e1N8

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

DH2954102

09/2016

El presente folio es el agregado al documento en el que figura la firma de don Borja Criado Malagarriga, Notario de Barcelona, Colegio Notarial de Cataluña, en legitimación de firma de don Andreu Esquius Rafat, en un curriculum vitae, libro indicador 1172, de 9 de junio de 2017.

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. **País:** ESPAÑA
   Country / Pays :

El presente documento público
This public document / Le présent acte public

2. **ha sido firmado por** don Borja Criado Malagarriga
   has been signed by
   a été signé par

3. **quien actúa en calidad de** Notario
   acting in the capacity of
   agissant en qualité de

4. **y está revestido del sello / timbre de** la notaria
   bears the seal / stamp of
   est revêtu du sceau / timbre de

Certificado
Certified / Attesté

5. **en** Barcelona
   at / à

6. **el día** 12/06/2017
   the / le

7. **por** Don Javier Martínez Lehmann, Censor Primero del Colegio Notarial de Cataluña
   by / par

8. **bajo el número** N5301/2017/023486
   No
   sous no

9. **Sello / timbre:**
   Seal / stamp:
   Sceau / timbre:

FE PÚBLICA NOTARIAL
COLEGIO GENERAL NOTARIADO EUROPA NOTARIADO ESPAÑOL
NIHIL PRIUS FIDE
A262196643
022738463 4

10. **Firma:**
    Signature:
    Signature :

Javier Martínez Lehmann, Censor Primero

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.

Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

[No es válido el uso de esta Apostilla en España]

[Este Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: https://eregister.justicia.es]

Código de verificación de la Apostilla: NA:scmi-wgCE-fz6O-bucT

The Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Spain]

[To verify the issuance of this Apostille, see https://eregister.justicia.es]

Verification Code of the Apostille: NA:scmi-wgCE-fz6O-bucT

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au Espagne.]

[Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante https://eregister.justicia.es]

Code de vérification de l'Apostille: NA:scmi-wgCE-fz6O-bucT

BARCELONABRASILGROUP Mcrit hidria Quanta

CURRICULUM VITAE (CV)

Título e nº do cargo	K-05, Estruturação Social
Nome do Especialista:	Verônica Ferreira Machado
Data de nascimento:	28/05/74
País de origem/residência	Brasil/ Brasil

Educação:

Instituição	Título (s) ou Diploma (s) obtido:
Escola Nacional de Saúde Pública - ENSP/Fiocruz/Ministério da Saúde e Center for Disease for Control and Prevention - CDC, 2005	Especialização em Avaliação de Programas de Controle de Processos Endêmicos, com ênfase em HIV/Aids
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional – IPPUR Agosto 2003	Mestrado em Planejamento Urbano e Regional
Escola Superior de Propaganda e Marketing – ESPM, 1997	Pós-Graduação em Marketing
Fundação Escola de Serviço Público/FESP, 1996	Especialização em Gerência de Programas Sociais
FLACSO - Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, Universidade de Havana – Cuba, 1995	A Sociologia e o Sistema Educacional Cubano
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional – IPPUR, 1995	Especialização em Planejamento e Uso do Solo Urbano
Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1995	Ciências Sociais (Sociologia e Ciência Política

Registro histórico de empregos relevante para o serviço:

Período	Organização empregadora e seu cargo/posição. Informações de contato para referência	País	Resumo das atividades desempenhadas relevantes para o Serviço
Presente - 2013	Consórcio Quanta - ProBid. Consultoria em planejamento, monitoramento e avaliação de políticas públicas, Programas e projetos.	Brasil	Planejamento, monitoramento e avaliação das atividades técnicas desenvolvidas pelas equipes que atendem jovens de 15 a 29 anos, com foco na elaboração de uma política pública para juventude.
Presente - 2010	Rizoma – Assessoria em Planejamento, Monitoramento e Avaliação Especialista em Políticas Públicas e Políticas Sociais.	Brasil	Assessoria no desenho, utilização e implementação das ferramentas de gestão com foco na melhoria da qualidade de projetos nas áreas de cultura, desenvolvimento social e humano, educação, saúde e esporte.
2013 - 2012	Instituto de Estudos da Religião – ISER Consultora em análise de indicadores e políticas públicas	Brasil	Consultoria para o Programa: Safe and Friendly Cities for All – Confio no Meu Rio, com o objetivo de analisar indicadores sobre a violência contra mulher para a elaboração de políticas públicas.
2012 - 2011	UNAIDS Angola Consultora em planejamento e avaliação de políticas públicas	Brasil	Coordenação e realização do processo de Avaliação Rápida do Programa de Transmissão Vertical do VIH/SIDA e elaboração do Plano de Ação Nacional

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 397

			para Angola. Coordenação e facilitação de workshop com as 18 províncias para compartilhar o relatório e desenhar as linhas gerais e estratégicas do plano nacional.
2011 - 2010	ENSP/ Fundação Osvaldo Cruz - Fiocruz Coordenadora de Gestão Técnico - Científica do Projeto	Brasil	Coordenação dos processos de monitoramento e avaliação junto à equipe técnica. Suporte à coordenação geral do Projeto para tomada de decisão a partir da análise das informações. Estabelecimento de fluxos e processos de trabalho. Coordenação do processo de elaboração de relatórios técnicos entregues ao financiador do Projeto.

Filiação de associaçõesprofissionais e publicações:

AEA – American Evaluation Association

Idiomas:

Idiomas	Falar	Ler	Escrever
Português	Nativo	Nativo	Nativo
Inglês	Bom	Bom	Bom
Espanhol	Bom	Bom	Regular

Adequação para o serviço:

Tarefas detalhadas atribuídas à Equipe de especialistas do Consultor:

0 - ATIVIDADES PREPARATÓRIAS E GERENCIAIS DO CONTRATO
00.3 - Reunião de partida (kick-off meeting)

1 - PLANO DE TRABALHO
101 - Identificação e levantamento das informações existentes
104 - Elaboração do plano de trabalho
109 - Validação do Plano de Trabalho Final (P.T.F)

2 - CONTEXTUALIZAÇÃO
201 - Levantamentos e análise de dados secundários
202 - Levantamentos e análise de dados primários
203 - Elaboração de mapas georreferenciados para interpretação dos dados.
204 - Elaboração de diagnostico e da matriz FOFA
205 - Elaboração de benchmark para identificação de boas práticas internacionais
206 - Elaboração do Relatório de Contextualização Inicial (RCI)
211 - Validação do Relatório de Contextualização Final (R.C.F)

3 - CRIAÇÃO DOS CENÁRIOS E VISÃO DE FUTURO
301 - Construção dos cenários de desenvolvimento sustentável e avaliação de impactos
302 - Formulação de visão geral de futuro para até 2035
303 - Estabelecimento de objetivos e metas previstas
304 - Definição dos eixos estratégicos e princípios orientadores do Plano
306 - Elaboração do Relatório de Construção de Cenários e Visão de Futuro Inicial (R.C.C.I)
311 - Validação do Relatório de Construção de Cenários e Visão de Futuro Final (R.C.C.F.)

4 - PLANO DE AÇÃO
401 - Zoneamento territorial
402 - Definição de programas e propostas de ação
406 - Elaboração do Relatório de Plano de Ação Inicial (R.P.A.I.)
411 - Validação do Relatório de Plano de Ação Final (R.P.A.F.)

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 398

5 - CONFERÊNCIA REGIONAL 501 - Elaboração do documento final do Plano
Informação sobre trabalho/serviço anterior que melhor ilustre a competência para lidar com as tarefas designadas
PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL E OPORTUNIDADES PARA JOVENS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Ano: 2013 / Atual. Local: Rio de Janeiro - RJ. Contratante: Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos – SEASDH / Governo do Estado do Rio de Janeiro/RJ Principais características do projeto: Contribuir para a inclusão social e produtiva dos jovens que vivem em áreas onde estão as Unidades de Polícia Pacificadora (UPP's), considerando dois eixos principais de ação: (i) Acompanhar a trajetória formativa do jovem através do oferecimento de serviços de tutoria e aconselhamento, buscando a substituição de trajetórias de risco por trajetórias de inclusão para os jovens em contato com o tráfico e em situação de vulnerabilidade social; (ii) Articular demandas e ofertas de oportunidades para os jovens por meio de parcerias com outras secretarias de Estado, encaminhando-os para serviços públicos destinados a jovens. Cargo: Especialista. Atividades desempenhadas: Consultoria de apoio aos componentes 1 e 2 do Programa, "Sistema de Atenção Integral ao Jovem" e "Sistema de Expansão e Aprimoramento da Oferta", respectivamente.
SAFE AND FRIENDLY CITIES FOR ALL – CONFIO NO MEU RIO. Ano: 2012 / 2013. Local: Rio de Janeiro - RJ. Contratante: Instituto de Estudos de Religião – ISER, UNICEF, Habitat e ONU Mulheres Principais características do projeto: Avaliação dos sistemas de informação e das políticas públicas para construção de um plano de ação para o combate à violência contra mulheres, crianças e adolescentes, com foco nas 10 comunidades pacificadas pelas UPP. Cargo: Consultora. Atividades desempenhadas: Levantamento e análise de indicadores sobre a violência contra mulher e construção de um plano de ação para cinco anos.
REDE BRASILEIRA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO Ano: 2010 / atual Local: Abrangência Nacional Principais características do projeto: Comitê Gestor da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação. Cargo: Membro do Comitê Gestor da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação. Atividades desempenhadas: Planejamento estratégico da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação; organização do seminário anual da Rede; Mobilização e Alinhamento de stakeholders para o estabelecimento de Planos de Ação.
PROJETO IMPRESSÕES Ano: 2012. Local: Rio de Janeiro-RJ. Contratante: Serviço Social do Comércio - SESC. Principais características do projeto: Ampliar o acesso à cultura e a arte para grupos populacionais mais vulneráveis. Cargo: Facilitadora das oficinas Atividades desempenhadas: Oficinas sócio culturais com grupos da terceira idade com objetivo de ampliar a inserção social por meio da criatividade.
OBSERVATÓRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS Ano: 2006 / 2007. Local: São Paulo-SP. Contratante: Instituto de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Principais características do projeto: Planejar, monitorar e avaliar políticas públicas. Cargo: Assessora do Diretor. Atividades desempenhadas: Contribuição na elaboração de políticas públicas na prevenção ao HIV- AIDS por meio da análise de pesquisas (quantitativas e qualitativas), análise de dados secundários e organização de eventos e publicações temáticas; Organização de processos de monitoramento e avaliação para subsidiar a gestão; Cooperação técnica com 1 instituição internacional e 5 nacionais.
PROGRAMA ELOS

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 399

Ano: 2005 / 2006.
Local: São Paulo-SP
Contratante: Pact Brasil.
Principais características do projeto: 26 projetos; estabelecimento de parcerias com 1 instituição internacional e 2 nacionais.
Cargo: Assessora da Direção em Monitoramento e Avaliação.
Atividades desempenhadas: Avaliação, Monitoramento; Supervisão; fornecimento de assistência técnica 22 ONGs e Cooperação técnica com instituições.

SÍNTESE DE INDICADORES SOCIAIS; CENSO SINDICAL E PESQUISA NACIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO – PNSB
Ano: 1998 / 2002.
Local: Rio de Janeiro
Contratante: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
Principais características do projeto: Censo Nacional; Treinamentos; Questionário p/campo.
Cargo: Assessora Técnica.
Atividades desempenhadas: Elaboração da publicação "Síntese de Indicadores Sociais"; Organização de discussões temáticas; Contribuição na seleção e análise dos dados; Contribuição no desenvolvimento de 3 questionários para o censo nacional; Treinamento de 40 profissionais para coleta de informações no campo.

NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Ano: 1999 / 2000.
Local: Rio de Janeiro
Contratante: Associação Beneficente São Martinho.
Principais características do projeto: gerenciamento de projetos de promoção dos direitos de crianças e adolescentes.
Cargo: Assessora técnica.
Atividades desempenhadas: Gerenciamento, monitoramento, elaboração de projetos; captação de recursos.

AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE AÇÃO DA COMUNIDADE SOLIDÁRIA – FASE 1 E 2.
Ano: 1997 / 1999.
Local: Rio de Janeiro
Contratante: Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM.
Principais características do projeto: Programas sociais na região Norte e Nordeste do Brasil (in loco).
Cargo: Pesquisadora.
Atividades desempenhadas: Avaliação; Contribuição na elaboração da metodologia e dos questionários; Elaboração de relatórios técnicos; Elaboração de manual da Estratégia de Ação da Comunidade Solidária; Contribuição na elaboração de políticas públicas.

RIO - CIDADE II.
Ano: 1997 / 1998.
Local: Rio de Janeiro - RJ.
Contratante: Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM.
Principais características do projeto: Programas sociais na região Norte e Nordeste do Brasil (in loco).
Cargo: Coordenadora da área social.
Atividades desempenhadas: Elaboração de diagnóstico sócio demográfico do bairro de Irajá; Reuniões com associação de moradores; Desenvolvimento de metodologia social para o Projeto junto com a comunidade.

A DESCENTRALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS HABITACIONAIS: UMA AVALIAÇÃO DA EXPERIÊNCIA BRASILEIRA RECENTE.
Ano: 1994 / 1997.
Local: Rio de Janeiro - RJ.
Contratante: Observatório de Políticas Públicas e Gestão Municipal - IPPUR/URFJ.
Principais características do projeto: Monitorar e avaliar políticas públicas
Cargo: Pesquisadora mestranda.
Atividades desempenhadas: Pesquisa científica, incluindo desde a concepção do projeto, trabalho de campo, análise e disseminação das informações.

MAPA DA EXCLUSÃO SOCIAL.
Ano: 1995.
Local: Rio de Janeiro - RJ.
Contratante: Observatório de Políticas Públicas e Gestão Municipal - IPPUR/URFJ.
Principais características do projeto: mapeamento socioeconômico de comunidades no município do Rio de Janeiro.
Cargo: Auxiliar de Pesquisa.

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 400

Atividades desempenhadas: Pesquisa científica, incluindo desde a concepção do projeto, trabalho de campo, análise e disseminação das informações.
CULTURA E ETNIA NEGRA NO BRASIL. Ano: 1995. Local: Rio de Janeiro - RJ. Contratante: Observatório de Políticas Públicas e Gestão Municipal - IPPUR/URFJ. Principais características do projeto: investigar as influências da cultura da etnia negra em municípios da baixada fluminense, por meio da liga de capoeira e das associações comunitárias e de moradores. Cargo: Pesquisadora e Subcoordenadora de equipe. Atividades desempenhadas: Pesquisa científica, incluindo desde a concepção do projeto, trabalho de campo, análise e a disseminação das informações.
O ASSOCIATIVISMO NO RIO DE JANEIRO Ano: 1994 / 1995. Local: Rio de Janeiro - RJ. Contratante: Observatório de Políticas Públicas e Gestão Municipal - IPPUR/URFJ. Principais características do projeto: investigar as diferentes formas de associativismo da sociedade civil no município do Rio de Janeiro. Cargo: Auxiliar de Pesquisa. Atividades desempenhadas: Pesquisa científica, incluindo desde a concepção do projeto, trabalho de campo, análise e a disseminação das informações.

Informações de contato do Especialista: (e-mail: v_fm@hotmail.com, telefone: 21 98440-8354).

Certificado:

Eu, abaixo assinado, certifico que, sob o meu conhecimento e convicção, este CV descreve-me corretamente, minhas qualificações e minha experiência e que estou disponível para executar o serviço no caso de outorga. Estou ciente de que qualquer informação ou declaração falsa apresentada aqui pode resultar na minha desqualificação ou dispensa pelo Cliente e/ou na aplicação de sanções pelo Banco Mundial.

VERÔNICA FERREIRA MACHADO
Nome do Especialista

Assinatura

15/08/2016

RECONHECO POR SEMELHANÇA 24º OF. DE NOTAS - JOSÉ MARIO P. ESTRADA
AV. ALM. BARROSO, 137-C - (21)3553-8020
FIRMA(S) DE VERONICA FERREIRA MACHADO
Valor total: 7,14
Rio de Janeiro, 09/06/2017
LUCAS RIBEIRO DA SILVA
Consulte em https://www3.trj.jus.br/sitepublico
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
24 Lucas Ribeiro da Silva
Escrevente Autorizado
Matrícula: 84/18589

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 401

FIOTEC
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO EM SAÚDE

FAP
Fundação Ataulpho de Paiva

Fundo Global TB

Certificado

Certificamos que Verônica Ferreira Machado participou como *Perito* da Oficina para Elaboração de Currículo de Capacitação Presencial para Implantação da Estratégia DOTS no Nível Local, realizada no dia 17 de Outubro de 2007, com carga horária total de 08 horas.

Rio de Janeiro, 17 de Outubro de 2007.

Dr. Miguel Aiub Hijjar
Coordenador Técnico

Dr. Marcos José Mandelli
Coordenador Geral

Ensp/Fiotec/Fiocruz

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 402

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 403

Certificado

Certificamos que *Dra. Veronica Machado* participou da

Conferência Regional: Atuais Desafios e Perspectivas dos Sistemas de Saúde na América Latina e no Caribe:

Proteção Social Universal e Resposta Integral al HIV / AIDS, no Hotel Blue Tree Park,

em Brasília, Brasil, de 31 de maio de 2004 a 04 de junho de 2004.

Ministério da Saúde

gtz

OIT

Organização Pan-Americana da Saúde

DST/AIDS

C E R T I F I C A D O

Certificamos que *Verônica Machado*

participou do(a) *Seminário de Marketing Social do Preservativo*

na qualidade de *Facilitador*

no período de *07* a *08* de *Dez*, com carga horária de *16 Horas*

Programa Nacional de DST/Aids

DST/AIDS MINISTÉRIO DA SAÚDE

aqui tem elos

USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE

Pact

Futures GROUP

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 404

Certificado

Certificamos que Verônica Ferreira Machado

participou do Treinamento sobre Aconselhamento em Testagem Rápida

Na qualidade de Moderadora

No período de 28 a 31 de outubro de 2002

Curitiba/PR, 31 de outubro de 2002

Eugene McCray, M.D.

CDC
CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION

Coordenação Nacional de DST e Aids

Ministério da Saúde
Secretaria de Políticas de Saúde
Coordenação Nacional de DST e Aids

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 405

Certificamos que Veronica Machado

participou do VI Congresso Brasileiro de Prevenção das DST e Aids

na cidade Florianópolis - SC

realizado no período de 25 a 28 de junho de 2008

na categoria de MODERADOR(A)

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 406

SEMINÁRIO NACIONAL

Políticas de Saneamento Ambiental:

Inovações na Perspectiva do Controle Social

CERTIFICADO

Certificamos que Verônica Ferreira Machado participou do Seminário Nacional "Políticas de Saneamento Ambiental: Inovações na Perspectiva do Controle Social", realizado de 10 a 13 de novembro de 1997, no Hotel Glória, no Rio de Janeiro - RJ, com carga horária de 29 horas, na qualidade de Observadora

Comissão Organizadora

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 1997

Diretor da FASE

promoção: FASE

apoio:

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 407

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 408

CERTIFICADO

XIII SEMINÁRIO
BRASIL FRANÇA
Rio de Janeiro, 04 e 05 de dezembro de 2003

Certifica que **VERONICA MACHADO**

participou do **XIII Seminário BRASIL FRANÇA**

na qualidade de **COORDENADORA**

no período de **04 e 05 de dezembro de 2003**

Rio de Janeiro, 06 de dezembro de 2003

anrs
Agence nationale de recherches sur le sida

DST/AIDS
MINISTÉRIO DA SAÚDE

Programa Nacional de DST e Aids

rio Nordeste da Rede Brasileira
toramento e Avaliação

Perspectivas de Avaliação em Debate

CERTIFICADO

Certificamos a participação de **VERÔNICA FERREIRA MACHADO,** na qualidade de PALESTRANTE da Mesa Redonda: *Diferentes apropriações da avaliação. Avaliar para quê? Para quem?,* no **I Seminário Nordeste da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação**, no período de 22 a 24 de abril de 2013, em Fortaleza – Ceará.

Fortaleza, 24 de abril de 2013.

Alcides Fernando Gussi
Coordenador Geral
I Seminário Nordeste da Rede Brasileira
de Monitoramento e Avaliação

Realização: Mestrado Mapp avaliação políticas públicas

Apoio: Universidade Federal do Ceará; FAFENE; acep Associação Cearense de Estudos e Pesquisas; nepp UNICAMP; Bahia Terra de Todos Nós Secretaria do Planejamento; SEADE Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados; INMETRO

Patrocínio: Banco do Nordeste; DPP Universidade Federal do Rio Grande do Norte; MGP UFPE; Fundação Cesgranrio Mestrado Profissional em Avaliação; Governo Federal Brasil País rico é país sem pobreza; Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Governo do Estado do Ceará Secretaria do Planejamento e Gestão

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 409

VI CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVENÇÃO DAS DST E AIDS • 2006

Desafios da Prevenção e da Assistência no SUS

CERTIFICADO

Certificamos que **VERÔNICA FERREIRA MACHADO** participou do **VI CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVENÇÃO DAS DST E AIDS**, realizado em Belo Horizonte, no período de 04 a 07 de novembro de 2006, na qualidade de **CONGRESSISTA**, com carga horária de 24 horas.

Belo Horizonte, 07 de novembro de 2006.

Mariângela Batista Galvão Simão
Diretora do Programa Nacional de DST/Aids

Fabiano Pimenta
Secretário de Vigilância em Saúde

VISTA-SE

PREFEITURA BH

Secretaria de Estado da Saúde de MG

DST·AIDS

Secretaria de Vigilância em Saúde

Ministério da Saúde

SUS GOVERNO FEDERAL

Ministério da Saúde
FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz
Escola Nacional de saúde Pública Sergio Arouca
Centro de Referência Professor Hélio Fraga

ENSP

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que **Verônica Ferreira Machado** coordenou a Unidade de Aprendizagem I – Gestão do Programa de Controle da Tuberculose, período de 22/8 a 02/9/2011 - carga horária de 96 horas, no Curso de Especialização em Gestão de Programas para o Controle da Tuberculose (*Lato Sensu)*, ministrado pelo Centro de Referência Professor Hélio Fraga, Departamento da Escola Nacional de Saúde Pública da FIOCRUZ, no Rio de Janeiro, Estrada de Curicica, 2000 – Curicica/Jacarepaguá – 22780-192.

Rio de Janeiro, 2 de setembro de 2011.

Coordenação CEGPCT 2011

Thelma Battaglia Rezende
Coordenadora Substituta
CRPHF/ENSP/FIOCRUZ
MAT. SIAPE - 6226971

Mônica Krumer de N. Andrade
Coordenadora de Serviço
de Ensino e Pesquisa
CRPHF/ENSP/FIOCRUZ
MAT. SIAPE - 0236285

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 411

Ministério da Saúde
FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz
Escola Nacional de saúde Pública Sergio Arouca
Centro de Referência Professor Hélio Fraga

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que **VERÔNICA FERREIRA MACHADO** coordenou a Unidade de Aprendizagem IV – Gestão do Programa de Controle da Tuberculose, período de 25/09 a 05/10/2012 - carga horária de 79 horas, no Curso de Especialização em Pneumologia Sanitária 2012 (*Lato Sensu)*, ministrado pelo Centro de Referência Professor Hélio Fraga, Departamento da Escola Nacional de Saúde Pública da FIOCRUZ, no Rio de Janeiro, Estrada de Curicica, 2000 – Curicica/Jacarepaguá – 22780-192.

Rio de Janeiro, 05 de outubro de 2012.

MIGUEL AIUB HIJJAR
Coordenador do
CRPHF/ENSP/FIOCRUZ

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 413

MEC - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO D...
de 21/10/1977.

Divisão de Diplomas 28/07/2005

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL
Suzanne Maia
Assist. em Adm. - 00/SIAPE 0360458
Pró-Reitoria de Graduação/UFRJ

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Visto
Profª Anna Rodrigues Diniz SIAPE 0367285
Diretora da Divisão de Diplomas/PR1/UFRJ

O Reitor da UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, ~~no uso de suas atribuições e tendo em vista a~~ conclusão do Curso de Ciências Sociais, em 15/09/1995, confere o título de BACHAREL EM CIÊNCIAS SOCIAIS a

Veronica Ferreira Machado

cédula de identidade nº 09415000-0 (órgão expedidor) IIFP/RJ,
nascido(a) a 28 de maio de 1974 natural Rio de Janeiro,
e outorga-lhe o presente Diploma, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Rio de Janeiro, 14 de julho de 2005

Prof. Dr. Frank Trein
Diretor IFCS-UFRJ
Reg. Nº 0369344

DIRETOR

REITOR

Pró-Reitor de Graduação
SIAPE 6351737

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

O Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tendo em vista a conclusão do Curso de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional em 28/08/2003 por Verônica Ferreira Machado, nascido em Rio de Janeiro no dia 28 de maio de 1974, expede o presente diploma de Mestre em Planejamento Urbano e Regional

Rio de Janeiro, 22 de julho de 2010

Verônica Ferreira Machado
Diplomada

Jorge Vellozo
Diretor

Reitor

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 414

I Mostra Nacional Programa Saúde na Escola

IV Mostra Nacional Saúde e Prevenção nas Escolas

Tecendo redes para a promoção da saúde e educação

Certificado

Certificamos que VERÔNICA MACHADO

participou como FACILITADOR

na atividade OFICINA: MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: BASE PARA O PLANEJAMENTO LOCAL,

realizada durante a **I Mostra Nacional Programa Saúde na Escola e IV Mostra Nacional Saúde e Prevenção nas Escolas**, ocorrida de 13 a 15 de junho de 2010, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília.

Fernando Haddad
Ministro da Educação

José Gomes Temporão
Ministro da Saúde

Organização Pan-Americana da Saúde · UNODC · unicef · SUS · Ministério da Educação · Ministério da Saúde · UM PAÍS DE TODOS GOVERNO FEDERAL

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 415

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 416

Ministério da Saúde
Secretaria de Vigilância em Saúde
Centro de Referência Professor Hélio Fraga

CERTIFICADO

Certificamos que **Verônica Machado**
participou na qualidade de **Palestrante – Unidade de Aprendizagem 4**
do (a) **Curso de Especialização em Pneumologia Sanitária 2009**
realizado em (no) **Centro de Referência Professor Hélio Fraga - Rio de Janeiro**
no período de 29/09 a 09/10/2009 com carga horária de 68 horas.

Rio de Janeiro, 01 de março de 2010

Mônica K. de N. Andrade
Chefe do Serviço de Estudos e Pesquisa
CRPHF/FIOCRUZ/MS
SIAPE - 0236285/ CRM 5237196-4

Profa. Margareth Dalcolmo
Diretora - CRPHF/FIOCRUZ/MS
SIAPE - 2163699
CRM - 52-30940-0

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 417

CERTIFICADO

Certificamos que a multiplicadora/facilitadora Veônica Ferreira Machado
participou da Oficina de Capacitação em Avaliação
Com Foco na Melhoria do Programa,
promovido pelo(a) Secretaria Municipal de Maringá/Coordenação DST/AIDS
nos dias 16 de Outubro de 2007
com carga horária de 8 horas.

Carmensuia Nunes
Resp. Coord. Nacional DST/AIDS

DST-AIDS

CDC
CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION

Secretaria de Vigilância em Saúde

Ministério da Saúde

SUS

www.aids.gov.br/ofi

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 418

ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA
SERGIO AROUCA
ENSP

Ministério da Saúde

FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz

CERTIFICADO

Certificamos que *Veronica Machado*

participou na qualidade de *Coordenadora Adjunta e Professora da UA 4*
do (a) *Curso de Especialização em Gestão de Programas para o Controle da Tuberculose*
realizado em (no) *Centro de Referência Professor Hélio Fraga*
no período de 28/09/2009 a 09/10/2009, com carga horária de 96 horas.

Rio de Janeiro, 09 de outubro de 2009.

Dra. Margareth Pretti Dalcolmo
Coordenadora - CRPHF

Mônica K. de N. Andrade
Dra. Mônica Kramer de Noronha Andrade
Coordenadora do Curso

Thelma R. R.
Thelma Battaglia Rezende
Coordenadora do Curso

ICW Brasil

I ENCONTRO MULHERES VIVENDO COM HIV/AIDS LÍDERES
II ENCONTRO DE MULHERES VIVENDO COM HIV/AIDS COM ATÉ 30 ANOS DE IDADE
II ENCONTRO VOZES POSITIVAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIROPARA MULHERES VIVENDO E CONVIVENDO COM HIV/AIDS

Realização: Capítulo Brasileiro da ICWLATINA – Comunidade Internacional de Mulheres Vivendo com HIV/AIDS – ICW Brasil

Apoio: UNFPA, BEMFAM, EXIMCOOP e GERAR

Concedemos este Certificado à Verônica Ferreira Machado

na condição de Palestrante dias 26 a 28 de setembro, de 8 às 17 horas.

Rio de Janeiro, 28 de setembro de 2007

Capítulo Brasileiro da ICWLATINA – Comunidade Internacional de Mulheres Vivendo cm HIV/AIDS - ICW BRASIL
Representante Nacional

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 419

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 420

Seminário Internacional de Monitoramento e Avaliação

Pensar Avaliação em (situ)Ação: Da Teoria à Mudança de Programas

www.semima.com.br

Certificado

VERÔNICA MACHADO

Ministrou palestra no Worskhop "Modelos de Avaliação: Usos e prática Institucional" do **Seminário Internacional de Monitoramento e Avaliação - Pensar Avaliação em (situ)Ação: Da Teoria à Mudança de Programas**, promovido pela Escola Nacional de Saúde Pública ENSP/FIOCRUZ e pelo Programa Nacional DST e Aids e financiado pelos Centers for Disease Control and Prevention - Global AIDS Program (CDC/GAP - Brasil), no dia 01 de abril de 2009, no Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro, 03 de abril de 2009

Antônio Ivo de Carvalho
Diretor
ENSP/FIOCRUZ

Mariângela Simão
Diretora
Programa Nacional de DST/Aids

DST·AIDS

Ministério da Saúde

SUS

GOVERNO FEDERAL

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 421

Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS
20 ANOS

Oficina de Elaboração de Projetos para trabalhos com HIV/AIDS

CERTIFICADO

VERONICA MACHADO

participou como facilitadora das atividades do III módulo da Oficina de Elaboração de Projetos para trabalhos com HIV/AIDS, com carga horária de oito horas, no âmbito do projeto Homossexualidade, Juventude e Vulnerabilidade: prevenção do HIV/AIDS.

Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2007

Richard Parker/ Diretor Presidente

Apoio:



Seminário de Avaliação

Laços da Prevenção

às DSTs, ao HIV e à aids

Certificado

O GRUPO LIBERDADE em parceria com o NEP e APROSVI certifica que

---

Participou do projeto (Região Sul na prevenção)Laços da prevenção, visando avaliar e fortalecer ações de prevenção, realizado no Hotel Nikko nos dias 14,15 e16 de Novembro de 2005

Curitiba, 16 de novembro de 2005.

Carmen Luiza Paz
Coordenadora do Projeto

Evanilda de Souza
Sub Coordenadora do Projeto

Carmen Costa
Sub Coordenadora do Projeto

NEP

APROSVI

Grupo Liberdade

CURITIBA
A CIDADE DA GENTE

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 422

CERTIFICADO

Certificamos que

Verônica Ferreira Machado

Participou do Seminário sobre Economia da Saúde realizado pela Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Programa Nacional de DST e Aids, pela Agência Nacional Francesa de Pesquisa sobre Aids e Hepatites Virais e Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na qualidade de participante, no período de 14 a 16 de dezembro de 2006, com carga horária de 20 horas.

Brasília-DF, 16 de dezembro de 2006.

Cristina de Albuquerque Possas
Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico

DST·AIDS

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 423

BARCELONAECP | GROUP Mcrit hidria Quanta

CURRICULUM VITAE (CV)

Título e nº do cargo	K-06, Mediação e Tratativas com a Comunidade
Nome do Especialista:	Pedro Daniel Strozenberg
Data de nascimento:	21/08/1972
País de origem/residência	Brasil/ Brasil

Educação:

Instituição	Título (s) ou Diploma (s) obtido:
Universidad de Burgos, Espanha, 2004 – 2007.	Área de estudo: Mediação Comunitária e Direitos Humanos
Universidade do Rio de Janeiro (UNIRIO), Brasil, 1999	Bacharelato em Direito

Registro histórico de empregos relevante para o serviço:

Período	Organização empregadora e seu cargo/posição. Informações de contato para referência	País	Resumo das atividades desempenhadas relevantes para o Serviço
2016-presente	Defensoria Publica do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Ouvidor Externo	Brasil	As atribuições do Ouvidor da Defensoria Publica foca em dois grandes públicos. Primeiro os usuários da Defensoria Pública, como um canal de escuta direta visando o aprimoramento dos serviços e atenção individual ao publico atendido, e um segundo objetivo de incidir na atuação da Defensoria Pública como um ator responsável nas agendas de Direitos Humanos e democratização do sistema de Justiça.
2016-2011	Instituto de Estudos da Religião – ISER, Rio de Janeiro, Brasil Secretario Executivo	Brasil	As atribuições da secretaria executiva acumulam a tarefa gerencias, mais identificadas com áreas de monitoramento e organização, com atividades finalistas, como a coordenação de pesquisas, articulação institucional e a negociação de convênios e recursos. Neste período o Iser realizou pesquisas em todas as regiões brasileiras, com temas relacionados a religião, violência, meio ambiente e movimento social.
2011-2010	Secretaria de Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro Subsecretario do Estado	Brasil	Nesta função destaca-se a representação oficial do estado do Rio de Janeiro em matérias de Direitos Humanos, em particular a participação em conselhos de direitos, audiências públicas, seminários e reuniões inter e intragovernamentais. Administra e coordena as políticas vinculadas aos temas de promoção dos direitos da mulher, Igualdade racial, Pessoa com Deficiência, Pessoa Idosa, Juventude e a agenda LGBT. Gerencia diretamente aproximadamente 60 pessoas e um orçamento público de 23 milhões de reais (2010).

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 424

2010-2008	Instituto de Estudos da Religião – ISER, Rio de Janeiro, Brasil Secretario Executivo	Brasil	As atribuições da secretaria executiva acumulam a tarefa gerencias, mais identificadas com áreas de monitoramento e organização, com atividades finalistas, como a coordenação de pesquisas, articulação institucional e a negociação de convênios e recursos. Neste periodo o Iser realizou pesquisas em todas as regiões brasileiras, com temas relacionados a religião, violência, meio ambiente e movimento social.
2008-presente	Instituto de Estudos da Religião – ISER, Rio de Janeiro, Brasil Pesquisador associado	Brasil	As atribuições de Pesquisador Associados são dirigidas ao desenvolvimento de estudos e pesquisas em temas especificos, estimulando publicações e artigos de cunho pessoal e institucional. No caso as áreas de reflexão incluem Segurança Pública, Direitos Humanos, Mediação de Conflitos, Juventudes e Religião.
2008-2007	Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro Assessor parlamentar - Comissão de Direitos Humanos 21 2558- 1268 cddh@alerj.gov.br	Brasil	Responsável pela articulação politica, revisão e analise de propostas de lei nas áreas temáticas dos Direitos Humanos, Segurança Pública e Educação. As principais atividades diziam respeito à produção legislativa, fiscalização dos serviços estaduais e realização de audiências públicas sobre temas de interesse coletivo.
2006-2005	Viva Rio, Rio de Janeiro, Brazil Programa de Mediação de Conflitos Coordenador	Brasil	O programa de mediação de conflitos do Viva Rio foi criado em janeiro de 2005 com o propósito de incentivar e difundir a Mediação Comunitária, interpessoal e coletiva, como um mecanismo inovador e efetivo de redução da violência no Estado do Rio de Janeiro. Envolvendo 06 projetos de áreas diferentes em uma equipe interdisciplinar de aproximadamente 70 pessoas, divididos em ações de educação, atendimento direto, emergência e prevenção de conflitos.
2003-2002	Petrobras, Rio de Janeiro Ouvidoria Assessor especial da Ouvidoria	Brasil	Responsável por dar suporte a implementação da ouvidoria da maior empresa do Brasil e pelo desenvolvimento de um sistema de monitoramento da Ouvidoria. Entre as atividades constavam: atendimento a funcionários e empresas contratadas, elaboração de relatórios mensais, elaboração de sistema de controle de informação, montagem e capacitação de equipe, alimentação do site da Ouvidoria, entre outras funções.
2002-2000	Viva Rio, Rio de Janeiro. Segurança Pública e Direitos Humanos Coordenador	Brasil	A área de Segurança Publica e Direitos Humanos tinha o propósito de reunir os diferentes projetos do Viva Rio nestes temas. Reunindo projetos de Assessoria Juridica, Controle de Armas, Jovens em conflitos armados organizados, Reforma das Policias e Primeiro Emprego entre outros. Nessa função fui responsável pela coordenação de aproximadamente 200 pessoas de formação diverse com atuação local e internacional, e um orçamento anual de 1.5 milhões de dólares.
2000-1999	Programa de Proteção a testemunhas do Estado do Rio de Janeiro Diretor Executivo	Brasil	O programa nacional de Proteção a Testemunhas no Brasil foi implementado pela Sociedade Civil em parceira com o poder publico estatal. Fui responsável por selecionar a equipe, monitorar o trabalho realizado pela equipe técnica, representar oficialmente o programa, estabelecer parceiras e redes de colaboradores.

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 425

2000-1998	Secretaria Nacional de Direitos Humanos Consultor na implementação de Programa de Assessoria Jurídica Popular	Brasil	Acompanhou a implementação da Política e desenvolveu programas de monitoramento e treinamento das organizações responsáveis pela implementação do programa nos 17 estados da federação.
2000-1996	Viva Rio, Rio de Janeiro Projeto Balcão de Direitos Coordenador	Brasil	Responsável pela criação e implementação do projeto Balcão de Direitos, a secretária de Direitos Humanos do Programa de trabalhar em comunidades vulneráveis, implementado em seis favelas do Rio de Janeiro. Durante o tempo que coordenou o projeto, fui responsável pela gestão de um orçamento de 4 milhões de dólares e uma equipe de aproximadamente 80 pessoas. O programa foi focada na promoção do acesso à justiça e resolução alternativa de conflitos para as comunidades vulneráveis e de projeto criado uma cultura que reconhece práticas locais de diálogo e negociação como parte de forma legal e legítima práticas, reconhecidas pelo Estado. Ao mesmo tempo, o projeto promoveu o acesso aos mecanismos formais de proteção dos direitos humanos de populações vulneráveis, tradicionalmente excluídos de tais regimes jurídicos. O programa tornou-se recentemente de uma Política Nacional, implementado em 17 estados da Federação. Durante a minha experiência no Balcão de Direitos fui apresentado a Fundação Ford, que recentemente tornou-se um parceiro fundamental no Programa.
1996-1995	Instituto Brasileiro de Análises Sócio Econômicas (IBASE) Coordenador de Projeto Geração 21 3528-3535 E-mail: ibase@ibase.br	Brasil	Responsável pelo desenvolvimento de atividades de interação entre jovens estudantes de escolas particulares do Rio de Janeiro e grupos comunitários de favelas cariocas, contribuindo para a formulação de políticas de juventudes e educação. Iniciativa conjunta visava aproximar jovens de classe media e jovem residentes em favelas e periferias da cidade. Neste projeto foram realizadas inúmeras iniciativas planejadas e executadas pelos próprios jovens. Entre as atividades constavam facilitar os encontros, zelar pelos jovens envolvidos, sensibilizar os participantes e as instituições envolvidas.
1989,1990,1992, 1993 e 1994	17ª Seção Eleitoral, Rio de Janeiro, Brazil Assistente do Juiz eleitoral	Brasil	Atuação como voluntário e assistente da juíza eleitoral durante os pleitos eleitorais. Atividade desenvolvida de supervisão na apuração e votação ainda em regime de contagem de cédulas.

Filiação de associações profissionais e publicações:

Membro da comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro

junho 2007 - Presente

Membro da Comissão Estadual de combate à Tortura e Violações dos Direitos Humanos

dezembro de 2010 - presente

Membro do Comitê Estadual de Políticas de Apoio ao Refugiado

junho de 2010 - presente

Vice presidente da organização civil Enda Brasil.

Março de 2005 - presente

Membro do conselho da associação civil Promundo

setembro 2009 - presente

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 426

Vice presidente da associação civil Luta Pela Paz

Membro do Conselho de 2007 - presente

Membro do Centro de Mediação Comunitária do Chapéu Mangueira e Babilônia

junho de 2006 - Presente

Comissão Especial de Investigação das Execuções Sumárias na Baixada Fluminense, Conselho Nacional de Defesa dos Direitos Humanos 2006

Membro do Conselho Nacional da Juventude

agosto de 2005 - Julho de 2007

Diretor da Cooperativa de Trabalho Estruturar

julho de 2001 - Janeiro de 2007.

Facilitador do grupo de trabalho do Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro

março - agosto de 1994

Atividades acadêmicas

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro, Brasil

Programa de Segurança Pública da graduação

Professor, Mediação de Conflitos

Universidade Candido Mendes (UCAM), Rio de Janeiro, Brasil

Programa de Segurança Pública da graduação

Professor, Mediação de Conflitos

Publicações

Guia de Mediação Comunitária (2016), ONU HABITAT, Brazil/Chile,

Mourão e Strozenberg, (2016), Mediação de Conflitos nas UPPs: Notícias de uma experiência, Rio de Janeiro, Brasil

Strozenberg, Pedro (2009) alguém tem Medo de Ser Multado na Favela? Em Jailson Souza e Silva; Barbosa, Luiz Jorge;, Mariane Biteti de Oliveira; Fernandes, Fernando Lannes (Orgs.) O Que Afinal Favela É? Observatório de Favelas.

Strozenberg, Pedro (2008) "Falta Estado e sobram Armas" - Le Monde Diplomatique Brasil, novembro, 2008.

Strozenberg, Pedro (2006) "Um Mar de Sete Cores", em Novas Direções nd Governança da Justiça e da Segurança. Ministério da Justiça - Secretaria de Reforma do Judiciário. Brasília - DF.

IMPUNIDADE NA Baixada Fluminense, Relatório 2005 (2006). Direitos Humanos e Minorias, Câmara dos Deputados, Brasília.

Viva Rio (2005) Manual de Formação de Mediadores e Agentes da Paz - Resolução de Conflitos, Rio de Janeiro.

Strozenberg, Pedro e Ribeiro, Paulo Jorge (2001). Imagens e Linguagens: Balcão de Direitos, Resolução de Conflitos in favelas do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Mauad.

Prêmios

Prêmio Nacional de Direitos Humanos (2006), do Governo Federal
Categoria "redução da violência"
Ordem dos Advogados do Brasil. Secção Rio de Janeiro (2002)
Categoria "Altas conquistas em Direitos Humanos"

Outras experiências relevantes e complementares:

Conselheiro Nacional de Juventudes

Assessor da Ouvidoria Geral da Petrobras

Idiomas:

Idiomas	Falar	Ler	Escrever
Português	Nativo	Nativo	Nativo

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 427

Inglês	Regular	Bom	Bom
Espanhol	Fluente	Fluente	Fluente

Adequação para o serviço:

Tarefas detalhadas atribuídas à Equipe de especialistas do Consultor:
0 - ATIVIDADES PREPARATÓRIAS E GERENCIAIS DO CONTRATO 00.3 - Reunião de partida (kick-off meeting) **1 - PLANO DE TRABALHO** 101 - Identificação e levantamento das informações existentes 103 - Elaboração do plano de comunicação 104 - Elaboração do plano de trabalho 105 - Realização da Reunião Técnica 1 106 - Disponibilização do Plano de Trabalho Inicial (P.T.I) e material elaborado para consulta pública 107 - Realização das (3) Oficinas públicas de Engajamento (R.A.0.1) 108 - Audiência Pública de Engajamento 109 - Validação do Plano de Trabalho Final (P.T.F) **2 - CONTEXTUALIZAÇÃO** 201 - Levantamentos e análise de dados secundários 202 - Levantamentos e análise de dados primários 203 - Elaboração de mapas georreferenciados para interpretação dos dados. 204 - Elaboração de diagnostico e da matriz FOFA 205 - Elaboração de benchmark para identificação de boas práticas internacionais 206 - Elaboração do Relatório de Contextualização Inicial (RCI) 207 - Realização da Reunião Técnica 2 208 - Disponibilização do Relatório de Contextualização Inicial (RCI) e material elaborado para consulta pública 209 - Realização das (3) Oficinas públicas de Contextualização (R.A.0.2) 210 - Audiência Pública de Contextualização 211 - Validação do Relatório de Contextualização Final (R.C.F) **3 - CRIAÇÃO DOS CENÁRIOS E VISÃO DE FUTURO** 301 - Construção dos cenários de desenvolvimento sustentável e avaliação de impactos 302 - Formulação de visão geral de futuro para até 2035 303 - Estabelecimento de objetivos e metas previstas 304 - Definição dos eixos estratégicos e princípios orientadores do Plano 305 - Processo de consulta com os atores locais 306 - Elaboração do Relatório de Construção de Cenários e Visão de Futuro Inicial (R.C.C.I) 307 - Realização da Reunião Técnica 03 308 - Disponibilização do Rel. de Construção de Cenários e Visão de Futuro Inicial e material elaborado para consulta pública (R.C.C.I) 309 - Realização das (3) Oficinas públicas de Construção de Cenários e Visão de Futuro Inicial (R.A.0.3) 310 - Audiência Pública de Construção de Cenários e Visão de Futuro 311 - Validação do Relatório de Construção de Cenários e Visão de Futuro Final (R.C.C.F.) **4 - PLANO DE AÇÃO** 401 - Zoneamento territorial 402 - Definição de programas e propostas de ação 406 - Elaboração do Relatório de Plano de Ação Inicial (R.P.A.I.) 407 - Realização da Reunião Técnica 4 408 - Disponibilização do Relatório de Plano de Ação Inicial (R.P.A.I.) e material elaborado para consulta pública 409 - Realização das (2) Oficinas públicas de Plano de Ação Inicial (R.P.A.I.) 410 - Audiência Pública de Plano de Ação Inicial (R.P.A.I.) 411 - Validação do Relatório de Plano de Ação Final (R.P.A.F.) **5 - CONFERÊNCIA REGIONAL** 501 - Elaboração do documento final do Plano

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 428

502 - Apresentação e revisão do documento final 503 - Realização da Conferencia Regional
Informação sobre trabalho/serviço anterior que melhor ilustre a competência para lidar com as tarefas designadas
• **ORGANIZAÇÃO SOCIAL ISER, ELABORAÇÃO E SUPERVISÃO PROJETOS E PROGRAMAS** Ano: 2012 • **COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO** Ano: 2011 • **PROJETO GERAÇÃO** Ano: 1995 Iniciativa conjunta visava aproximar jovens de classe media e jovem residentes em favelas e periferias da cidade. Neste projeto foram realizadas inúmeras iniciativas planejadas e executadas pelos próprios jovens. Entre as atividades constavam facilitar os encontros, zelar pelos jovens envolvidos, sensibilizar os participantes e as instituições envolvidas. Atividades desempenhadas: Iniciativa conjunta visava aproximar jovens de classe média e jovem residentes em favelas e periferias da cidade. Neste projeto foram realizadas inúmeras iniciativas planejadas e executadas pelos próprios jovens. Entre as atividades constavam facilitar os encontros, zelar pelos jovens envolvidos, sensibilizar os participantes e as instituições envolvidas.

Informações de contato do Especialista: (e-mail: pedro@iser.org.br, telefone: (21) 2555-3782).

Certificado:

Eu, abaixo assinado, certifico que, sob o meu conhecimento e convicção, este CV descreve-me corretamente, minhas qualificações e minha experiência e que estou disponivel para executar o serviço no caso de outorga. Estou ciente de que qualquer informação ou declaração falsa apresentada aqui pode resultar na minha desqualificação ou dispensa pelo Cliente e/ou na aplicação de sanções pelo Banco Mundial.

PEDRO DANIEL STROZENBERG
Nome do Especialista

Assinatura

15/08/2016

Cartório 6º Ofício de Notas
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
PEDRO DANIEL STROZENBERG
Rio de Janeiro, 09/06/2017
Selo(s): 1 Fiscal(is): 1 Total: 2,10
Selo de Autenticidade: EDUARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA E SOUZA
Selo Digital Guzmão Correa Losada Substituto Série 112 R.

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 429

APÊNDICE C

DISCRIMINAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO

PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº – 4º andar – Ala C - 80.530-140 – Curitiba – Paraná
Fone: (41) 3313 6275 / 3313 6270 – Fax: 41 3313 6333

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 430

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

PROJETO MULTISSETORIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO PARANÁ

Empréstimo Nº 8201-BR

Solicitação de Proposta Nº: 02/2015
Elaboração Do Plano Para O Desenvolvimento Sustentável Do Litoral Do Estado Do Paraná

PROPOSTA FINANCEIRA
(Cópia)

Apresentado por:

BARCELONABRASILGROUP

Mcrit hidria ciencia, ambiente y desarrollo Quanta CONSULTORIA

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 431

BARCELONABRASILGROUP Mcrit hidria Quanta

FIN-1

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA FINANCEIRA

Fortaleza, 31 de agosto de 2016

AO GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral – SEPL
Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº – Palácio das Araucárias
Centro Cívico – Curitiba/PR - Brasil

Prezados Senhores:

Nós, abaixo-assinados, oferecemos prestar serviços de consultoria para elaboração do **PLANO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO LITORAL DO PARANÁ – PDS_LITORAL** em conformidade com sua Solicitação de Propostas datada de **01/07/2016** e nossa Proposta Técnica.

Nossa proposta financeira anexa é para o montante de R$3.097.111,88 (três milhões, noventa e sete mil, cento e onze reais e oitenta e oito centavos) e 461.280,00 EUR (quatrocentos e sessenta e um mil, duzentos e oitenta euros), excluído de todos os impostos locais indiretos de acordo com a Cláusula 25.2 da Folha de Dados. O montante estimado de impostos locais é R$163.005,88 (cento e sessenta e três mil, cinco reais e oitenta e oito centavos) e 24.277,89 EUR (vinte e quatro mil, duzentos e setenta e sete euros e oitenta e nove cents) que devem ser confirmados ou ajustados, se necessário, durante as negociações.

Nossa Proposta Financeira nos vincula conforme as modificações resultantes das negociações do Contrato, até a expiração do período de validade, ou seja, antes da data indicada na Cláusula 12.1 da Folha de Dados.

Nenhuma comissão ou gratificação foi ou deve ser paga por nós para representantes ou terceiros relacionados a esta Proposta e à execução do Contrato.

Entendemos que o Governo do Estado do Paraná (cliente) não é obrigado a aceitar qualquer Proposta que receber.

Continuamos à sua disposição,

Atenciosamente,

Judith Muntal Vázquez
Sócia-Diretora
BARCELONA BRASIL GROUP

Endereço: Plaça Reial, 18
08002 – Barcelona - Espanha
Endereço no Brasil: Rua Alice de Souza Lima, 303
CEP: 04823-470 – Parque Alto – São Paulo/SP
Contato: Judith.muntal@barcelonabrasilgroup.com

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 432

BARCELONABRASILGROUP Mcrit hidria Quanta

FIN-2
RESUMO DE CUSTOS

Item	Custo em Dólar	Custo em R$
Custo da Proposta Financeira		
Incluindo:		
(1) Remuneração	408.000,00	2.369.953,22
(2) Reembolsáveis	53.280,00	727.158,66
Custo Total da Proposta Financeira	461.280,00	3.097.111,88
Estimativa dos Impostos Locais Indiretos - a serem discutidas e validadas nas negociações, caso o Contrato seja assinado		
(i) ISS - Impostos sobre Serviços (5%) - {100/[1-(ISS/100)]}/100		163.005,89
(ii) Impostos estrangeiros	24.277,89	
Total estimado de Impostos Locais Indiretos	24.277,89	163.005,89
Total	[illegible]	[illegible]

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 433

FIN-3
REMUNERAÇÃO

Nº	Nome	Cargo (conforme TR's B)	Função na execução dos serviços (conforme TR's B)		Remuneração (R$/Mês)	Remuneração (R$/Mês) em Passeio/Mês (conforme TR's B)	Total (EUR €)	Total (R$)
Equipe Chave								
K-1	TACO ROORDA	Coordenação e Macrozoneamento Regional	✓	Sede	R$ 23.511,44	12,00		282.137,29
				Campo				
K-2	NEREO CARDOSO	Direito Urbanístico e Ambiental	✓	Sede	R$ 21.160,30	9,00		190.442,67
				Campo				
K-3	ANDREU ESQUIUS	Infraestrutura - Sistema Viário e Transportes	✓	Sede	€ 8.000,00	7,00	56.000,00	
				Campo				
K-4	FERNANDO LOPEZ	Recursos Hídricos e Meio ambiente	✓	Sede	€ 8.000,00	7,00	56.000,00	
				Campo				
K-5	VERONICA FERREIRA	Estruturação Social	✓	Sede	R$ 21.160,30	9,00		190.442,67
				Campo				
K-6	PEDRO STROZEMBERG	Mediação e Tratativas com a Comunidade	✓	Sede	R$ 21.160,30	9,00		190.442,67
				Campo				
Equipe de Suporte								
N-1	GUSTAVO BRASILEIRO	Geólogo, Geógrafo, Engenheiro Civil, ou áreas afins	✓	Sede	R$ 18.809,15	6,00		112.854,92
				Campo				
N-2	PATRICIA CASAL RODRÍGUEZ	Biólogo, ou áreas afins	✓	Sede	€ 6.000,00	6,00	36.000,00	
				Campo				

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 434

Nº	Nome	Área (conforme TR Item 10)								
N-3	GUILHERME DE OLIVEIRA	Economia e Finanças	✓	Sede	R$	18.809,15	6,00		112.854,92
				Campo					
N-4	ANDREU UJIED / RAFA RODRIGO	Especialista Socioeconômico	✓	Sede	€	9.000,00	4,00	36.000,00	
				Campo					
N-5	EDUARDO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ	Especialista em Turismo	✓	Sede	€	7.000,00	6,00	42.000,00	
				Campo					
N-6	NATIVIDAD FRANCO CHERTA	Especialista em Geoprocessamento	✓	Sede	€	5.000,00	6,00	30.000,00	
				Campo					
N-7	LORENA LÓPEZ HERMIDA	Especialista em Patrimônio Artístico e Cultural	✓	Sede	€	6.000,00	4,00	24.000,00	
				Campo					
N-8	GRAZIA BURMAN	Especialista em Estatística e Projeções Demográficas	✓	Sede	€	6.000,00	6,00	36.000,00	
				Campo					
Equipe de Apoio									
	JOSÉ MARCOS SOUTO	Especialista em Logística	○	Sede	€	7.000,00	4,00	28.000,00	
				Campo					
	ANDREU UJIED / ORIOL BIOSCA	Especialista em Planejamento do Território e Mobilidade	○	Sede	€	7.000,00	4,00	28.000,00	
				Campo					
	RAMÓN CATALÁ	Especialista em Sistemas de Informação	○	Sede	€	9.000,00	4,00	36.000,00	
				Campo					
	ANABELA PAIVA	Especialista em Comunicação Social e Mídias Sociais	○	Sede	R$	16.458,01	12,00		197.496,10
				Campo					
	CHARLES SCHAMM	Especialista em Modelagem e PPPs	○	Sede	R$	22.335,87	4,00		89.343,47
				Campo					

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 435

	NOME	CARGO		Custo Mensal (Salário + Encargos + Benefícios)	Quantidade (Meses/Pessoa)	Total (R$)
	ALEXANDRE WEBER	Especialista em Gestão Pública	Sede	R$ 16.458,01	6,00	98.748,05
			Campo			
	VO FREIRE	Especialista em Habitação e Equipamentos Sociais	Sede	R$ 16.458,01	6,00	98.748,05
			Campo			
	CARLOS AQUINO	Especialista em Monitoramento e Avaliação	Sede	R$ 16.458,01	4,00	65.832,03
			Campo			
	SÁVIO PAIXÃO	Jornalista	Sede	R$ 8.229,00	8,00	65.832,03
			Campo			
	JENIFFER COSTA	Técnico em Editoração de Relatórios e Programação Visual	Sede	R$ 8.229,00	12,00	98.748,05
			Campo			
	EDGAR SANTANA	Profissional Nível Técnico em Desenho (Cadista)	Sede	R$ 7.053,43	9,00	63.480,89
			Campo			
		Produtor de Eventos	Sede	R$ 9.404,58	8,00	75.236,61
			Campo			
		Prof. de Nível Técnico para Apoio às atividades Locais	Sede	R$ 7.053,43	12,00	84.641,19
			Campo			
		Administrador	Sede	R$ 9.404,58	12,00	112.854,92
			Campo			
		Secretária	Sede	R$ 4.702,29	12,00	56.427,46
			Campo			
		Motorista	Sede	R$ 3.526,72	12,00	42.320,59
			Campo			
Consultores Especializados						
		Consultores Especializados Eventuais	Sede	R$ 23.511,44	6,00	141.068,64
			Campo			
Total						408.000,00 2.369.953,22

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 436

BARCELONABRASILGROUP Mcrit hidria Quanta

FIN-4

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS REEMBOLSÁVEIS

Nº	Tipos de Despesas Reembolsáveis	Unidade	Custo Unitário	Quantidade	Custo Total EUR (€)	Custo Total BR (R$)
1	Aluguel de veículo sedan com combustível	mês	R$ 2.851,60	12		34.219,23
2	Passagens Aéreas Internacionais	unidade	€ 1.500,00	24	36.000,00	
3	Passagens Aéreas Nacionais	unidade	R$ 912,51	36		32.850,46
4	Transporte de/para Aeroporto	unidade	R$ 171,10	36		6.159,46
5	Hospedagem e diarias					
5.1	Brasileiros	unidade	R$ 513,29	108		55.435,15
5.2	Estrangeiros	unidade	€ 120,00	144	17.280,00	
6	Impressão e Encadernação do Resumo Executivo Final	unidade	R$ 5,70	15.000		85.548,08
7	Editoração e Programação Visual do Resumo Executivo	unidade	R$ 17.109,62	1		17.109,62
[redacted]	Aluguel de Escritório	mês	R$ 5.703,21	12		68.438,46
[redacted]	Aluguel de Computadores e Impressoras	mês	R$ 5.703,21	12		68.438,46
[redacted]	Mobiliário de Escritório	verba	R$ 28.516,03	1		28.516,03
[redacted]	Material de Escritório	mês	R$ 570,32	12		6.843,85
[redacted]	Telefonia e Internet	mês	R$ 570,32	12		6.843,85

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 437

	Unidade		Custo Unitário	Quantidade	Custo Total EUR (€)	Custo Total R$ (R$)
Implantação do Plano de Comunicação						
Videomaker (Fotografia e Filmagem)	unidade	R$	1.140,64	14		15.968,97
Edição de pequenos vídeos para internet	Unidade	R$	171,10	14		2.395,35
Assessoria de Imprensa para os Eventos	Unidade	R$	1.710,96	14		23.953,46
Hospedagem, Desenvolvimento e Manutenção do Site do Plano	Unidade	R$	39.922,44	1		39.922,44
Impulsionamento de Redes Sociais	Unidade	R$	114,06	24		2.737,54
Folders	Unidade	R$	5.703,21	4		19.961,22
Implantação do Plano de Participação Social						
Material em Geral (ex.: cracha, pasta, lista de presença)	Unidade	R$	114,06	14		1.596,90
Recepcionista para os Eventos	Unidade	R$	228,13	14		3.193,79
Lanche	Unidade	R$	39,92	700		27.945,71
Estruturação e manutenção do Banco de Dados de Convidados	verba	R$	3.421,92	1		3.421,92
Mobilização para os Eventos	Unidade	R$	1.368,77	14		19.162,77
Facilitação dos Eventos	Unidade	R$	1.140,64	14		15.968,97
Sistematização dos Eventos	Unidade	R$	1.140,64	14		15.968,97
Mobiliário (ex.: mesas, cadeiras)	verba	R$	2.851,60	14		39.922,44
Equipamentos (ex.: Projetor, Telão)	verba	R$	2.281,28	14		31.937,95
14.10 Apoio Logistico para participação nos eventos	verba	R$	912,51	14		12.775,18
14.11 Back Drop	Unidade	R$	5.703,21	2		11.406,41
14.12 Mapa de Participação	Unidade	R$	28.516,03	1		28.516,03
Total					53.280,00	727.158,66

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 438

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

PROJETO MULTISSETORIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO PARANÁ

Empréstimo Nº 8201-BR

Solicitação de Proposta Nº: 02/2015
Elaboração Do Plano Para O Desenvolvimento Sustentável Do Litoral Do Estado Do Paraná

PROPOSTA TÉCNICA
(Original)

TEC-3

BARCELONABRASILGROUP

Mcrit

hidria
ciencia, ambiente y desarrollo

Quanta
CONSULTORIA

BARCELONABRASILGROUP hidria ciencia, ambiente y desarrollo Quanta CONSULTORIA Mcrit

TEC-3

COMENTÁRIOS E SUGESTÕES SOBRE OS TERMOS DE REFERÊNCIA

A – COMENTÁRIOS OU SUGESTÕES SOBRE O TERMO DE REFERENCIA

A Equipe consultora considera que os Termos de Referência do Projeto são claros e concisos em relação ao alcance e resultados esperados. Não obstante, a experiência da equipe do Consórcio em projetos similares permite aportar alguns elementos que se consideram relevantes para o sucesso deste projeto e que foram integrados à presente proposta de serviços:

I. **Incorporação de uma etapa voltada as atividades preliminares de inicio do projeto.** O Consorcio sugere a incorporação de uma etapa inicial contendo as atividades de mobilização de equipe, reunião de partida e a programação das atividades de acompanhamento gerencial do contrato como uma etapa essencial para alinhamento das equipes e sucesso do projeto. A identificação e clarificação dos processos de trabalho internos e com a contratante, além da confirmação dos elementos críticos a serem considerados e dos resultados esperados pelo projeto são essenciais ao desenvolvimento adequado dos serviços.

II. **Criação da logomarca do projeto como uma ferramenta de comunicação no processo de elaboração do PDS_LITORAL.** O Consórcio destaca a importância da comunicação para o sucesso no planejamento participativo previsto na elaboração do PDS_LITORAL. A comunicação e o marketing do próprio Projeto, a través da criação de uma logomarca, é uma ferramenta que facilita sua implementação e que gera uma imagem positiva para a iniciativa da elaboração do PDS_LITORAL e sua implementação, como elemento de referência sobre o trabalho e a cooperação entre o setor público, o setor privado e as comunidades locais. A marca do Projeto é uma necessidade comunicacional derivada da complexidade técnica que envolve a elaboração de um plano estratégico para uma área de abrangência que integra 7 (sete) municípios. Deriva da dificuldade em comunicar, de forma massiva, denominações técnicas, conteúdos e resultados esperados pela realização do Projeto. Torna-se fundamental para a identificação das mensagens da comunicação, para facilitar a lembrança pelos públicos envolvidos e também para o marketing do próprio PDS_LITORAL.

III. **Incorporação do zoneamento como atividade própria na fase da elaboração do Plano de Ação do PDS_LITORAL.**

IV. **Importância das atividades voltadas à modelagem econômica e legal das intervenções previstas.** O cenário atual de ajustes orçamentários no Brasil impõe a importância das atividades que garantem a sustentabilidade financeira dos projetos de investimento, sobretudo no setor de infraestruturas com intervenções no longo prazo. Para tanto, o Consórcio propor a incorporação de um Especialista em PPP com o intuito de garantir que os desenhos e intervenções previstas no marco do projeto sejam financeiramente viáveis e economicamente sustentáveis, estabelecendo esse como um dos pontos críticos do projeto.

V. **Importância das atividades voltadas à transferência de tecnologia e capacitação.**

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 440

B – COMENTÁRIOS OU SUGESTOES SOBRE REQUISITOS DE PESSOAL, INSTALAÇÕES E ADMINISTRATIVO.

I. **Gestão e acompanhamento do projeto.** Estabelecimento das equipes de gestão do contrato indicadas no edita, definindo a estrutura da Equipe Técnica Intersecretarial – ETI e Equipe de Acompanhamento - EA.

II. **Cumprimento dos prazos de revisão de relatórios estabelecidos no edital.** Os pareceres e o aceite da Equipe de Acompanhamento - EA, deverão ser emitidos para a Equipe Técnica Intersecretarial – ETI, com cópia para a empresa consultora, por meio eletrônico, em até 15 (quinze) dias úteis após as reuniões públicas (Oficinas, Audiências e Conferência Final). Os representantes de cada município deverão emitir um único parecer e um único aceite, que represente o consenso entre eles.

Anexo 23_7_Anexo_VI_Contrato_Litoral_Parana (47828482) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 441

Anexo 23_8_Anexo_VII_DIRF_2020_codigo_0422_2 (47828486) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 442

Rendimentos pagos a residentes ou domiciliados no exterior

CNPJ	Nome empresarial	País
26.451.164/000	HIDRIA CIENCIA, AMBIENTE Y DESARROLLO S.L	Espanha

NIF	Relação fonte pagadora/beneficiário
B36974988	A fonte pagadora ou a beneficiária no exterior mantenha contrato de exclusividade como agente, como distribuidor ou como concessionário nas operações com bens, serviços e

Data	Código receita	Tipo rendimento	Forma tributação		Valor pago em R$		IRRF
17/01/2019	0422-Royalties e pagamentos de assistência	140-Royalties, serviços técnicos e de	10-Retenção do IRRF - alíquota padrão	R$	59.028,58	R$	8.854,27
21/02/2019	0422-Royalties e pagamentos de assistência	140-Royalties, serviços técnicos e de	10-Retenção do IRRF - alíquota padrão	R$	58.547,72	R$	8.782,14
09/04/2019	0422-Royalties e pagamentos de assistência	140-Royalties, serviços técnicos e de	10-Retenção do IRRF - alíquota padrão	R$	126.858,82	R$	19.028,83
29/05/2019	0422-Royalties e pagamentos de assistência	140-Royalties, serviços técnicos e de	10-Retenção do IRRF - alíquota padrão	R$	66.182,43	R$	9.927,37
11/07/2019	0422-Royalties e pagamentos de assistência	140-Royalties, serviços técnicos e de	10-Retenção do IRRF - alíquota padrão	R$	64.446,16	R$	9.681,29
23/07/2019	0422-Royalties e pagamentos de assistência	140-Royalties, serviços técnicos e de	10-Retenção do IRRF - alíquota padrão	R$	61.636,05	R$	9.245,41
11/09/2019	0422-Royalties e pagamentos de assistência	140-Royalties, serviços técnicos e de	10-Retenção do IRRF - alíquota padrão	R$	77.909,25	R$	11.746,05
13/12/2019	0422-Royalties e pagamentos de assistência	140-Royalties, serviços técnicos e de	10-Retenção do IRRF - alíquota padrão	R$	161.018,51	R$	24.152,78

CNPJ	Nome empresarial	País
15.629.143/000	NORTHWEST HYDRAULIC CONSULTANTS	Canadá

NIF	Relação fonte pagadora/beneficiário
103939898RC0001	A fonte pagadora ou a beneficiária no exterior mantenha contrato de exclusividade como agente, como distribuidor ou como concessionário nas operações com bens, serviços e

Data	Código receita	Tipo rendimento	Forma tributação		Valor pago em R$		IRRF
28/11/2019	0422-Royalties e pagamentos de assistência	140-Royalties, serviços técnicos e de	10-Retenção do IRRF - alíquota padrão	R$	89.891,42	R$	13.483,70

CNPJ	Nome empresarial	País
22.384.593/000	MCRIT, S.L.	Espanha

NIF	Relação fonte pagadora/beneficiário
B58677428	A fonte pagadora ou a beneficiária no exterior mantenha contrato de exclusividade como agente, como distribuidor ou como concessionário nas operações com bens, serviços e

Data	Código receita	Tipo rendimento	Forma tributação		Valor pago em R$		IRRF
17/01/2019	0422-Royalties e pagamentos de assistência	140-Royalties, serviços técnicos e de	10-Retenção do IRRF - alíquota padrão	R$	93.263,96	R$	13.989,58
21/02/2019	0422-Royalties e pagamentos de assistência	140-Royalties, serviços técnicos e de	10-Retenção do IRRF - alíquota padrão	R$	92.504,21	R$	13.875,61
09/04/2019	0422-Royalties e pagamentos de assistência	140-Royalties, serviços técnicos e de	10-Retenção do IRRF - alíquota padrão	R$	200.434,34	R$	30.065,16
29/05/2019	0422-Royalties e pagamentos de assistência	140-Royalties, serviços técnicos e de	10-Retenção do IRRF - alíquota padrão	R$	104.566,90	R$	15.685,03
11/07/2019	0422-Royalties e pagamentos de assistência	140-Royalties, serviços técnicos e de	10-Retenção do IRRF - alíquota padrão	R$	101.823,64	R$	15.296,25
23/07/2019	0422-Royalties e pagamentos de assistência	140-Royalties, serviços técnicos e de	10-Retenção do IRRF - alíquota padrão	R$	97.383,71	R$	14.607,55
11/09/2019	0422-Royalties e pagamentos de assistência	140-Royalties, serviços técnicos e de	10-Retenção do IRRF - alíquota padrão	R$	123.095,00	R$	18.558,53

CNPJ	Nome empresarial	País
28.680.047/000	TIS TECH ANGOLA - TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	Angola

NIF	Relação fonte pagadora/beneficiário
5420001756	A fonte pagadora ou a beneficiária no exterior mantenha contrato de exclusividade como agente, como distribuidor ou como concessionário nas operações com bens, serviços e

Data	Código receita	Tipo rendimento	Forma tributação		Valor pago em R$		IRRF
29/05/2019	0422-Royalties e pagamentos de assistência	140-Royalties, serviços técnicos e de	10-Retenção do IRRF - alíquota padrão	R$	603.292,63	R$	90.493,89
13/08/2019	0422-Royalties e pagamentos de assistência	140-Royalties, serviços técnicos e de	10-Retenção do IRRF - alíquota padrão	R$	33.880,06	R$	5.082,00
13/12/2019	0422-Royalties e pagamentos de assistência	140-Royalties, serviços técnicos e de	10-Retenção do IRRF - alíquota padrão	R$	195.415,29	R$	29.312,29
27/12/2019	0422-Royalties e pagamentos de assistência	140-Royalties, serviços técnicos e de	10-Retenção do IRRF - alíquota padrão	R$	3.441.850,01	R$	516.277,46

INFORME GPDS_LITORAL nº 004/2019
07 de março de 2019

Ao
CONSÓRCIO LITORAL SUSTENTÁVEL
A/C Representante Autorizado
Marina Cabreira Bastos

CORREÇÃO NO VALOR DO CONTRATO

Refere-se ao contrato nº 004/2017, firmado entre o Estado do Paraná, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL – SEPL (contratante) e o CONSÓRCIO LITORAL SUSTENTÁVEL (contratado) - (Barcelona Brasil Group - BBG (líder), Mcrit, Quanta e Hidria), para a elaboração do PLANO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO LITORAL DO ESTADO DO PARANÁ – PDS LITORAL.

Os Gestores do Contrato identificaram que existe uma incompatibilidade nos valores globais anotados no Contrato SEPL nº004/2017 entre:

O Item 3, Seção I. Contrato de Serviços de Consultoria, página 4:

> *"3. Pela execução do Contrato pelo Consultor, o CLIENTE se dispõe a fazer pagamentos que não excedam os valores globais do contrato de R$ 3.260.177,77 (Três milhões, duzentos e sessenta mil, cento e setenta e sete reais e setenta e sete centavos) e €485.557,89 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e sete euros e oitenta e nove centavos), incluindo impostos locais indiretos, de acordo com as condições especiais do contrato, que (...)"*

Cláusula 38.1, da seção III: Condições Especiais do Contrato, página 29:

> *"Os valores globais do contrato em Reais e Euros são: R$ 3.260.177,77 (Três milhões, duzentos e sessenta mil, cento e setenta e sete reais e setenta e sete centavos) e €485.557,89 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e sete euros e oitenta e nove centavos), incluindo impostos locais indiretos. (...)"*

E do formulário FIN-2: RESUMO DE CUSTOS, Apêndice C: Discriminação de preços do contrato (proposta financeira apresentada pelo consórcio), página 259:

Anexo 23_9_Anexo_VIII_Inf_GPDS_LITORAL_004_2019 (47828494) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 443

RESUMO DE CUSTOS		
Item	**Custo Total EUR (€)**	**Custo Total BR (R$)**
Custo da Proposta Financeira		
Incluindo:		
(1) Remuneração	408.000,00	2.369.953,22
(2) Reembolsáveis	53.280,00	727.158,66
Custo Total da Proposta Financeira	461.280,00	3.097.111,88
Estimativa dos Impostos Locais Indiretos - a serem discutidas e validadas nas negociações, caso o Contrato seja assinado		
(i) ISS - Impostos sobre Serviços (5%) - {100/[1-(ISS/100)]}/100		163.005,89
(ii) Impostos estrangeiros	24.277,89	
Total estimado de Impostos Locais Indiretos	24.277,89	163.005,89
Total	485.557,89	3.260.117,77

O Item *1.5. Preço do Contrato*, da Ata de Negociação do Contrato, Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) Nº 002/2015, assinado no dia 01 de junho de 2017, reitera o valor proposto pelo consórcio em sua proposta financeira:

> *"1.5.1 O preço do contrato corresponde a R$ 3.097.111,88 (três milhões, noventa e sete mil, cento e onze reais e oitenta e oito centavos) e 461.280,00 EUR (quatrocentos e sessenta e um mil duzentos e oitenta euros) nos termos das Diretrizes para Seleção e Contratação dos Consultores Financiadas por Empréstimos do BIRD e Créditos e Doações da AID pelos Mutuários do Banco Mundial, os pagamentos nos contratos por preço global baseiam-se na aprovação da apresentação de resultados (ou na aprovação da entrega de produtos) e inclui todos os custos (carga horária dos especialistas, despesas gerais indiretas, viagens, hospedagem e impostos), bem como que quaisquer impostos indiretos locais passíveis de cobrança em relação ao contrato para os serviços fornecidos pelo Consultor deverão ser pagos pelo mesmo. O Contratado será responsável pelo pagamento do montante correspondente aos impostos locais, no valor R$ 163.005,88 (cento e sessenta e três mil, cinco reais e oitenta e oito centavos) e 24.277,89 EUR (vinte e quatro mil, duzentos e setenta e sete euros e oitenta e nove cents) de impostos locais indiretos, conforme demonstrado em sua proposta financeira. "*

Deste modo, o *item 1.7. Cronograma de pagamentos*, da Ata de Negociação do Contrato, Seleção baseada na Qualidade e Custo (SBQC) Nº 002/2015; o *item 41.2. Forma de pagamento das parcelas,* da seção III: Condições especiais do contrato, página 29 e o *Cronograma Financeiro*, do Apêndice A: Termo de Referência, página 97, estabelecem as porcentagens para pagamento em moeda nacional (Real) e moeda estrangeira (Euro) para cada um dos treze produtos a serem entregues (tabela A).

,

Anexo 23_9_Anexo_VIII_Inf_GPDS_LITORAL_004_2019 (47828494) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 444

Diante dos elementos apresentados, baseados na *Cláusula Quarta – Participações da consorciada* do Termo de Constituição do consórcio e na proposta de distribuição de pagamentos por empresa, enviada no dia 07 de fevereiro de 2018 pelo consórcio, com o intuito de compatibilizar os valores globais de acordo com a proposta financeira apresentada pelo consórcio, encaminhamos para conhecimento e avaliação do consórcio uma sugestão para sanear a incompatibilidade (Tabela B).

FABRICIO MIYAGIMA
Gestor do Contrato

Anexo 23_9_Anexo_VIII_Inf_GPDS_LITORAL_004_2019 (47828494) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 445

TABELA A – CRONOGRAMA FINANCEIRO

PRODUTO		MOEDA	
		EURO (€)	REAL (R$)
Produto 1	Plano de Trabalho Preliminar (P.T.P.)	2,25%	4,84%
Produto 2	Oficinas de Engajamento e Relatório de Atividades 01 (R.A. 01)	8,17%	7,16%
Produto 3	Audiência Pública 01 e Plano de Trabalho Final (P.T.F.)	7,99%	7,16%
Produto 4	Relatório de Contextualização Inicial (R.C.I)	7,30%	6,85%
Produto 5	Oficinas de Contextualização e Relatório de Atividades 02 (R.A.02)	7,30%	7,44%
Produto 6	Audiência Pública 02 e Relatório de Contextualização Final (R.C.F.)	7,68%	7,99%
Produto 7	Relatório de Construção de Cenário Inicial (R.C.C.I)	7,78%	7,89%
Produto 8	Oficinas de Construção de Cenários e Relatório de Atividades 03 (R.A.03)	7,78%	7,92%
Produto 9	Audiência Pública 03 e Relatório de Construção de Cenário Final (R.C.C.F.)	7,78%	8,42%
Produto 10	Plano de Ação Inicial (R.P.A.I.)	8,08%	8,57%
Produto 11	Oficinas do Plano de Ação e Relatório de Atividades 04 (R.A.04)	9,23%	8,92%
Produto 12	Audiência pública 04 e Relatório de plano de Ação Final (R.P.A.F.)	9,23%	8,92%
Produto 13	Documento Final e Conferência Regional	9,43%	7,92%
	TOTAL	**100,00%**	**100,00%**

TABELA B - SUGESTÃO

PRODUTO		HIDRIA	MCRIT	QUANTA	BARCELONA BRASIL GROUP	TOTAL EURO		TOTAL REAL	
		26.451.164/0001-29	22.384.593/0001-70	05.314.789/0001-79	14.879.952/0001-31	€	% TOTAL	R$	% TOTAL
Produto 01	Plano de Trabalho Preliminar (P.T.P.)	€ 4.234,55	€ 6.690,50	R$ 120.206,41	R$ 37.586,20	€ 10.925,05	2,25%	R$ 157.792,61	4,84%
Produto 02	Oficinas de Engajamento e Relatório de Atividades 01 (R.A. 01)	€ 15.376,12	€ 24.293,96	R$ 177.826,01	R$ 55.602,72	€ 39.670,08	8,17%	R$ 233.428,73	7,16%
Produto 03	Audiência Pública 01 e Plano de Trabalho Final (P.T.F.)	€ 15.037,36	€ 23.758,72	R$ 177.826,01	R$ 55.602,72	€ 38.796,08	7,99%	R$ 233.428,73	7,16%
Produto 04	Relatório de Contextualização Inicial (R.C.I)	€ 13.738,76	€ 21.706,96	R$ 170.126,83	R$ 53.195,34	€ 35.445,72	7,30%	R$ 223.322,17	6,85%
Produto 05	Oficinas de Contextualização e Relatório de Atividades 02 (R.A.02)	€ 13.738,76	€ 21.706,96	R$ 184.780,10	R$ 57.777,13	€ 35.445,72	7,30%	R$ 242.557,23	7,44%
Produto 06	Audiência Pública 02 e Relatório de Contextualização Final (R.C.F.)	€ 14.453,93	€ 22.836,91	R$ 198.439,91	R$ 62.048,29	€ 37.290,84	7,68%	R$ 260.488,20	7,99%
Produto 07	Relatório de Construção de Cenário Inicial (R.C.C.I)	€ 14.642,13	€ 23.134,27	R$ 195.896,30	R$ 61.271,72	€ 37.776,40	7,78%	R$ 257.168,02	7,89%
Produto 08	Oficinas de Construção de Cenários e Relatório de Atividades 03 (R.A.03)	€ 14.642,13	€ 23.134,27	R$ 196.701,39	R$ 61.504,69	€ 37.776,40	7,78%	R$ 258.206,08	7,92%
Produto 09	Audiência Pública 03 e Relatório de Construção de Cenário Final (R.C.C.F.)	€ 14.642,13	€ 23.134,27	R$ 209.119,41	R$ 65.387,56	€ 37.776,40	7,78%	R$ 274.506,97	8,42%
Produto 10	Plano de Ação Inicial (R.P.A.I.)	€ 15.206,74	€ 24.026,34	R$ 212.844,81	R$ 66.552,42	€ 39.233,08	8,08%	R$ 279.397,23	8,57%
Produto 11	Oficinas do Plano de Ação e Relatório de Atividades 04 (R.A.04)	€ 17.371,07	€ 27.445,93	R$ 221.537,43	R$ 69.270,43	€ 44.817,00	9,23%	R$ 290.807,86	8,92%
Produto 12	Audiência pública 04 e Relatório de plano de Ação Final (R.P.A.F.)	€ 17.371,07	€ 27.445,93	R$ 221.537,43	R$ 69.270,43	€ 44.817,00	9,23%	R$ 290.807,86	8,92%
Produto 13	Documento Final e Conferência Regional	€ 17.747,47	€ 28.040,64	R$ 196.701,39	R$ 61.504,69	€ 45.788,11	9,43%	R$ 258.206,08	7,92%
		€ 188.202,22	**€ 297.355,66**	**R$ 2.483.543,43**	**R$ 776.574,34**	**€ 485.557,88**	**100,00%**	**R$ 3.260.117,77**	**100,00%**

Anexo 23_9_Anexo_VIII_Inf_GPDS_LITORAL_004_2019 (47828494) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 446
